

COMISIÓN INTERSECTORIAL

de infraestructura para la movilidad del Distrito Capital



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



AGENDA

- 1 Instalación de la sesión
- 2 Verificación del quorum
- 3 Verificación de invitados
- 4 Aprobación orden del día
- 5 Intervención del Alcalde Mayor de Bogotá
Dr. Carlos Fernando Galán
- 6 Seguimiento de compromisos pendientes
Según acta #1
- 7 Proyectos de infraestructura
- 8 Proposiciones y varios



Ciclopunto Calle 80 con Av. Boyacá / Julio 2025



2

Verificación

DEL QUORUM

VERIFICACIÓN DEL QUORUM



Av. La Sirena (calle 153) / Mayo 2025

INTEGRANTES

1	Secretario Distrital de Gobierno	Dr. Gustavo Alberto Quintero Ardila
2	Secretaria Distrital de Planeación	Arq. Úrsula Ablanque Mejía
3	Secretaria Distrital de Movilidad	Ing. Claudia Andrea Díaz Acosta
4	Secretaria Distrital del Hábitat	Arq. Vanessa Velasco Bernal
5	Director Instituto de Desarrollo Urbano	Arq. Orlando Molano Pérez
6	Directora Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial	Ing. Mónica Eloisa Rueda Peña
7	Gerente Empresa Metro de Bogotá S.A	Ing. José Leonidas Narváez Morales
8	Gerente Transmilenio S.A.	Ing. María Fernanda Ortiz Carrascal



3

Verificación

DE INVITADOS

VERIFICACIÓN DEL QUORUM



Ciclopunto Cl. 80 con Av. Boyacá / Julio 2025

INVITADOS

- 1 **EAAB** - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
- 2 **ENEL** Colombia S.A. E.S.P.
- 3 **ETB** - Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P.
- 4 **UAESP** - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
- 5 **SDA** - Secretaría Distrital de Ambiente
- 6 **Alcaldía Local de Usaquén**
- 7 **VANTI S.A.**
- 8 **MOVISTAR** - Colombia Telecomunicaciones S.A.
- 9 **CLARO** - Comcel S.A.
- 10 **ANI** - Agencia Nacional de Infraestructura
- 11 **Aguas de Bogotá S.A. E.S.P.**
- 12 **DADEP** - Defensoría del Espacio Público



4

Aprobación

DEL ORDEN DEL DÍA



ORDEN DEL DÍA

- 1** **Intervención del Alcalde Mayor de Bogotá**
Dr. Carlos Fernando Galán
- 2** **Seguimiento de compromisos pendientes, según acta #1**
- 3** **Proyectos de infraestructura**
 1. Empresa Metro de Bogotá
 2. Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT
 3. Instituto de Desarrollo Urbano – IDU
 4. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - EAAB
- 4** **Compromisos de la sesión**
Incluyendo invitación para conformación y designación de integrantes de Comité Técnico.

Troncal Av. Cali – Grupo 4 / Agosto 2025



5

Intervención

ALCALDE MAYOR

Dr. Carlos Fernando Galán

6

Seguimiento de compromisos

PENDIENTES



Fundida Grupo 1 av. 68/ Ago 2025



Atención PMT'S

Fortalecimiento de los tiempos y los equipos de trabajo para la atención de los PMT. **En proceso**



Gestión interinstitucional frente a propuestas IDU

- **ENEL:** Disponibilidad de luminarias para Alumbrado Público. **En proceso**
- **EAAB:** Continuar proceso de disminución de tiempos de respuesta. **En proceso**
- **ETB:** Aumentar el número de cuadrillas. **En proceso**

7

Proyectos de

INFRAESTRUCTURA

1

Empresa Metro de Bogotá



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Convenio 1021 de 2017 – IDU – Predios PLMB

Actividades Pendientes:

1. La EMB requiere pagar las compensaciones sociales de las últimas 10 unidades sociales
Se requiere que el IDU presente la documentación que permita realizar el pago antes del 30 de septiembre.
2. Ingresar a Registro las expropiaciones de los 3 predios de la IE9.
3. Cierre del Convenio Marco y su Anexo Técnico 2: Se requiere tener el cierre documental, social, predial, financiero y administrativo para el 30 de noviembre de 2025.

Temas Infraestructura en gestión - Redes PLMB

Entidad	Ubicación	Acciones	Fecha de Solicitud	Requerimiento
IDU	Av. Villavicencio con Av. Ciudad Cali	Redes no ejecutadas por consorcio Santa María	Radicado: EXTS25 0004074 del 27/08/2025	En revisión por parte de interventoría y ML1, la solicitud de IDU para realizar redes no ejecutadas por el consorcio Santa María. Posición de EMB: La EMB sólo realizará las redes que generan interferencia con el viaducto. En espacio público reubicará las redes existentes dentro del Límite de intervención.
		Definir reconocimiento de obra nueva de Alumbrado Público	Reunión EMB y UAESP: 09 de julio de 2025	
UAESP	Patio Taller- CII 78 – Cola de Servicio		Radicado : EXTS24-0007537 del 5/12/2025	Requerimiento: UAESP informó que adquiriría el alumbrado público si le asignaban presupuesto. La Secretaría de Hacienda manifestó la viabilidad siempre y cuando se aprobara el impuesto en el proyecto del Acuerdo que se presentó al Concejo en el mes de agosto, retirado a la fecha. De acuerdo con lo anterior se debe negociar la compensación del alumbrado publico ejecutado por el proyecto con ENEL.
		Emitir Aprobación de diseños con reutilización de luminarias existentes.		Emitir la aprobación de los diseños de AP haciendo uso de las luminarias existentes en Bogotá aprox. 1,600 instaladas.

Temas Infraestructura en gestión - Redes PLMB

Empresa de Servicio Público	Ubicación	Actividad	Fecha de Solicitud	Requerimiento
ENEL		Se verifica número de ductos y estado de la tubería e infraestructura asociada.		Mesa de Trabajo
				No ejecutar redes dónde están soterradas, caso Av 1 de mayo entre 40F y 40 sur y Av Caracas, con salvedades a la norma actual de ENEL.
				Requerimiento: Se requiere mantener infraestructura existente donde se encuentra soterrada y renivelación de cajas a cota espacio público.

Temas Infraestructura gestión - Redes PLMB

Empresa de Servicio Público	Ubicación	Actividad	Fecha de Solicitud	Requerimiento
EAAB	Patio Taller- Cll 78 – Cola de Servicio	Revisar tramo a tramo las redes que deben ser cambiadas	Fechas de reuniones:	Sólo se intervendrán las redes que por efectos de la obra sean absolutamente necesarias, reubicar, proteger o trasladar.
			22-05-2025	
			12-08-2025	Suscribir acuerdos/actas de competencia para pago de redes, por cambios de diámetro, material , mayores longitudes a hoy requeridas por el traslado de redes.
			25-08-2025	

Temas Infraestructura nuevos - Redes PLMB

Empresa de Servicio Público	Ubicación	Actividad	Fecha de Solicitud	Requerimiento
ETB	Patio Taller- CII 78 – Cola de Servicio	La ETB viene adelantando migración tecnológica	Tema Nuevo	Se requiere determinar el costo del traslado, de acuerdo con la ley 1682.
		Revisión de pertinencia en el traslado de redes para Movistar .	Tema nuevo	Se sugiere mantener la red y no construir redes adicionales.

Temas Infraestructura nuevos - Obras PLMB

Empresa de Servicio Público	Ubicación	Actividad	Fecha de Solicitud	Requerimiento
IDU TMSA	Av 1 de Mayo x Av 68	Armonización obras “El Pulpo”	Tema nuevo	Visita a sitio de obra para verificar avance y coordinar siguientes fases de los proyectos

2

Secretaría Distrital del Hábitat / SDHT



BOGOTÁ



SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

Estrategia
“Revitaliza Tu Barrio”




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DEL
HÁBITAT



Estrategia

“Revitaliza tu Barrio”

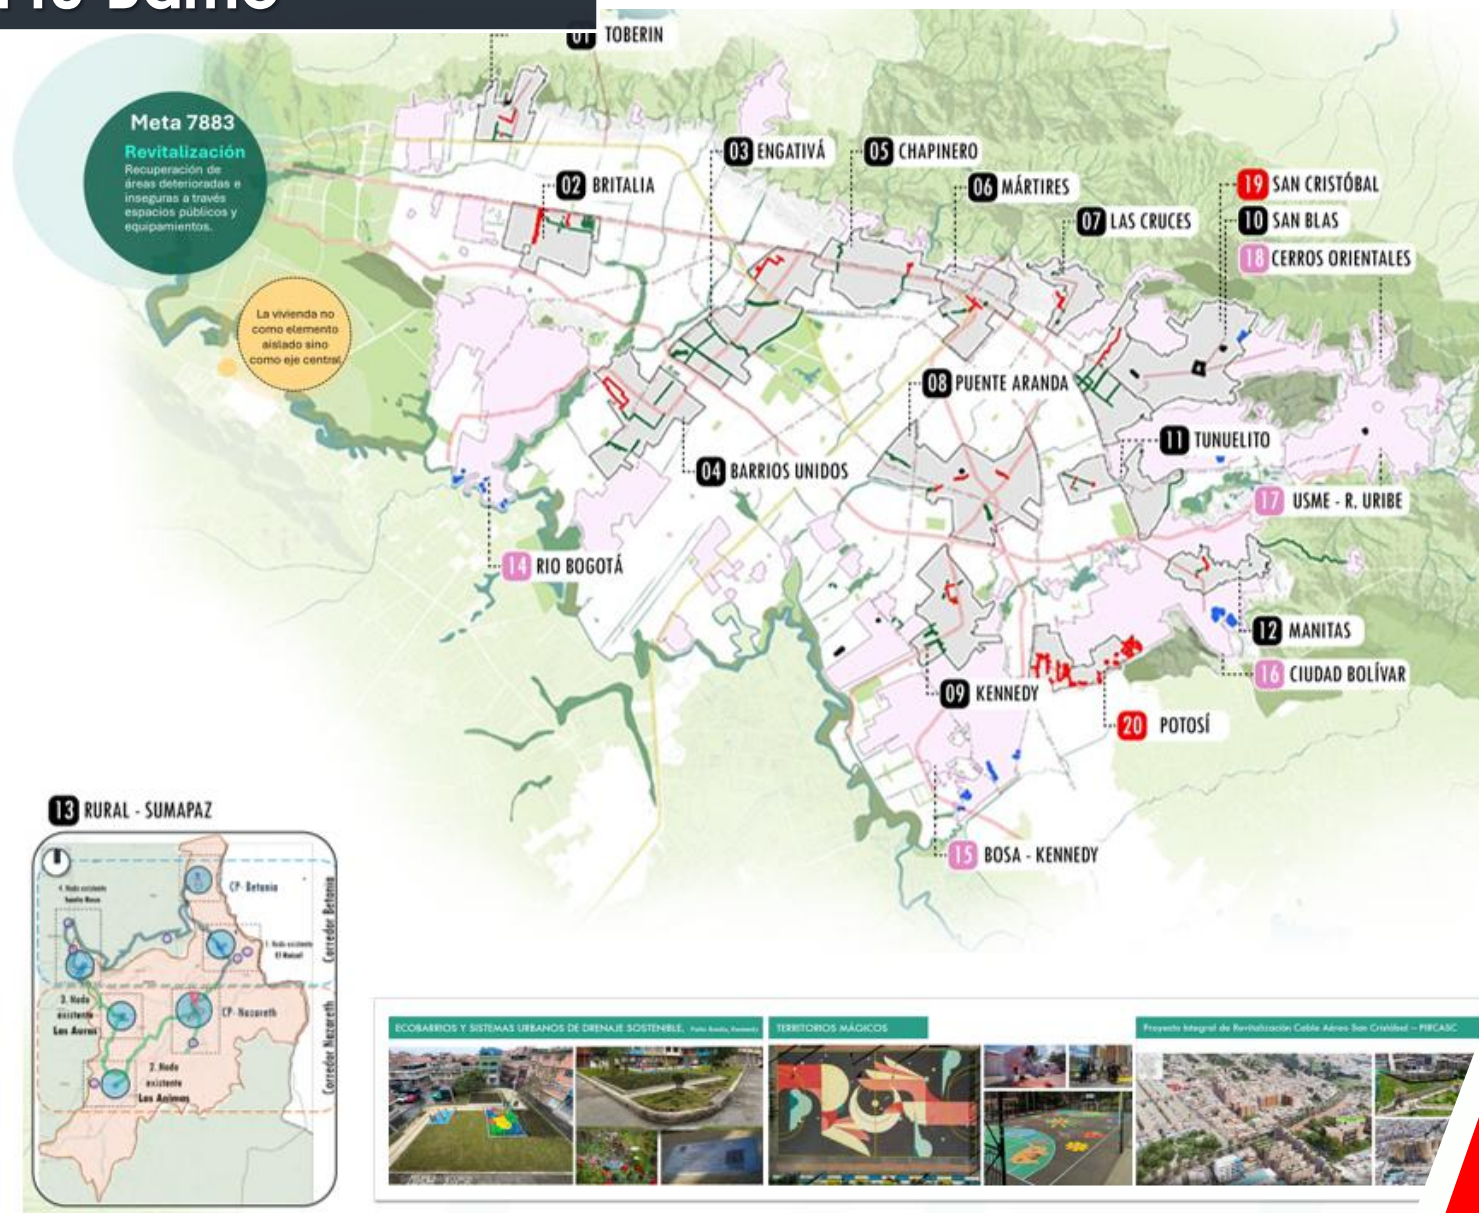

SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT

1 Gestiones pendientes ante entidades distritales

2 Muralismo en la Avenida José Celestino Mutis

ECOBARRIOS Y SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE... Foto: Benito, Elencor



TERRITORIOS MÁGICOS



Proyecto Integral de Revitalización Cable Aéreo San Cristóbal – PIRCASC



Proyecto Integral de Revitalización Cable Aéreo Petal – Heda La Estancia



1

Gestiones pendientes

Entidades Distritales

PENDIENTES

Gestiones pendientes ante entidades distritales:

CTO.	PROYECTO	GESTIÓN	FECHA RADICACIÓN	ENTIDAD	RADICADO
1755-2024	Eco-corredor Alcalá	<u>Acta WR</u> Se radico el proyecto de paisajismo en el Jardín Botánico, con el fin de solicitar mesa de trabajo para tramitar el acta WR	1. 28/07/2025 Han transcurrido 38 días	JARDÍN BOTÁNICO	2025JBB410077831
1754-2024	Eco-corredor UNIVERSIDADES	<u>Acta WR</u> Se radico del proyecto de paisajismo en el jardín botánico, con el fin de solicitar mesa de trabajo para tramitar el acta WR.	1. 31/07/2025 Han transcurrido 36 días	JARDÍN BOTÁNICO	2025JBB41007781
		<u>Visto bueno pacificación vial</u> - 16-07-2025 Se radicó solicitud de mesas de trabajo para presentar los diseños de la pacificación de la vía, con el fin de recibir observaciones, recomendaciones o visto bueno por parte de la entidad. - 21-08-2025 Reiteración solicitud mesa de trabajo.	1. 16-07-2025 2. 21/08/2025 Han transcurrido 51 días	SDP	4197282025
		<u>Visto bueno pacificación vial</u> - 16-07-2025 Se radicó solicitud de mesas de trabajo para presentar los diseños de la pacificación de la vía, con el fin de recibir observaciones, recomendaciones o visto bueno por parte de la entidad. - 21-08-2025 Reiteración solicitud mesa de trabajo.	1. 16-07-2025 2. 21/08/2025 Han transcurrido 51 días	IDU	4197472025
		Solicitud de lineamientos y normatividad para la intervención	1. 14/08/2025 Han transcurrido 22 días	ICANH	2025184200088620
1339-2024	Parques Potosí lote	Aprehensión barrio Jerusalén - Sector Potosí	Pendiente aprehensión y expedición del RUPI para el espacio público en esta zona		

PENDIENTES

Gestiones pendientes ante entidades distritales:

CTO.	PROYECTO	GESTIÓN	FECHA	ENTIDAD	RADICADO
1124-2022	San Cristóbal Lote 1	<p>Señalización</p> <p>-12-12-2024 Radicación del trámite de Señalización ante la SDM radicado 202461204661502</p> <p>- 11-02-2024 Observaciones emitidas por la SDM con radicado 202531100592151</p> <p>- 27-03-2025 El contratista radica las observaciones atendidas con radicado 202561201042072</p> <p>- 13-05-2025 Observaciones emitidas por la SDM con radicado 202531106843341</p> <p>- 24-05-2025 El contratista radica las observaciones atendidas con radicado 202561201778202</p> <p>- 09-07-2025 Observaciones emitidas por la SDM con radicado 202531108178771</p> <p>- 25-07-2025 El contratista radica las observaciones atendidas con radicado 202561202631312</p> <p>- 29-08-2025 SDM envía observaciones con radicado N° 202531110252301.</p> <p>Nota. <u>Teniendo en cuenta que el trámite se radicó en diciembre de 2024 y el contrato de obra finalizó el 19 julio 2025, fue necesario realizar la señalización de acuerdo con las mesas de trabajo con SDM, sin embargo, aún no se cuenta con la aprobación final de la señalización.</u></p>	1. 12-12-2024	SDM	202561202631312
		<p>Semaforización</p> <p>-07-05-2025 Radicación del trámite de Semaforización remitida a la SDM radicado 202561201541412 (20 de julio)</p> <p>- 10-05-2025 Radicación del trámite de Semaforización remitida a la SDM radicado 202500001055542 (La Victoria)</p> <p>- 29-05-2025 Mesa de trabajo con la ingeniera Angie prieto de la SDM con el contratista e interventoría.</p> <p>- 04-07-2025 Observaciones emitidas por la SDM con radicado 202532207543321</p> <p>- 14-07-2025 El contratista radica las observaciones atendidas vía correo electrónico</p> <p>- 29-08-2025 SDM envía observaciones con radicado N° 202531110252301.</p>	Último radicado: 25/07/2025 (Han transcurrido 263 días)		
			1. 07-05-2025	SDM	Remisión vía correo electrónico aprieto@movilidadbogota.gov.co
			Último radicado: 14/07/2025 (Han transcurrido 120 días)		

PENDIENTES

Gestiones pendientes ante entidades distritales:

Cto.	Proyecto	Gestión	RADICACION	Entidad
1125-2022	San Cristóbal Lote 2	Solicitud revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). ETAPA 1: Cierre total de calzada para actividades de construcción vial. ETAPA 2: Cierre total andén oriental y occidental para actividades de construcción y cierre total de calzada para el traslado de los peatones a la calzada.	21/08/2025	SDM
		Permiso de Ocupación de Cauce – POC / San Cristóbal Contrato 1124-2022 1. 13/09/2024 Consorcio CPI Proinmat L2, mediante radicado 2024ER190494 realizó la solicitud del Permiso de Ocupación de Cauce ante la SDA por la ventanilla virtual. 2. 30/09/2024 la SDA emitió respuesta con observaciones mediante radicado 2024EE203545, las cuales fueron atendidas y subsanadas. 3. 02/10/2024 mediante comunicado CPI-PRO-604-02102024, hizo alcance a la radicación del POC No. 2024ER190494, adjuntando el concepto de intervención de la EAAB 4. 29/10/2024 mediante comunicado CPI-PRO-646-29102024 se solicitó a la SDA información sobre el estado del Tramite POC 5. 13/11/2024 la SDA mediante radicado 2024EE234764 respondió indicando acuse de recibido de la documentación y que los mismos se encontraban en revisión. 6. 25/02/2025 Se solicita a SDA respuesta sobre el trámite de POC, radicado en septiembre de 2024 con el consecutivo SDA 2024ER190494. 7. 11/03/2025 SDA responde que el trámite POC se encuentra en proceso de emisión de auto de inicio, por medio del radicado 2025EE54106. 8. 23/04/2025 se radicó DP SDA No. 2025ER85734, en el que se solicita respuesta a los radicados 2025EE54106 y 2025EE61128 con la emisión del auto de inicio “Permiso Ocupación de Cauce, Playas y Lechos”. 9. 10/06/2025 se radica nuevo DP a la SDA (Rad 2025ER125427), solicitando respuesta al trámite de POC, y el auto de inicio mencionado en respuestas anteriores. 10. 29/06/2025 La SDA por medio del radicado 2025EE140161, responde que el trámite POC se encuentra en proceso de reevaluación y revisión a fondo de la documentación solicitada, debido a que la respuesta inicial de emisión de auto de inicio fue con base a una revisión de forma y no de fondo por parte de la autoridad ambiental. 11. 16/07/2025 Se radicó ante la SDA el oficio CPI-PRO-1-026-16072025 – Solicitud POC No. SDA 2024ER190494-auto de inicio. 12. 28/07/2025 la SDA responde mediante oficio 2025EE61128, emitiendo observaciones a la documentación entregada para el trámite del POC. 13. 21/08/2025 En atención al oficio SDA 2025EE167572, se radicó la subsanación de observaciones a partir del consecutivo 2025ER188272 para el trámite de Permiso de Ocupación de cauce (Expediente SDA-05-2024-2221/ POC 2024ER190494); en este sentido, ante la imposibilidad de cargar más de un documento para un mismo requerimiento en la plataforma virtual, se dio alcance por medio de la radicación (por ventanilla virtual SDA-Rad. 2025ER188729), de una carpeta comprimida como complemento a la documentación solicitada, dando total cumplimiento.	1.13-09-2024 Última radicación: 21/08/2025 (Han transcurrido 357 días)	SDA

2

Muralismo

Avenida José Celestino Mutis

Novedades sobre el proceso de muralismo en la Av. Mutis, liderado por el IDU y co-ejecutado por la Secretaría del Hábitat:

Artistas locales manifestaron inconformidad por falta de socialización y por tener murales en buen estado en las superficies intervenidas. Esto generó tensiones e insinuaciones de amenaza hacia los colaboradores, por lo que se detuvieron preventivamente las acciones.

En reunión del 1 de septiembre, los artistas expresaron no querer articulaciones y propusieron como compensación recibir material (aprox. 500 aerosoles, 15 cuñetes de pintura y herramientas). Aunque la cantidad supera lo intervenido, desde la Secretaría se considera prudente llegar a un acuerdo e identificar quiénes reclaman cada área.

Es importante mencionar que la fecha establecida para la presentación de la propuesta del IDU a los artistas esta programada para el proximo 5 de septiembre, fecha estimada para la entrega del mural. Se solicita respetuosamente al IDU revisión del proceso de conciliación con los artistas para que la SDHT pueda retomar las labores de intervención del muro.



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

3

Instituto de Desarrollo Urbano / IDU



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

BOGOTÁ

LA NUEVA 13



LA NUEVA 13



LOTE 1
1,12 km

VALOR: **\$506,219**
MILLONES

En ejecución

LOTE 2
2,67 km

VALOR: **\$526,002**
MILLONES

En trámite acuerdo transacción para terminación del Contrato

LOTE 3
1.65 km

VALOR: **\$490,953**
MILLONES

En licitación
Firma Dic 2025

LOTE 4
2.23 km

VALOR: **\$582,983**
MILLONES

En licitación
Firma Dic 2025

LOTE 5
2.53 km

VALOR: **\$612,235**
MILLONES

En licitación
Firma Dic 2025

LOTE 6
1.42 km

VALOR: **\$539,804**
MILLONES

En licitación
Firma Dic 2025

LOTE 7
Patio Taller

VALOR: **\$506,219**
MILLONES

Fecha de Adjudicación
Firma 1er Sem
2026


CONTRATADOS

EN PROCESO DE CONTRATACIÓN




PERFIL VIAL TÍPICO

Ancho sin
estación
54,80 metros

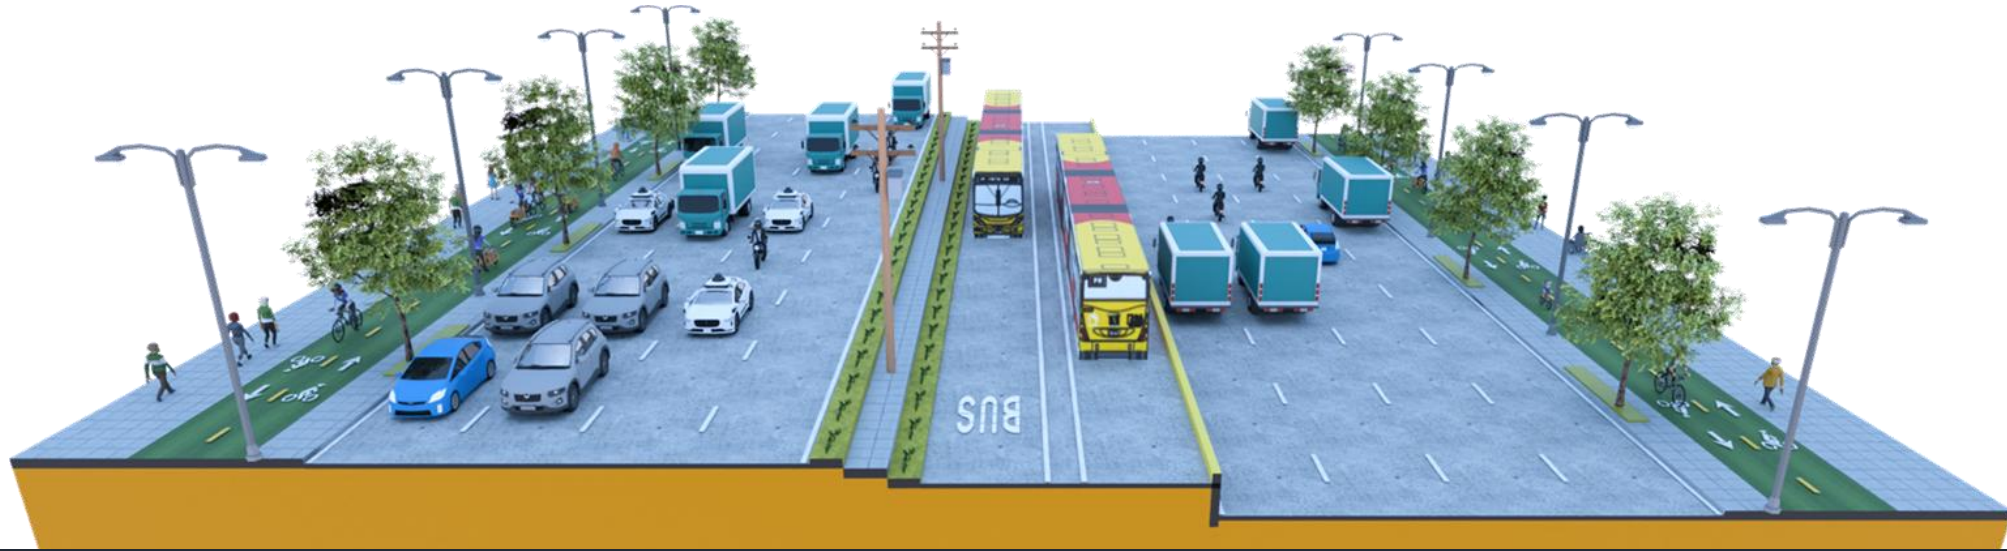

Ancho con
estación
66.05 – 68.05
metros

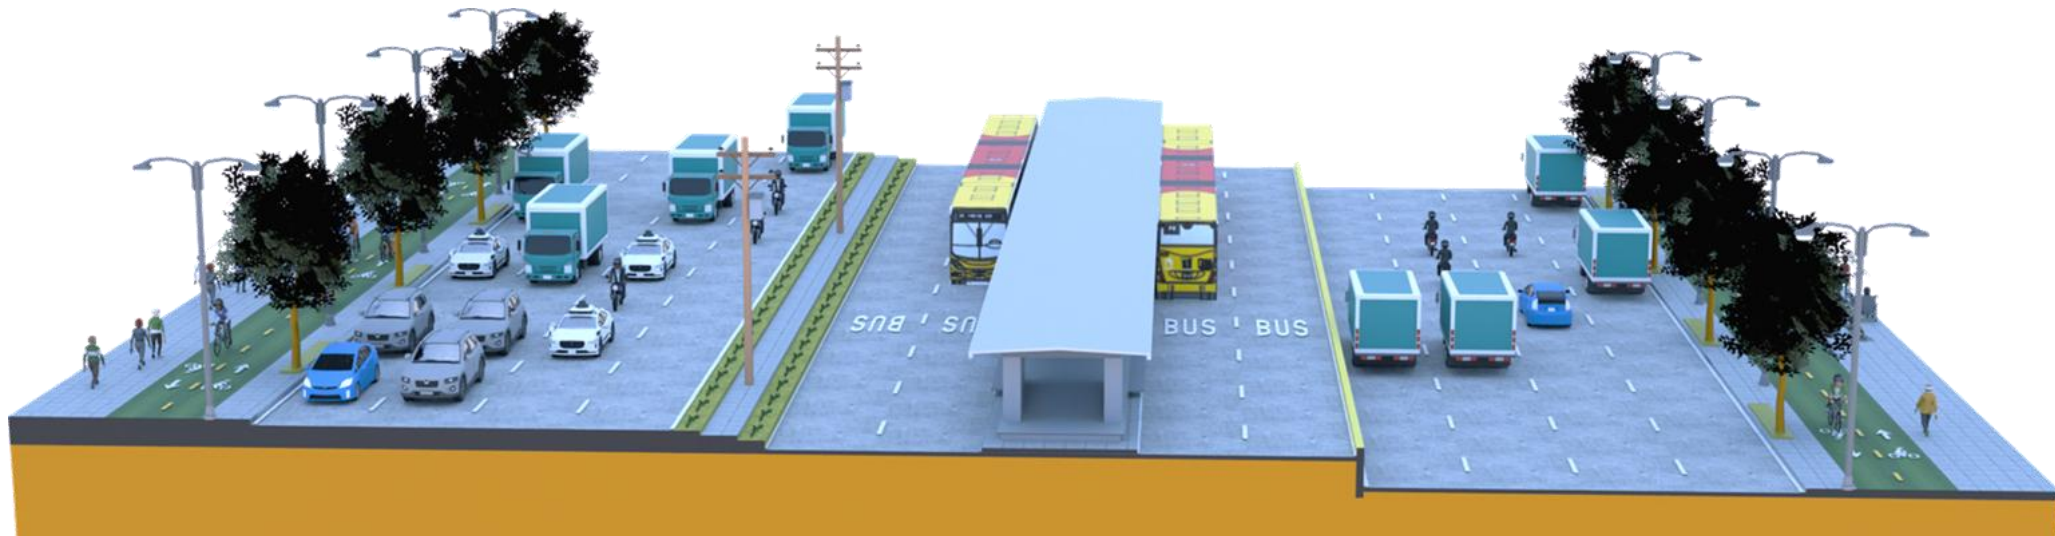

Troncal Calle13

LOTE 1

Alcance



1,12 km
Extensión



\$506.219 Billones
Inversión



Suscripción:
18 May 2023



Acta inicio:
22 Jun 2023



Entrega inicial:
Junio 2026



Entrega estimada
1er Trimestre 2028



Atraso: 19 meses

¿Cómo recibimos?

01 ene. 2024

91,00 %

Preconstrucción

¿En qué vamos?

27 Ago. 2025

100%

Preconstrucción

3,79%

Construcción



Tráfico mixto
Glorieta **Primer Nivel**
200 mts diámetro
3 carriles mixtos



Buses Transmilenio
Glorieta **Segundo Nivel**
100 mts diámetro
2 carriles de BRT



Tráfico mixto
Glorieta **Tercer Nivel**

- 2 puentes mixtos conexión Av. Américas
- 3 carriles en cada sentido
- 3 semi-deprimidos peatonales (carrera 50, calle 13 sentido occidental y sentido oriental)



Zona verde en proyección



¿POR QUÉ UNA IMPLOSIÓN?



- Esta metodología es mucho **más rápida** que otras
- **Menos** tiempos de **cierres**
- **Menos afectación** a comercio e industrias



- Se posicionan **protecciones** directamente **en la obra**
- **Protecciones** directamente a **fachadas** y otros elementos de cuidado donde sea requerido según la evaluación del riesgo



- **Menor** exposición al **ruido constante**
- **Menor** **particulado** concentrado en un día.
- Se realizan estudios, planes y acciones de **manejo ambiental**

ACOMPañAMIENTO DE ENTIDADES

GESTIÓN CON IDU



Edificio Space 2013 / Medellín



Instituto de Desarrollo Urbano



Alcaldía Local Puente Aranda



Bomberos



Cruz Roja



Defensa Civil



Ejército Nacional



Empresas Servicios Públicos
(EAAB, ENEL, VANTI, ETB)



Instituto Distrital de Gestión de
Riesgos y Cambio Climático



Instituto Distrital de Protección y
Bienestar Animal



Policía Nacional



Secretaría Distrital de Ambiente



Secretaría de Educación del Distrito



Secretaría Distrital de Integración
Social



Secretaría Distrital de Movilidad



Secretaría Distrital de Salud



Secretaría Distrital de Seguridad
Convivencia y Justicia




Transmilenio S.A.



Unidad Administrativa Especial de
Servicios Públicos (UAESP)

Cronograma Troncal Calle 13 / Lote 1

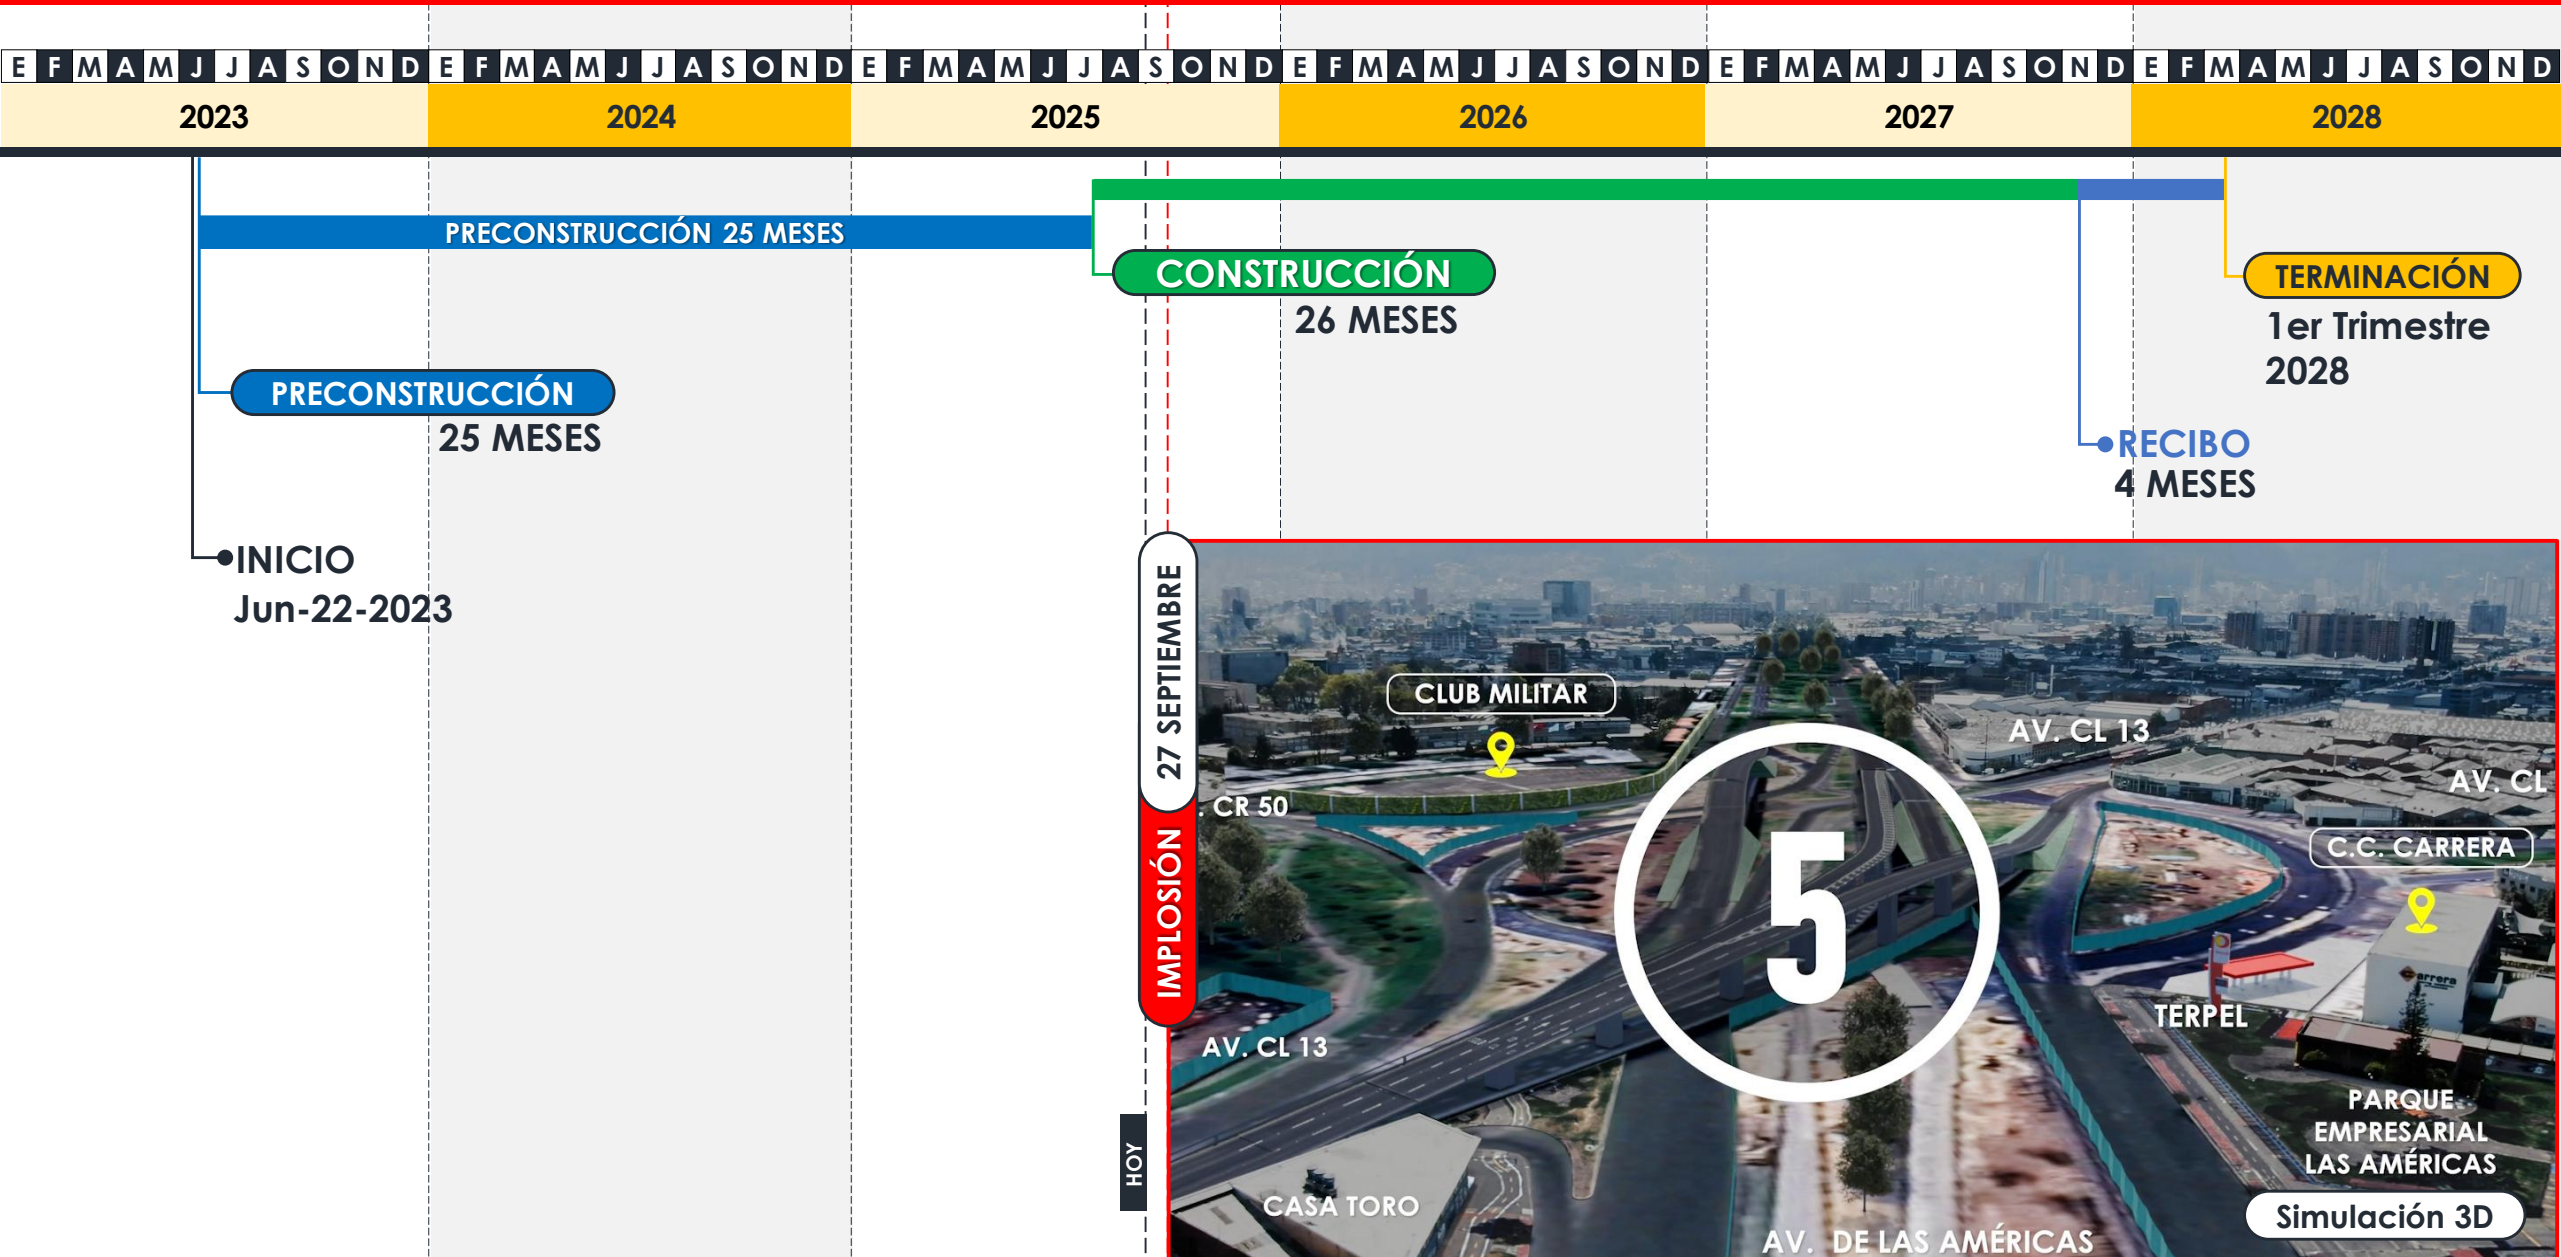



PENDIENTES
CALLE 13 LOTE 1

Calle 13 con Carrera 50 / Septiembre 2025

Desde el inicio del trámite
Días transcurridos por maniobra

ESP




Maniobra 1

174
Días

TRONCAL AVENIDA 68



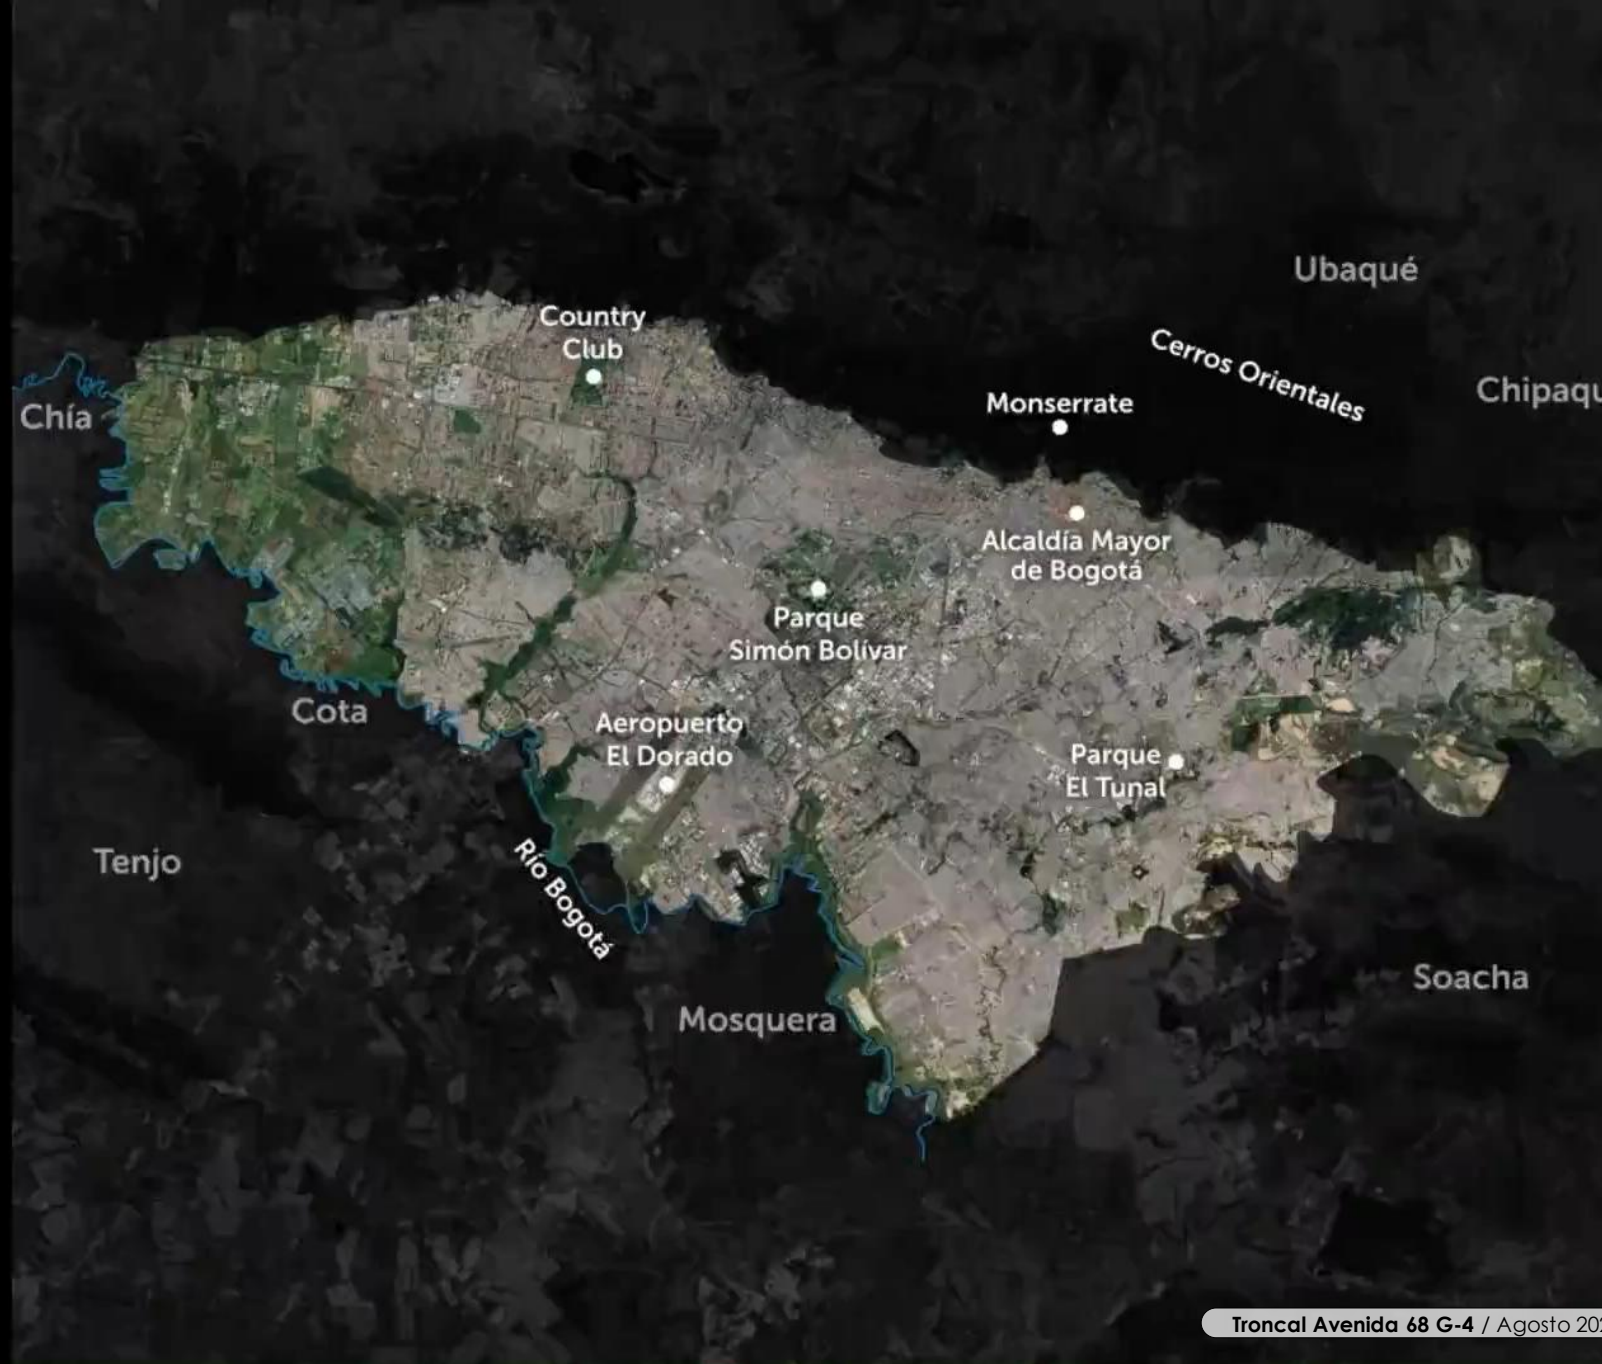

Troncal Avenida 68

Grupos 1 al 9

Alcance



17,07 km

Extensión



\$2,93 Billones

Inversión



Suscripción:

8 May 2020



Acta inicio:

Junio 2020



Entrega inicial:

Febrero 2026



Entrega estimada

Agosto 2027



Atraso: 20 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

44,66 %

(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

69,20 %

(Construcción)

Troncal Avenida 68 G-4 / Agosto 2025





Troncal Avenida 68

Grupo 1

Alcance



2,83 km
Extensión



\$419,037 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
25 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2026



Entrega estimada
Agosto 2027



Atraso: 18 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

39,91 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

64,20 %
(Construcción)

Agosto 2025





PENDIENTES

G1

TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 Grupo 1 / Ago 2025

Desde el inicio del trámite			
Días transcurridos por maniobra			
ESP	Maniobra 1	Maniobra 2	Maniobra 3
 ETB	229 Días	N/A	N/A
 ENEL	23 Días	8 Días	5 Días
Entidad	Acción 1		
 METRO	15 Días		



Troncal Avenida 68

Grupo 2

Alcance



1,78 km
Extensión



\$323,533 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
26 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2025



Entrega estimada
Octubre 2026



Atraso: 20 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

46,64 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

73,76 %
(Construcción)

Agosto 2025





PENDIENTES

G2

TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 Grupo 2 / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP



Maniobra 1

40
Días

Maniobra 2

15
Días





Troncal Avenida 68

Grupo 3

Alcance



1,04 km
Extensión



\$239,323 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
25 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2025



Entrega estimada
Abril 2026



Atraso: 14 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

36,86 %
(Construcción)

Agosto 2025

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

65,10 %
(Construcción)





PENDIENTES

G3

TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 Grupo 3 / Ago 2025

Desde el inicio del trámite
Días transcurridos por maniobra

ESP	Maniobra 1	Maniobra 2	Maniobra 3	Maniobra 4
 ENEL	274 Días	147 Días	41 Días	19 Días
Entidad	Acción 1			
 SDA	250 Días			



Troncal Avenida 68

Grupo 4

Alcance



1,96 km
Extensión



\$284.680 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
12 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2025



Entrega estimada
Enero 2026



Atraso: 10 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

33,30 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

73,08 %
(Construcción)

Agosto 2025





PENDIENTES **G4**
TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 **Grupo 4** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite Días transcurridos por maniobra			
ESP	Maniobra 1	Maniobra 2	Maniobra 3
 ENEL	57 Días	57 Días	N/A
Entidad	Acción 1	Acción 2	Acción 3
 SDA	391 Días	140 Días	246 Días
 ANI	19 Días	N/A	N/A



Troncal Avenida 68

Grupo 5

Alcance



1,04 km
Extensión



\$246.724 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
18 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2024



Entrega estimada
Junio 2026



Atraso: 19 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

79,41 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

96,52 %
(Construcción)

Agosto 2025





PENDIENTES

G5

TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 Grupo 5 / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP


ENEL

Maniobra 1

82
Días

Maniobra 2

141
Días

Maniobra 3

186
Días

Entidad


EAAB

Acción 1

186
Días


SDA

251
Días



Troncal Avenida 68

Grupo 6

Alcance



2,08 km
Extensión



\$245,588 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
12 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2025



Entrega estimada
Junio 2026



Atraso: 16 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

33,79 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

54,03 %
(Construcción)

Agosto 2025





Troncal Avenida 68

Grupo 7

Alcance



3,05 km
Extensión



\$578,955 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
12 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2026



Entrega estimada
Agosto 2027



Atraso: 18 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

44,07 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

70,54 %
(Construcción)

Agosto 2025





PENDIENTES **G7**

TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 **Grupo 7** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP



ENEL



ETB

Entidad



SDA

Maniobra 1

460

Días

33

Días

Acción 1

164

Días

Maniobra 2

331

Días

62

Días



Troncal Avenida 68

Grupo 8

Alcance



1,06 km
Extensión



\$281,748 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
12 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2026



Entrega estimada
Agosto 2027



Atraso: 18 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

36,68 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

54,60 %
(Construcción)

Agosto 2025





PENDIENTES

G8

TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 Grupo 8 / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP



ETB

Maniobra 1

28
Días





Troncal Avenida 68

Grupo 9

Alcance



2,23 km
Extensión



\$312,289 Millones
Inversión



Suscripción:
8 May 2020



Acta inicio:
26 Jun 2020



Entrega inicial:
Febrero 2025



Entrega estimada
Octubre 2026



Atraso: 20 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

51,32 %

(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

71,01 %

(Construcción)

Agosto 2025



PENDIENTES **G9**
TRONCAL AVENIDA 68

Troncal Av. 68 **Grupo 9** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP



Maniobra 1

35
Días

Maniobra 2

233
Días

Entidad



Acción 1

321
Días

Troncal Av. Ciudad de Cali





Av. Ciudad de Cali / Agosto 2025

Av. Ciudad de Cali

Grupos 1,2,3 y 4

Alcance



7,42 km
Extensión



\$768.430 Millones
Inversión



Suscripción:
17 Dic 2020



Acta inicio:
26 Jun 2021



Entrega inicial:
Octubre 2023



Entrega estimada
Junio 2026



Atraso: **32 meses**

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

49,98 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

83,86 %
(Construcción)





PENDIENTES

AVENIDA CALI - General

Troncal Av. Cali **Grupo 1** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

Entidad

SDA

Acción 1

47

Días

Acción 2

246

Días



Av. Ciudad de Cali

Grupo 1

Alcance



2,85 km
Extensión



\$158,421 millones
Inversión



Suscripción:
18 Dic 2020



Acta inicio:
26 Ene 2021



Entrega inicial:
Enero 2023



Entrega estimada
Diciembre 2025

Carriles mixtos,
espacio público y
ciclorruta



Atraso: 35 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

72,15 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

99,99 %
(Construcción)

Ago 2025







RETORNO OPERACIONAL

Troncal Av. Ciudad de Cali

Grupo 1

CONVENCIONES

-  Cierre retorno Carrera 81h
-  Giro Prohibido Carrera 80j
-  Tránsito sentido occidente, Kr 80j toma al norte Av. Ciudad de Cali
-  Tránsito sentido sur, Av. Ciudad de Cali toma al oriente por Kr 80j

Cierre Retorno Carrera 81h

Apertura Retorno operacional





PENDIENTES **G1**
AVENIDA CALI

Troncal Av. Cali **Grupo 1** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite		
Días transcurridos por maniobra		
ESP	Maniobra 1	Maniobra 2
 ENEL	37 Días	295 Días



Av. Ciudad de Cali

Grupo 2

Alcance



2,5 km
Extensión



\$249.278 millones
Inversión



Suscripción:
17 Dic 2020



Acta inicio:
26 Ene 2021



Entrega inicial:
Diciembre 2022



Entrega estimada
Por definir



Atraso: **33 meses**

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

47,78 %

(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

62,30 %

(Toma de posesión)

Ago 2025



Estado Av. Cali **Grupo 2** **JULIO 2025**

Se requería gestión
de las entidades

UMV

EAAB

UAESP

ENEL

AGUAS DE BOGOTÁ

UMV

SDM

ETB

Julio 2025



PLAN DE MITIGACIÓN

Troncal Av. Cali / Grupo 2



Troncal Av. Cali – Grupo 2 / Agosto 2025

IDU - UMV

Extensión
2.5 KM

DEL 1 DE AGOSTO AL 29 AGOSTO 2025



Relleno De Material
de Excavación
346,37 M3

Perfilado de abridor en
zona verde



Relleno con material de
excavación en SUDS
22.47 M3

Construcción de plafones
en madera



Relleno con RA
164.18 M3

Bordillos A-85 Instalados



Demolición de carpeta
asfáltica
20 M3

Instalación de mezcla asfáltica
20 M3



Emulsión CRR
82.50 MLT

Sardinel A-10
5 UND

PLAN DE MITIGACIÓN

Troncal Av. Cali / **Grupo 2**



Troncal Av. Cali – Grupo 2 / Agosto 2025

AGUAS BOGOTÁ

- **Recolección de escombros** y disposición a sitios autorizados.
- Actividades de **limpieza preliminar**.
- **Retiro de residuos solidos** no aprovechables.
- **Recuperación de espacio publico**
- Actividades de **corte de césped**.
- **Rebordear los perfiles viales**
- **Señalización bases semafóricas**.
- **Rellenos de maletines** y canalización vial.

SDM

- **Semaforización** de la glorieta SDM.
- **Reubicación de bases** en la glorieta Av. Bosa.
- Modificación de los **tiempos semafóricos**.
- **Instalación de tapas** de cajas semafóricas.
- **Aprobación de Planes de Manejo de Tránsito** por emergencia.

PLAN DE MITIGACIÓN

Troncal Av. Cali / **Grupo 2**



Troncal Av. Cali – Grupo 2 / Agosto 2025

EAAB

- **Bombeo de aguas residuales** calle 57b sur.
- **Programación de bombeo periódico** conjunto Torres de Panoramas
- **Instalación de tapas** 0,7 m 5 unidades
- **Instalación cargue 1,70m en:**
 - ✓ Av. Ciudad de Cali - Calle 42C Sur
 - ✓ Al norte costado oriental frente a torre 8 Urb. San Basilio
- **Nivelación pozos** al norte costado oriental frente a torre 8 Urb. San Basilio

ETB

- Instalación de 24 **tapas**

ENEL

- Ejecución parcial de la **maniobra de elevación de redes de media tensión**, Av. Ciudad de Cali costado occidental calle 55 sur.

UAESP

- Actividades de poda y **recolección de basura**



PENDIENTES **G2**
AVENIDA CALI

Troncal Av. Cali **Grupo 2** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP



EAAB



ETB



ENEL

Maniobra 1

47
Días

47
Días

5
Días

Maniobra 2

47
Días

N/A

N/A



Av. Ciudad de Cali

Grupo 3

Alcance



1,67 km
Extensión



\$160,775 millones
Inversión



Suscripción:
17 Dic 2020



Acta inicio:
28 Ene 2021



Entrega inicial:
Abril 2023



Entrega estimada
Diciembre 2025



Atraso: 31 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

50,48 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

97,51 %
(Construcción)

Ago 2025





PENDIENTES

G3

AVENIDA CALI

Troncal Av. Cali **Grupo 3** / Ago 2025

Desde el inicio del trámite			
Días transcurridos por maniobra			
ESP	Maniobra 1	Maniobra 2	Maniobra 3
 ENEL	198 Días	35 Días	77 Días
 ETB	310 Días	N/A	N/A



Av. Ciudad de Cali

Grupo 4

Alcance



0,4 km
Extensión



\$199,954 millones
Inversión



Suscripción:
21 Dic 2020



Acta inicio:
29 Ene 2021



Entrega inicial:
Octubre 2023



Entrega estimada
Junio 2026



Atraso: 26 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

29,50 %

(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

75,64 %

(Construcción)

Agosto 2025



PENDIENTES **G4**
AVENIDA CALI



Troncal Av. Cali **Grupo 4** / Ago 2025

Corredor Carrera Séptima



Corredor Carrera 7

Calles 99 a 200

Alcance



11,56 km

Extensión



\$1,51 billones

Inversión



Suscripción:

01 Dic 2023



Acta inicio:

19 Feb 2024



Entrega inicial:

Octubre 2027



Entrega estimada

Octubre 2029



Atraso: 24 meses

¿Cómo recibimos?



01 ene. 2024

Proceso de
contratación

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

82,47 %
(Preconstrucción)





Corredor Carrera 7

Lote 1

Alcance



2,95 km
Extensión



\$432.854 Millones
Inversión



Suscripción:
02 Dic 2023



Acta inicio:
23 Feb 2024



Entrega inicial:
Octubre 2027



Entrega estimada
Octubre 2029

Etapa de
Obra



Atraso: 24 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

0,00 %

(Preconstrucción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

74,52 %

(Preconstrucción)

Mayo 2025





PENDIENTES LOTE 1
CORREDOR CARRERA 7

Corredor Carrera 7 Lote 1 / Jun 2025

Desde el inicio del trámite Días transcurridos por maniobra			
ESP	Maniobra 1	Maniobra 2	Maniobra 3
 ENEL - UAESP	62 Días	N/A	N/A
 EAAB	253 Días	243 Días	222 Días
Entidad	Acción 1	Acción 2	Acción 3
 SDA	697 Días	204 Días	134 Días



Corredor Carrera 7

Lote 2

Alcance



6,64 km
Extensión



\$597.954 Millones
Inversión



Suscripción:
01 Dic 2023



Acta inicio:
19 Feb 2024



Entrega inicial:
Abril 2027



Entrega estimada
Abril 2029

Etapa de
Obra



Atraso: 24 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

0,00 %

(Preconstrucción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

78,85 %

(Preconstrucción)

Mayo 2025





PENDIENTES

LOTE 2

CORREDOR CARRERA 7

Corredor Carrera 7 Lote 2 / Jun 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

Entidad	Acción 1
<div><div>SECRETARÍA DE AMBIENTE</div><div>SDA</div></div>	<div>243</div> <div>Días</div>
<div><div>INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL</div><div>IDPC</div></div>	<div>22</div> <div>Días</div>
<div><div>SECRETARÍA DE MOVILIDAD</div><div>SDM</div></div>	<div>7</div> <div>Días</div>
<div><div>UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos</div><div>UAESP</div></div>	<div>42</div> <div>Días</div>



Corredor Carrera 7

Lote 3

Alcance



1,97 km
Extensión



\$486.838 Millones
Inversión



Suscripción:
01 Dic 2023



Acta inicio:
06 Mar 2024



Entrega inicial:
Mayo 2027



Entrega estimada
Mayo 2029

Etapa de
Obra



Atraso: 24 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

0,00 %

(Preconstrucción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

94,03 %

(Preconstrucción)

Mayo 2025





PENDIENTES

LOTE 3

CORREDOR CARRERA 7

Corredor Carrera 7 Lote 2 / Jun 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

Entidad

Acción 1

Acción 2



FDL USAQUEN

63

Días

N/A



DADEP

246

Días

104

Días

AV. LAUREANO GÓMEZ



Av. Laureano Gómez

Calles 170 a 193

Alcance

 **2,3 km**
Extensión

 **\$146.848 millones**
Inversión

 **Suscripción:**
26 Dic 2017

 **Acta inicio:**
21 Feb 2018

 **Entrega inicial:**
Febrero 2020

 **Entrega estimada**
Diciembre 2025

OCTUBRE 2025
• Costado Oriental
(CI 170-183) y (CI 191-193)
• Costado occidental
(CI 185-187)

 **Atraso: 71 meses**

¿Cómo recibimos?

 01 Ene. 2024

75,68 %
(Construcción)

¿En qué vamos?

 25 Ago. 2025

88,64 %
(Construcción)

Avenida Laureano Gómez / 25 Agosto 2025







PENDIENTES






AV. LAUREANO GÓMEZ

Av. Laureano / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP	Maniobra 1	Maniobra 2
 ENEL	86 Días	100 Días
 ETB	106 Días	N/A

Entidad	Acción 1
 EAAB	191 Días
 UAESP	30 Días
 SDIS	26 Días
 Alcaldía USAQUÉN	77 Días
 ANI	43 Días



ZONAS INDUSTRIALES / G1 a G5





Zonas Industriales

Grupos 1 al 5

Alcance



145 CIV's

Entregados: 17
En ejecución: 57
Por iniciar: 71



\$316.452 millones
Inversión



Suscripción:
26 Dic 2017

Acta inicio:
21 feb 2018



Entrega inicial:
Enero 2024



Entrega estimada
Mayo 2027



Atraso: 36 meses

¿Cómo recibimos?

01 Ene. 2024

0,39 %
(Construcción)

¿En qué vamos?

25 Ago. 2025

47,59 %
(Construcción)

Valorización

Acuerdo 724 de 2018

Zonas Industriales Grupo 1

Alcance



2,12 km
Extensión

12 CIV Entregados



\$59.919 millones
Inversión



Suscripción:
25 Nov 2021



Acta inicio:
02 Dic 2021



Entrega inicial:
Agosto 2023



Entrega estimada
Octubre 2025



Atraso: 26 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

1,94 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

96,25 %
(Construcción)

Zonas Industriales Grupo 1 / Agosto 2025





PENDIENTES DTC

Zonas Industriales G.1

Zonas Industriales / Ago 2025

Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP



Maniobra 1

98
Días

Maniobra 2

98
Días

Maniobra 3

96
Días

Valorización

Acuerdo 724 de 2018

Zonas Industriales Grupo 2

Alcance



2,77 km
Extensión



\$66.962 millones
Inversión



Suscripción:
24 Nov 2021



Acta inicio:
02 Dic 2021



Entrega inicial:
Septiembre 2023



Entrega estimada
Abril 2027



Atraso: 42 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

0,82 %

(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

66,86 %

(Construcción)



Valorización

Acuerdo 724 de 2018

Zonas Industriales Grupo 3

Alcance



3,35 km
Extensión



\$57.780 millones
Inversión



Suscripción:
27 Dic 2021



Acta inicio:
19 Ene 2022



Entrega inicial:
Enero 2024



Entrega estimada
Septiembre 2026



Atraso: 32 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

0,00 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025

23,82 %
(Construcción)

Zonas Industriales Grupo 3 / Agosto 2025





Zonas Industriales

Grupo 4

Alcance



2,7 km
Extensión

5 CIV Entregados



\$65.974 millones
Inversión



Suscripción:
27 Dic 2021



Acta inicio:
14 Ene 2022



Entrega inicial:
Enero 2024



Entrega estimada
Marzo 2026



Atraso: 26 meses

¿Cómo recibimos?



01 Ene. 2024

0,00 %
(Construcción)

¿En qué vamos?



25 Ago. 2025



51,01 %
(Construcción)





Desde el inicio del trámite

Días transcurridos por maniobra

ESP	Maniobra 1	Maniobra 2	Maniobra 3	Maniobra 4	Maniobra 5	Maniobra 6	Maniobra 7	Maniobra 8
 ENEL	117 Días	90 Días	63 Días	48 Días	7 Días	155 Días	43 Días	19 Días
 ETB	41 Días	41 Días	54 Días					

Zonas Industriales Grupo 4 /Ago 2025

Acuerdo 724 de 2018

Alcance

6,4 km
Extensión

\$65.815 millones
Inversión

Suscripción:
29 Dic 2023

Acta inicio:
20 Ago 2025

Entrega inicial:
Mayo 2027

Entrega estimada
Mayo 2027

Atraso: 0 meses

01 Ene. 2024

0,00 %
(Construcción)

25 Ago. 2025

0,00 %
(En preliminares)



SOLICITUDES

GENERALES



Fundida Grupo 1 av. 68/ Ago 2025



Durante recorridos de obra, los delegados de las ESP's **no deberán presentar modificaciones aduciendo imposibilidad de recibir las obras**, cuando ya se tienen las actividades ejecutadas.

No obstante, se podrán realizar mesas de trabajo para revisar puntualmente el requerimiento y analizar la viabilidad.



A través de la contratación del IDU, **designar a un profesional por cada una de las empresas de servicios públicos**, con el fin de agilizar los tiempos de respuesta frente a conceptos, propuestas, diseños, recorridos de obra, entre otros, que requiera la ejecución de los proyectos para la respectiva aprobación y/o recibo de la infraestructura.



Puente Calle 153 con Autopista Norte / Agosto 2025



UAESP

- Apoyo para mejorar frecuencias de barrido y recolección de residuos; así como de mantenimiento de áreas verdes y poda de especies arbóreas.
- Flexibilizar requisitos para la autorización de expansiones al sistema de alumbrado público en puntos oscuros de proyectos a cargo del IDU.



EAAB

- Agilizar tiempos de respuesta frente a conceptos, propuestas o diseños que requiera la ejecución de los proyectos con el profesional que contratará el IDU (el profesional aprueba y/o recibe infraestructura) o asignar la responsabilidad al Interventor de aprobar sin nueva revisión de la Empresa.
- Agilizar entrega de paz y salvo para los contratos del IDU en estado de liquidación.
- Garantizar disponibilidad presupuestal de las obras a cargo del acueducto en los proyectos del IDU.



- Mejores tiempos de respuesta en todos los momentos del proceso de maniobras.
- Mayor agilidad en el proceso de soterramiento de redes.
- Apoyo oportuno para el restablecimiento de luminarias apagadas en los proyectos del IDU.
- Disponibilidad de luminarias en los proyectos que cuenten con diseños fotométricos aprobados.
- Articulación interna entre áreas de ENEL.



- Asignación de mayor recurso de personal para optimizar procesos de maniobras y respuestas más ágiles.
- Mayor agilidad en el proceso de soterramiento de redes.
- Recibo y subterranización de tramos parciales de infraestructura construida.
- Articulación interna entre áreas de ETB.

Troncal Av. Cali – Grupo 4 / Agosto 2025



PERMISO SILVICULTURAL

IMPLEMENTACIÓN NUEVOS REQUISITOS

1 Fecha de Implementación: **Julio 1 de 2025**

2 Cantidad contratos afectados: **23**
Troncal Av. 68 / Troncal Av. Cali / Corredor Carrera 7/ Intersección NQS

3 Formato solicitud aprovechamiento forestal
Su modificación implica:

- a** Tiempo adicional para radicación / **Tiempo estimado: 6 meses**
- b** Modificación contratos actuales, **inclusión nuevas actividades:**

- **Aplicación de metodología Corine Land Cover** (identificación de coberturas de la tierra)
- **Estudio técnico que demuestre mejor aptitud de uso del suelo diferente al forestal**
- **Plan de aprovechamiento forestal**
- **Documento con la propuesta de compensación que relacione la pérdida de biodiversidad**
- **Ubicación de especies epífitas vasculares y no vasculares.**

4 Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá / EAAB



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ

Trámites

Priorizados ante entidades




Planta de Tratamiento Tibitoc



EAAB

27

Trámites en curso

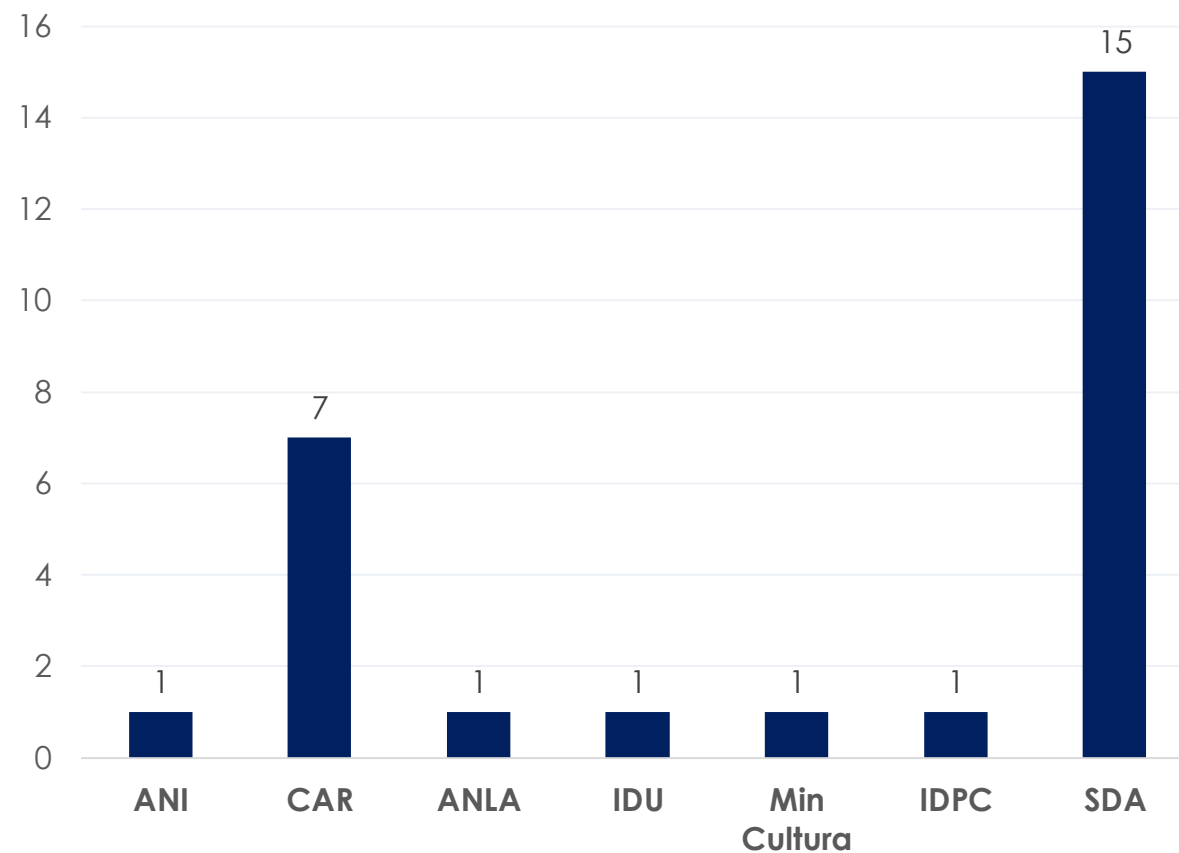

Proyectos

Prioritarios



PTAR Salitre

ANI

Renovación alcantarillado

Molinos II

Radicado: 20254090980002

Fecha: 5 agosto 2025

Acto Administrativo para proceder con suscripción Acta de Inicio



CAR

Sistema Matriz de Acueducto

Aguas Claras

Radicado: 20251015381

Fecha: 18 de febrero 2025

Permiso de aprovechamiento forestal para la construcción del Sistema de acueducto.



CAR


Reúso de agua residual tratada

PTAR Salitre

Radicado: 20251030602


Fecha: 3/07/2025

Concesión de Aguas





Río Bogotá



ANLA

Descontaminación
Río Bogotá

PTAR Salitre

Radicado: 20236200888272

Fecha: 20/11/2023

Modificación Plan de Manejo Ambiental PTAR Salitre



Min. Cultura

Renovación

Línea San Diego

Radicado: MC13060E2024

Fecha: 12 de abril de 2024

Autorización de intervención en el Parque
Nacional Enrique Olaya Herrera (sector histórico)

8

Proposiciones y

VARIOS



Gracias

