

4.9 CURADO DE LOSAS EN CONCRETO

Se aplica a losas de concreto longitud 27.50mts ancho 3.20mts = 88 metros cuadrados.

4.10 CORTE DE PAVIMENTO

Corte longitudinal 27.50mts cortes transversales 3.20mts por 11 unidades = 35.20 metros lineales.

Para un total de = 62.70 metros lineales

4.11 ACERO DE REFUERZO

Canastillas de pasa juntas 281.60 peso kilos

Refuerzos para pozo de agua residuales 60.0 peso kilos

Para un total de = 341.60 peso kilos

4.12 PLACA CUBIERTA

Placas para pozos de aguas residuales 1 unidad en la K00+012

Placas para pozos de aguas residuales 1 unidad en la K00+040

4.13 ACERO DE REFUERZO DE ½ " COSTADO DERECHO

4.13.1 ZARPA ACERO DE ½ "

24varillas #4 longitud 1.10mts = 26.40 metros lineales.

Para un total de = 26.40 metros lineales.

4.13.2 ACERO DE REFUERZO VERTICAL ½ "

24varillas #4 longitud 1.15mts = 27.60 metros lineales.

Para un total de = 27.60 metros lineales.

4.13.3 ACERO DE REFUERZO HORIZONTAL $\frac{1}{2}$ "

10 varillas #4 longitud 2.23mts = 22.30 metros lineales.

Para un total de = 22.30 metros lineales.

4.14 CONCRETO 3000 PSI MURO COSTADO DERECHO

Concreto para viga longitud 2.23mts ancho 0.35mts profundidad 0.35mts
= 0.273 metros cúbicos.

Concreto para el muro longitud 2.23 ancho 0.20mts profundidad 1.0mts
= 0.446 metros cúbicos.

Para un total de = 0.719 metros cúbicos.

4.15 EXCAVACION PARA VIGAS DE MURO

Excavación longitud 2.23mts ancho 0.40mts profundidad 0.70mts
= 0.624 metros cúbicos.

Para un total de = 0.624 metros cúbicos.

4.16 SUBBASE TIPO "PEA" COSTADO DERECHO

Subbase longitud 3.0mts ancho 0.80mts profundidad 0.15mts
= 0.36 metros cúbicos.

Subbase longitud 5.29mts ancho 1.10mts profundidad 0.15mts
= 0.873 metros cúbicos.

Subbase longitud 5.30mts ancho 0.90mts profundidad 0.15mts
= 0.716 metros cúbicos.

Subbase longitud 4.96mts ancho 1.0mts profundidad 0.15mts
= 0.744 metros cúbicos.

Para un total de = 2.693 metros cúbicos.

2001/04

NIVELACION TERRENO NATURAL TRAMO 6

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	0.469	0.67	0.76
K0+37.20	0.82	0.95	0.997
K0+32.20	1.23	1.21	1.251
K0+27.20	1.804	1.91	2.09
K0+22.20	2.275	2.43	2.575
K0+17.20	2.46	2.45	2.66
K0+14.70	3.185	3.26	3.31

Ø	V+	IA
207.602	0.892	208.494

COTAS DE TERRENO NATURAL

K0+42.20	208.025	207.824	207.734
K0+37.20	207.674	207.544	207.497
K0+32.20	207.264	207.284	207.243
K0+27.20	206.69	206.584	206.404
K0+22.20	206.219	206.064	205.919
K0+17.20	206.034	206.044	205.834
K0+14.70	205.309	205.234	205.184

0.7

COTAS DE EXCAVACION

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	207.022	207.079	207.067
K0+37.20	206.888	206.91	206.938
K0+32.20	206.836	206.848	206.806
K0+27.20	206.068	206.11	206.028
K0+22.20	205.652	205.734	205.682
K0+17.20	204.802	204.84	204.872
K0+14.70	204.457	204.459	204.407

Ø	V+	IA
207.602	0.11	207.712

CARTERA DE EXCAVACION

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	0.69	0.633	0.645
K0+37.20	0.824	0.802	0.774
K0+32.20	0.876	0.864	0.906
K0+27.20	1.644	1.602	1.684
K0+22.20	2.06	1.978	2.03
K0+17.20	2.91	2.872	2.84
K0+14.70	3.255	3.253	3.305

#

NIVELACION TERRENO NATURAL TRAMO 6

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	208.025	207.824	207.734
K0+37.20	207.674	207.544	207.497
K0+32.20	207.264	207.284	207.243
K0+27.20	206.69	206.584	206.404
K0+22.20	206.219	206.064	205.919
K0+17.20	206.034	206.044	205.834
K0+14.70	205.309	205.234	205.184

ANCHO VÍA 3.20
LONG 5
ANCHO EXCAVACION 4.00
5
5
5

VOLUMEN EXCAVACION TRAMO 6

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	1.003	0.745	0.667
K0+37.20	0.786	0.634	0.559
K0+32.20	0.428	0.436	0.437
K0+27.20	0.622	0.474	0.376
K0+22.20	0.567	0.33	0.237
K0+17.20	1.232	1.204	0.962
K0+14.70	0.852	0.775	0.777

promedio

altura

volmen
long*ancho*altura

0.805
0.732
0.660
0.434
0.491
0.378
1.133
0.967

14.65
10.93
9.24
8.69
15.11
9.67

CORTAS DE EXCAVACION TRAMO 6

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	207.022	207.079	207.067
K0+37.20	206.888	206.91	206.938
K0+32.20	206.836	206.848	206.806
K0+27.20	206.068	206.11	206.028
K0+22.20	205.652	205.734	205.682
K0+17.20	204.802	204.84	204.872
K0+14.70	204.457	204.459	204.407

2.5

TOTAL VOLUMEN 68.29 M3

127

CARTERA DE RAJÓN

ABSCISA	IZQ	E	DER
KD+42.20	1.31	1.223	1.285
KD+37.20	1.444	1.422	1.404
KD+32.20	1.506	1.474	1.526
KD+27.20	2.157	2.062	2.184
KD+22.20	2.65	2.598	2.65
KD+17.20	3.55	3.492	3.47
KD+14.70	3.875	3.873	3.945

COTAS DE RAJÓN

KD+42.20	207.342	207.429	207.367
KD+37.20	207.208	207.23	207.248
KD+32.20	207.146	207.178	207.126
KD+27.20	206.495	206.59	206.468
KD+22.20	206.002	206.054	206.002
KD+17.20	205.102	205.16	205.182
KD+14.70	204.777	204.779	204.707

COTAS SUB-BASE

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	207.505	207.533	207.499
K0+37.20	207.432	207.461	207.427
K0+32.20	207.268	207.299	207.263
K0+27.20	206.633	206.665	206.626
K0+22.20	206.149	206.179	206.145
K0+17.20	205.252	205.351	205.315
K0+14.70	204.898	204.93	204.898

CARTERA SUB-BASE

K0+42.20	0.631	0.603	0.637
K0+37.20	0.704	0.675	0.709
K0+32.20	0.868	0.837	0.873
K0+27.20	1.503	1.471	1.51
K0+22.20	1.987	1.957	1.991
K0+17.20	2.884	2.785	2.821
K0+14.70	3.238	3.206	3.238

48

Θ	V+	HA	VOLUMEN DE SUB-BASE TRAMO 5				promedio	altura	volmen	
			ABSCISA	IZQ	ε	DER			long*ancho*altura	
207.602	0.534	208.136								
			LONG							
			5	k0+42,20	0.163	0.104	0.132	0.133	0.172	3.44
ANCHO VÍA			5	k0+37,20	0.224	0.231	0.179	0.211	0.169	3.38
3.20			5	k0+32,20	0.122	0.121	0.137	0.127	0.160	3.20
ANCHO EXCAVACION			5	k0+27,20	0.148	0.175	0.258	0.194	0.216	4.32
4.00			5	k0+22,20	0.247	0.225	0.243	0.238	0.198	3.96
			5	k0+17,20	0.15	0.191	0.133	0.158	0.156	1.56
			2.5	k0+14,70	0.12	0.151	0.191	0.154	0.179	
								TOTAL	19.87	M3

COTAS RASANTES TRAMO.6

VIA

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+42.20	207.647	207.679	207.647
K0+37.20	207.572	207.604	207.572
K0+32.20	207.413	207.445	207.413
K0+27.20	206.773	206.808	206.773
K0+22.20	206.291	206.323	206.291
K0+17.20	205.461	205.493	205.461
K0+14.70	205.046	205.078	205.046

	INFORME TOPOGRAFICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

2512
2412

CIV 4005352

148

3. ACTIVIDADES DIARIAS TOPOGRAFICAS

3.1 CIV 4005352 "TRAMO 8"

Fecha 25 de noviembre del 2019 levantamiento topográfico.

Fecha 28 de noviembre del 2019 se materializa niveles de excavación en ambos costados K00+040 - K00+72,60.

Fecha 29 noviembre del 2019 se materializa niveles de excavación en ambos costados K00+025 - K00+040.

Fecha 03 de diciembre 2019 se hace la nivelación del terreno de excavación.

Fecha 06 de diciembre del 2019 materialización de niveles rasante vía de la K00+00 - K00+025.

Fecha 07 de diciembre del 2019 se hace la remarcación de abscisas ambos costados y se replantea pozo.

Fecha 09 de diciembre del 2019 replanteo de sumidero para construcción y alineamiento de sardinel para excavación y niveles para los mismos costados derechos K0+067.

Fecha 10 de diciembre del 2019 niveles para realce de pozo y niveles para sumidero chequeo de niveles para sub- base K0+063,84

Fecha 11 de diciembre del 2019 alineamiento de sardinel y niveles para excavación costado izquierdo y chequeo de niveles costado derecho.

Fecha 12 de diciembre del 2019 chequeo de niveles para excavación sardinel ambos costados se referencia los niveles y los alineamientos K00+72,60 - K00+040.

Fecha 13 de diciembre del 2019 nivelación de terreno de sub- base vía, toma de medidas para el fallo 1.

Fecha 17 de diciembre del 2019 localización de alineamiento del límite de vía en ambos costados K00+000 - K00+025.

Fecha 18 de diciembre del 2019 materialización de modulaciones ambos costados niveles para céreo sub-base K00+72,60 - K00+30.

Fecha 19 de diciembre del 2019 toma de medidas para el fallo 2, localización para instalación de bordillo.

Fecha 20 de diciembre del 2019 materialización niveletas cada 5 metros rasantes en ambos costados K00+000 - K00+72,60.

Fecha 21 de diciembre del 2019 toma de datos promedios anchos y longitud para pedir concreto modulaciones de juntas para placas.

Fecha 23 de diciembre del 2019 materialización de niveles para sardinel costado izquierdo K00+000 - K00+20,0.

Fecha 24 de diciembre del 2019 localización alineamiento ambos costados sardineles de la K00+000 - K00+20,0.

149

Fecha 27 de diciembre del 2019 se localiza los muros.

Fecha 28 de diciembre del 2019 se materializa niveles rasantes en ambos costados.

Fecha 30 de diciembre del 2019 se materializa niveles de muros.

Fecha 27 de enero del 2020 modulaciones para instalación de adoquín.

Fecha 28 de enero del 2020 se mide anchos longitud y profundidad de los llenos en sub base granular PEA. K00+029 - K00+72.60 costado derecho K00+029 - K00+68.25.

Fecha 28 enero del 2020 se materializa niveles de rasante en costado derecho K00+03.26 - K00+12.26.

Fecha 29 de enero 2020 toma de datos de acero de refuerzo, en muros concreto K00+12.26 - K00+03.26.

4. CANTIDADES CIV 4005352 "TRAMO 8"

4.1 EXCAVACION MECANICA

Excavación caja longitud 59.60mts ancho 4.00mts profundidad 0.65mts = 154.96 metros cúbicos.

Excavación caja longitud 15.40mts ancho 4.00mts profundidad 0.65mts = 40.04 metros cúbicos.

Para un total = 195 metros cúbicos.

4.2 EXCAVACION MANUAL

Excavación para protección tubería agua potable longitud 59.60mts ancho 0.50mts 0.50mts = 14.90 metros cúbicos.

Excavación del sumidero longitud 1.20mts ancho 1.0mts profundidad 1.0mts = 1.20 metros cúbicos.

Excavación de pozo longitud 5.34mts ancho 0.20mts profundidad 0.30mts = 0.32 metros cúbicos.

Excavación para conexión de sumidero a pozo tubería 12 pulgadas longitud 1.25mts ancho 0.60mts profundidad 0.70mts = 0.53 metros cúbicos.

Excavación para acometidas agua potable longitud 4.0mts ancho 0.20mts profundidad 0.20mts son 17 acometidas = 2.72 metros cúbicos.

Excavación para instalación de sardinel costado derecho longitud 72.60mts ancho 0.30mts profundidad 0.35mts = 7.62 metros cúbicos.

Excavación para instalación de sardinel costado izquierdo longitud 61.20mts ancho 0.30mts profundidad 0.35mts = 6.43 metros cúbicos.

Excavación fallo 1 longitud 11mts ancho 4.0 profundidad 0.50mts = 22.0 metros cúbicos.

Excavación fallo 2 longitud 3.30mts ancho 1.70mts profundidad 0.40mts = 2.24 metros cúbicos.

Excavación anden costado izquierdo longitud 38.0mts ancho 1.03mts profundidad 0.24mts = 8.57 metros cúbicos.

Excavación anden costado derecho longitud 26.50mts ancho 0.82mts profundidad 0.24mts = 4.27 metros cúbicos.

Excavación cajas domiciliarias costado derecho longitud 1.20mts ancho 1.0mts profundidad 1.10mts = 10.56 metros cúbicos.

Excavación cajas domiciliarias costado izquierdo longitud 1.0mts ancho 1.10mts profundidad 1.10mts = 8.47 metros cúbicos.

Para un total de = 90.25 metros cúbicos

4.3 SUBBASE GRANULAR TIPO C

Subbase para fallo 1 longitud 11mts ancho 4.0mts profundidad 0.20mts = 8.80 metros cúbicos.

Subbase para fallo 2 longitud 4.60mts ancho 2.20mts profundidad 0.25mts = 2.53 metros cúbicos

Subbase en la vía longitud 75.0mts ancho 4.0mts profundidad 0.305mts = 91.5 metros cúbicos.

Subbase para mejorar peralte longitud 4.60mts ancho 4.0mts profundidad 0.24mts = 4.42 metros cúbicos.

Para un total de = 106.74 metros cúbicos.

4.4 ESTABILIZACION DE RAJON

Rajón para el fallo 1 longitud 11.0mts ancho 4.0mts profundidad 0.30mts = 13.20 metros cúbicos.

Rajón para fallo 2 longitud 4.6mts ancho 2.20mts profundidad 0.25mts = 2.53 metros cúbicos.

Para un total de = 15.73 metros cúbicos.

4.5 CONCRETO MR 45

Concreto MR 45 longitud 47.10mts ancho 3.60mts profundidad 0.14mts = 23.74 metros cúbicos.

Para un total de 23.74 metros cúbicos.

151

Excavación de 3 metros de profundidad en el fondo del pozo.
 2.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.

Para un total de 2.24 metros cúbicos.

3.3. EXCAVACIÓN DE 3 METROS

Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 2.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 3 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.

Para un total de 2.24 metros cúbicos.

4.4. EXCAVACIÓN DE 4 METROS

Excavación en el fondo del pozo de 4 metros de profundidad.
 2.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 4 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 4 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 4 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 4 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 4 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.

4.5. EXCAVACIÓN DE 5 METROS

Excavación en el fondo del pozo de 5 metros de profundidad.
 2.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 5 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 5 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 5 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 5 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.
 Excavación en el fondo del pozo de 5 metros de profundidad.
 0.24 metros cúbicos.

Para un total de 2.24 metros cúbicos.

4.6 CURADO DE LOSAS EN CONCRETO

Curado de concreto longitud 47.10mts ancho 3.60mts = 169.56 metros cuadrados

4.7 CORTE PAVIMENTO

Corte longitudinal 47.10mts = 47.10 metros lineales

Corte transversal longitud 3.60mts por 14 unidades = 50.40 metros lineales

Para un total de = 97.50 metros lineales

4.8 ACERO DE REFUERZO

Acero de refuerzo para las placas en concreto canastillas pasa juntas 432.0 kg

Refuerzo de pozo aguas residuales 78.0kg

Acero refuerzo sumidero 18.0kg

Para un total de 528.0kg

4.9 BORDILLO PREFABRICADO

Bordillo prefabricado 35 metros lineales

4.10 SARDINEL A85

Sardinel bajo rampa 25.23 metros lineales

4.11 GEOTEXTIL

Para separación de sub rasante longitud 75mts ancho 4.0mts = 300 metros cuadrados.

0-9-100-VP-0260-34-ACAHUS - d.d.

[illegible]

000000 11800 24

[illegible]

... ..

03-1461-2002A 94

Barren total 0.43 0.05
Acidic total 2.25 0.08
Acidic total 2.25 0.08
Retained 0.40 0.05
Acidic total 2.25 0.08

024 10 242 563 1901 P.4

1. What is the purpose of the study?

200 AUGUST 1974

100-443888-1000

207-1-0000 10

1. 姓名: 李 明
 2. 性别: 男
 3. 年龄: 25
 4. 职业: 教师
 5. 籍贯: 湖南长沙
 6. 民族: 汉族
 7. 婚姻状况: 未婚
 8. 健康状况: 良好
 9. 兴趣爱好: 阅读、运动
 10. 教育程度: 本科
 11. 工作经历: 3年
 12. 自我评价: 积极向上, 责任心强

4.12 SUB BASE GRANULAR TIPO "PEA"

Instalación sub base granular "PEA" costado derecho longitud 43.60mts ancho 0.82mts profundidad 0.15mts = 5.36 metros cúbicos.

Instalación sub base granular "PEA" costado izquierdo longitud 39.25mts ancho 1.03mts profundidad 0.15mts = 6.064 metros cúbicos.

Para un total = 11.42 metros cúbicos.

4.13 CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DOMICILIARIAS

Construcción de caja domiciliaria costado derecho "1 caja" longitud 0.70mts ancho 0.70mts = 0.49 metros cuadrados.

Construcción de caja domiciliaria costado izquierdo "1 caja" longitud 0.70mts ancho 0.70mts = 0.49 metros cuadrados.

Para un total de = 0.98 metros cuadrados.



LUIS ARIEL BUITRAGO GOMEZ
Representante Legal
Buitrago Topógrafos SAS
NIT. 900.887.576-1

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7099
TEL: 773/936-5000 FAX: 773/936-5001
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7099
TEL: 773/936-5000 FAX: 773/936-5001
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
54 EAST LAKE STREET
CHICAGO, ILLINOIS 60607-7099
TEL: 773/936-5000 FAX: 773/936-5001
WWW.CHICAGO.PRESS.EDU

03/ Dic / 2019

		03/ Dic / 2019	
	terreno	Natural	tramo 8
	lt	lt	Per
R0+00	3.489	3.289	3.139
R0+05	2.124	2.087	2.051
R0+10	1.202	1.188	1.174
R0+15	0.256	0.259	0.256
R0+20	0.093	0.017	0.021
① 945.0	vt 1.893	π 946.893	
R0+25	1.265	1.219	1.209
R0+30	1.176	1.13	1.094
R0+35	1.030	1.005	0.977
R0+40	1.038	0.974	0.924
R0+45	1.756	1.085	1.087
R0+50	1.43	1.362	1.294
R0+55	1.729	1.70	1.636
R0+60	2.111	1.985	1.885
R0+65	2.369	2.311	2.194
R0+70	2.321	2.23	2.199
R0+72.38	2.272	2.299	2.313
① 947.	vt 1.25	π 948.25	
R0+75.0	2.145	2.187	2.235
	945.00		

Excavacion tramo 8

	12	E	DEN
Kofo0	4.931	4.834	4.750
Kofo5	3.939	3.871	3.791
Kofo10	2.977	2.868	2.824
Kofo15	1.955	1.924	1.881
Kofo20	1.651	1.615	1.599
Kofo25	1.488	1.425	1.404
Kofo30	1.329	1.321	1.280
Kofo35	1.206	1.153	1.122
Kofo40	1.120	1.084	1.055
$\odot 948.00$ $\cup$ 2.856 π 947.856			
Kofo45	0.508	0.41	0.246
Kofo50	0.614	0.522	0.48
Kofo55	0.85	0.804	0.762
Kofo60	1.385	1.27	1.95
Kofo65	1.560	1.534	1.479
Kofo70	1.759	1.704	1.71
Kofo72.38	1.87	1.85	1.80
Kofo75.0	1.90	1.88	1.83

EXCAVACIÓN TRAMO 8			
K0+00	4931	4834	-4.75
K0+05	3839	3971	3.671
K0+10	2811	2768	2.724
K0+15	1955	1924	-1.881
K0+20	1651	1615	-1.599
K0+25	1588	1552	-1.504
K0+30	1429	1421	-1.38
K0+35	1306	1226	-1.222
K0+40	1222	1184	-1.155
945.00 vt 2856 T 947.856			
12 E DER			
K0+45	708	61	-446
K0+50	414	812	1.78
K0+55	1275	1204	-7.762
K0+60	7585	147	-7395
K0+65	186	7834	7.774
K0+70	1753	7203	7.71
K0+75	187	185	1.80
K0+80	190	188	1.83

Sub-base TRAMO 8			
K0+00	4571	448	4.388
K0+05	3581	3506	1.3.433
K0+10	2592	2535	2.477
K0+15	1604	1565	7.521
K0+20	1286	1125	7.215
K0+25	1144	1103	1.069
K0+30	1011	957	929
K0+35	1853	817	782
K0+40	812	772	732
K0+45	11954	11905	854
K0+50	7202	7154	710
K0+55	1498	1455	1.402
K0+60	1889	1768	1.698
K0+65	2095	201	7.92
K0+70	2115	2079	7.045
K0+75	2098	2099	2099
945.0 vt 7.754 T 947.354			
K0+80	1988	1987	1.990

COTAS TERRENO NATURAL TRAMO 8

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	943.454	943.604	943.754
K0+05	944.769	944.806	944.842
K0+010	945.691	945.705	945.719
K0+015	946.637	946.634	946.637
K0+020	946.800	946.876	946.872
K0+025	946.985	947.031	947.041
K0+030	947.074	947.120	947.156
K0+035	947.220	947.245	947.273
K0+040	947.212	947.276	947.326
K0+045	947.094	947.165	947.163
K0+050	946.820	946.888	946.956
K0+055	946.521	946.550	946.614
K0+060	946.139	946.265	946.365
K0+065	945.881	945.939	946.056
K0+070	945.929	946.020	946.051
K0+072.38	945.978	945.951	945.935
K0+075	946.5	946.453	946.428

Θ	V+	IA
945.000	1.893	946.893

Θ	V+	IA
947.000	1.250	948.250

CARTERA TERRENO NATURAL TRAMO 8

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	3.439	3.289	3.139
K0+05	2.124	2.087	2.051
K0+010	1.202	1.188	1.174
K0+015	0.256	0.259	0.256
K0+020	0.093	0.017	0.021
K0+025	1.265	1.219	1.209
K0+030	1.176	1.130	1.094
K0+035	1.030	1.005	0.977
K0+040	1.038	0.974	0.924
K0+045	1.156	1.085	1.087
K0+050	1.430	1.362	1.294
K0+055	1.729	1.700	1.636
K0+060	2.111	1.985	1.885
K0+065	2.369	2.311	2.194
K0+070	2.321	2.230	2.199
K0+072.38	2.272	2.299	2.315
K0+075	2.145	2.187	2.255

342c

COTAS EXCAVACION TRAMO B

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	942.925	943.022	943.106
K0+05	944.017	944.085	944.185
K0+010	945.045	945.088	945.132
K0+015	945.901	945.932	945.975
K0+020	946.205	946.241	946.257
K0+025	946.268	946.331	946.352
K0+030	946.427	946.435	946.476
K0+035	946.550	946.630	946.634
K0+040	946.636	946.672	946.701
K0+045	946.392	946.490	946.654
K0+050	946.186	946.278	946.320
K0+055	945.825	945.896	945.938
K0+060	945.515	945.630	945.705
K0+065	945.240	945.266	945.326
K0+070	945.347	945.396	945.390
K0+072.38	945.230	945.250	945.300
K0+075	945.85	945.9	945.92

CARTERA EXCAVACION TRAMO B

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	4.931	4.834	4.750
K0+05	3.939	3.871	3.771
K0+010	2.911	2.868	2.824
K0+015	1.955	1.924	1.881
K0+020	1.651	1.615	1.599
K0+025	1.488	1.425	1.404
K0+030	1.329	1.321	1.280
K0+035	1.206	1.153	1.122
K0+040	1.120	1.084	1.055
K0+045	0.508	0.41	0.246
K0+050	0.614	0.522	0.48
K0+055	0.85	0.804	0.762
K0+060	1.385	1.27	1.195
K0+065	1.56	1.534	1.474
K0+070	1.753	1.704	1.71
K0+072.38	1.87	1.85	1.8
K0+075	1.9	1.88	1.83

Θ	V+	IA
945.000	2.956	947.956

Θ	V+	IA
947.000	0.1	947.100

19

2423

COTAS SUB BASE TRAMO 8

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	943.183	943.274	943.366
K0+05	944.173	944.248	944.321
K0+010	945.162	945.219	945.277
K0+015	946.150	946.189	946.233
K0+020	946.468	946.504	946.539
K0+025	946.610	946.651	946.685
K0+030	946.754	946.797	946.825
K0+035	946.901	946.937	946.972
K0+040	946.942	946.982	947.022
K0+045	946.800	946.849	946.900
K0+050	946.552	946.600	946.654
K0+055	946.256	946.299	946.352
K0+060	945.865	945.986	946.056
K0+065	945.659	945.744	945.834
K0+070	945.639	945.675	945.709
K0+072.38	945.658	945.659	945.655
K0+075	945.921	945.925	945.923

Θ	V+	IA
945.000	2.754	947.754

CARTERA SUB BASE

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	4.571	4.480	4.388
K0+05	3.581	3.506	3.433
K0+010	2.592	2.535	2.477
K0+015	1.604	1.565	1.521
K0+020	1.286	1.250	1.215
K0+025	1.144	1.103	1.069
K0+030	1.000	0.957	0.929
K0+035	0.853	0.817	0.782
K0+040	0.812	0.772	0.732
K0+045	0.954	0.905	0.854
K0+050	1.202	1.154	1.100
K0+055	1.498	1.455	1.402
K0+060	1.889	1.768	1.698
K0+065	2.095	2.010	1.920
K0+070	2.115	2.079	2.045
K0+072.38	2.096	2.095	2.099
K0+075	1.988	1.987	1.990

18

COTAS RASANTES TRAMO 8

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	943.325	943.417	943.508
K0+05	944.315	944.389	944.463
K0+010	945.305	945.362	945.418
K0+015	946.295	946.334	946.373
K0+020	946.610	946.646	946.682
K0+025	946.755	946.791	946.827
K0+030	946.900	946.936	946.972
K0+035	947.045	947.081	947.117
K0+040	947.082	947.124	947.165
K0+045	946.942	946.991	947.040
K0+050	946.692	946.743	946.794
K0+055	946.397	946.446	946.494
K0+060	946.005	946.129	946.203
K0+065	945.801	945.889	945.976
K0+070	945.779	945.815	945.851
K0+072.38	945.800	945.801	945.801
K0+075	946.065	946.065	946.063

2425

COTAS TERRENO NATURAL TRAMO 8

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	943.454	943.604	943.754
K0+005	944.789	944.808	944.842
K0+010	945.691	945.705	945.719
K0+015	946.637	946.634	946.637
K0+020	946.800	946.876	946.872
K0+025	946.985	947.031	947.041
K0+030	947.074	947.120	947.156
K0+035	947.220	947.245	947.273
K0+040	947.212	947.275	947.328
K0+045	947.094	947.165	947.163
K0+050	946.820	946.888	946.956
K0+055	946.521	946.550	946.614
K0+060	946.139	946.265	946.365
K0+065	945.881	945.939	946.056
K0+070	945.928	946.070	946.091
K0+072.38	945.978	945.951	945.935
K0+075	946.5	946.433	946.428

COTAS EXCAVACION TRAMO 8

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	942.925	943.022	943.106
K0+005	944.027	944.085	944.185
K0+010	945.045	945.088	945.132
K0+015	945.901	945.932	945.975
K0+020	946.205	946.241	946.257
K0+025	946.268	946.331	946.352
K0+030	946.427	946.435	946.476
K0+035	946.550	946.630	946.634
K0+040	946.636	946.672	946.701
K0+045	946.392	946.490	946.654
K0+050	946.186	946.278	946.320
K0+055	945.825	945.896	945.938
K0+060	945.515	945.630	945.705
K0+065	945.240	945.266	945.326
K0+070	945.347	945.396	945.390
K0+072.38	945.230	945.250	945.300
K0+075	945.85	945.9	945.92

ANCHO EXCAVACION LONG
4.00

ABSCISA	IZQ	E	DER	promedio	altura	volmen long*ancho*altura
K0+000	0.529	0.582	0.648	0.586	0.648	12.963
K0+005	0.752	0.721	0.657	0.710	0.663	13.267
K0+010	0.646	0.617	0.587	0.617	0.658	13.167
K0+015	0.736	0.702	0.662	0.700	0.658	13.150
K0+020	0.595	0.635	0.615	0.615	0.659	13.170
K0+025	0.717	0.700	0.689	0.702	0.686	13.727
K0+030	0.647	0.685	0.680	0.671	0.656	13.120
K0+035	0.670	0.615	0.639	0.641	0.671	12.430
K0+040	0.576	0.604	0.625	0.602	0.615	17.303
K0+045	0.702	0.675	0.509	0.629	0.628	12.553
K0+050	0.634	0.610	0.636	0.627	0.651	13.020
K0+055	0.696	0.654	0.676	0.675	0.658	13.150
K0+060	0.624	0.635	0.660	0.640	0.660	13.210
K0+065	0.641	0.673	0.730	0.681	0.652	13.037
K0+070	0.582	0.624	0.561	0.622	0.659	6.269
K0+072.38	0.748	0.701	0.635	0.695	0.632	6.529
K0+075	0.650	0.553	0.508	0.570		

TOTAL 195.164 M3

FALLO 1		
Longitud	Ancho	Prof
11.0	4.0	0.50

TOTAL 22.000

FALLO 2		
Longitud	Ancho	Prof
4.60	2.20	0.40

TOTAL 4.048

TOTAL 211.212 M3

24

2725

COTAS EXCAVACION TRAMO 3

ABSCISA	IZO	E	DER
FD-000	942.923	943.022	943.106
FD-05	944.017	944.085	944.183
FD-010	945.045	945.088	945.182
FD-015	945.801	945.932	945.975
FD-020	946.201	946.241	946.257
FD-025	946.248	946.331	946.357
FD-030	946.427	946.435	946.476
FD-035	946.550	946.630	946.834
FD-040	946.634	946.672	946.701
FD-045	946.592	946.490	946.654
FD-050	946.126	946.278	946.370
FD-055	945.823	945.896	945.938
FD-060	945.515	945.630	945.705
FD-065	945.240	945.266	945.326
FD-070	945.347	945.396	945.390
FD-072.38	945.230	945.250	945.300
FD-075	945.851	945.9	945.92

COTAS SUB-BASE TRAMO 3

ABSCISA	IZO	E	DER
FD-000	943.181	943.274	943.368
FD-05	944.173	944.248	944.321
FD-010	945.162	945.219	945.277
FD-015	946.150	946.189	946.231
FD-020	946.468	946.504	946.579
FD-025	946.610	946.651	946.685
FD-030	946.754	946.793	946.825
FD-035	946.901	946.937	946.972
FD-040	946.947	946.987	947.022
FD-045	946.800	946.841	946.900
FD-050	946.552	946.600	946.654
FD-055	946.356	946.399	946.452
FD-060	945.885	945.988	946.056
FD-065	945.659	945.744	945.834
FD-070	945.679	945.675	945.709
FD-072.38	945.658	945.655	945.655
FD-075	945.923	945.925	945.923

VOLUMEN SUB-BASE

ANCHO EXCAVACION 4.00	LONG	ABSCISA	IZO	E	DER	promedio	altura	volumen long*ancho*altura
	5	FD-000	0.254	0.252	0.240	0.257	0.204	
	5	FD-05	0.156	0.163	0.134	0.152	0.141	2.827
	5	FD-010	0.117	0.131	0.145	0.133	0.193	3.857
	5	FD-015	0.249	0.257	0.258	0.255	0.262	5.240
	5	FD-020	0.263	0.263	0.282	0.268	0.300	6.010
	5	FD-025	0.342	0.320	0.333	0.332	0.319	6.777
	5	FD-030	0.527	0.362	0.349	0.346	0.339	6.780
	5	FD-035	0.351	0.307	0.338	0.332	0.322	6.443
	5	FD-040	0.306	0.310	0.321	0.312	0.325	6.509
	5	FD-045	0.408	0.359	0.246	0.338	0.339	6.781
	5	FD-050	0.344	0.322	0.334	0.341	0.378	7.567
	5	FD-055	0.431	0.403	0.414	0.416	0.384	7.683
	5	FD-060	0.350	0.356	0.351	0.352	0.410	8.207
	5	FD-065	0.419	0.478	0.508	0.468	0.382	7.650
	5	FD-070	0.282	0.279	0.319	0.297	0.347	3.303
7.38		FD-072.38	0.478	0.409	0.355	0.397	0.215	2.255
2.42		FD-075	0.071	0.025	0.009	0.033		
TOTAL								93.965 m3

10/11

2027
13

BOFAS SUB BASE TRAMO 3

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	943.183	943.274	943.366
K0+005	944.173	944.248	944.321
K0+010	945.162	945.219	945.277
K0+015	946.150	946.189	946.233
K0+020	946.468	946.504	946.539
K0+025	946.610	946.651	946.685
K0+030	946.734	946.797	946.825
K0+035	946.901	946.937	946.972
K0+040	946.947	946.982	947.022
K0+045	946.800	946.845	946.900
K0+050	946.552	946.600	946.654
K0+055	946.256	946.299	946.357
K0+060	945.865	945.986	946.056
K0+065	945.659	945.744	945.834
K0+070	945.639	945.675	945.709
K0+072.38	945.658	945.659	945.655
K0+075	945.921	945.925	945.923

BOFAS RASANTES TRAMO 3

ABSCISA	IZQ	E	DER
K0+000	943.325	943.417	943.508
K0+005	944.315	944.389	944.469
K0+010	945.305	945.367	945.418
K0+015	946.295	946.334	946.373
K0+020	946.610	946.646	946.682
K0+025	946.755	946.791	946.827
K0+030	946.900	946.936	946.972
K0+035	947.045	947.081	947.117
K0+040	947.087	947.124	947.165
K0+045	946.942	946.991	947.040
K0+050	946.692	946.743	946.794
K0+055	946.397	946.446	946.494
K0+060	946.005	946.129	946.203
K0+065	945.821	945.889	945.976
K0+070	945.779	945.815	945.851
K0+072.38	945.800	945.801	945.801
K0+075	946.065	946.065	946.063

ANCHO VÍA
3.60

LONG

ABSCISA

IZQ

E

DER

promedio

altura

volmen
long*ancho*altura

5

K0+000

0.142

0.143

0.142

0.142

0.142

2.536

5

K0+005

0.142

0.141

0.142

0.142

0.142

2.556

5

K0+010

0.143

0.143

0.141

0.142

0.143

2.571

5

K0+015

0.145

0.145

0.140

0.143

0.143

2.571

5

K0+020

0.142

0.142

0.143

0.142

0.142

2.562

5

K0+025

0.145

0.140

0.142

0.142

0.143

2.577

5

K0+030

0.146

0.139

0.147

0.144

0.144

2.595

5

K0+035

0.144

0.144

0.145

0.144

0.143

2.574

5

K0+040

0.140

0.142

0.143

0.142

0.142

2.547

5

K0+045

0.142

0.142

0.140

0.141

0.141

2.541

5

K0+050

0.140

0.143

0.140

0.141

0.142

2.559

5

K0+055

0.141

0.147

0.142

0.143

0.143

2.580

5

K0+060

0.140

0.143

0.147

0.143

0.143

2.577

5

K0+065

0.142

0.145

0.142

0.143

0.142

2.553

2.38

K0+072.38

0.142

0.142

0.146

0.143

0.142

1.217

2.62

K0+075

0.144

0.140

0.140

0.141

0.142

1.942

TOTAL 38.478 m3

ESPACIO PUBLICO COSTADO IZQUIERDO TRAMO B

DIRECCION 408-044		
LONG	6.80	
ANCHO	1.00	

AREA EXCAVACION		
6.8		M2

DIRECCION 418-0751		
LONG	5.56	
ANCHO	1.00	

AREA EXCAVACION		
5.560		M2

DIRECCION 418-135		
LONG	5.5	
ANCHO	1.41	

AREA EXCAVACION		
7.755		M2

DIRECCION 418-175		
LONG	5.40	
ANCHO	1.0	

AREA EXCAVACION		
5.4		M2

DIRECCION 418-235		
LONG	5.5	
ANCHO	0.98	

AREA EXCAVACION		
5.390		M2

DIRECCION 418-275		
LONG	5.5	
ANCHO	1.0	

AREA EXCAVACION		
5.5		M2

DIRECCION 418-335		
LONG	5.5	
ANCHO	1.0	

AREA EXCAVACION		
5.5		M2

DIRECCION 1011		
LONG	26.92	
ANCHO	1.20	

AREA EXCAVACION		
32.304		M2

TOTAL	74.209	M2
-------	--------	----

AREA DE EXCAVACION	74.209
--------------------	--------

CAJAS DOMICILIARIAS

DIRECCION 338-015		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

VOLUMEN CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 418-0751		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 418-135		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 418-175		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 418-235		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 418-275		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 418-335		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

DIRECCION 1011		
LONG	0.70	
ANCHO	0.70	

AREA CAJAS		
0.49		M2

TOTAL	3.92	M2
-------	------	----

AREA CAJAS	3.92
------------	------

AREA EXCAVACION	74.209
PROFUNDIDAD EXCAVACION	0.24

ST

REPORTE DE ACTIVIDADES DIARIAS

FECHA	ACTIVIDADES	CIV	OBSERVACIONES
06-dic-19	MATERIALIZACION DE NIVELES DE RASANTES VIA	4005352	K00+000 - K00+025
07-dic-19	NIVELACION DE SUB-BASE VIA	4005352	K00+025 - K00+72,60
09-dic-19	REPLANTEO DE SUMIDERO PARA CONSTRUCCION	4005352	K0+067
09-dic-19	MATERIALIZACION DE NIVELES PARA SARDINEL COSTADO DERECHO	4005352	K00+72,60 - K00+040
10-dic-19	NIVELES PARA NIVELACION POZO	4005352	K0+063,84
10-dic-19	NIVELES PARA NIVELACION SUMIDERO	4005352	K0+067
10-dic-19	NIVELES PARA EXCAVACION SARDINEL Y REPLANTEO DE LINEAMIENTO	4005352	K00+72,60 - K00+35 AMBOS COSTADOS
11-dic-19	CHEQUEO NIVELES PARA EXCAVACION	4005352	K00+000 - K00+025
12-dic-19	REFERENCIAR ALINEAMIENTO PARA SARDINEL AMBOS COSTADOS	4005352	K00+72,60 - K00+040
13-dic-19	NIVELACION DE SUB-BASE VIA	4005352	K00+000 - K00+025
13-dic-19	TOMA DE DATOS DE FALLO 1	4005352	K00+68,70
17-dic-19	LOCALIZACION ALINEAMIENTO AMBOS COSTADOS	4005352	K00+000 - K00+025
17-dic-19	REFERENCIAR ALINEAMIENTO PARA SARDINEL AMBOS COSTADOS	4005352	K00+000 - K00+025
18-dic-19	MATERIALIZACION DE MODULACIONES AMBOS COSTADOS	4005352	K00+72,60 - K00+30
18-dic-19	NIVELES PARA CERO SUB-BASE	4005352	K00+72,60 - K00+30
19-dic-19	TOMA DE DATOS DE FALLO 2	4005352	K00+12,50
20-dic-19	MATERIALIZACION NIVELITAS CADA 5 METROS RASANTES	4005352	K00+72,60
21-dic-19	TOMA DE DATOS PROMEDIOS ANCHOS Y LONGITUD PARA PEDIR CONCRETO	4005352	K00+72,60 - K00+53,0
21-dic-19	MODULACIONES DE JUNTAS PARA PLACAS	4005352	K00+72,60 - K00+53,0
23-dic-19	MATERIALIZACION DE NIVELES PARA SARDINEL COSTADO IZQUIERDO	4005352	K00+000 - K00+20,0
24-dic-19	LOCALIZACION ALINEAMIENTO AMBOS COSTADOS SARDINEL	4005352	K00+000 - K00+20,0
25-dic-19	REPLANTEO Y MATERIALIZACION DE NIVELES DE EXCAVACION MUROS	4005352	K00+000 - K00+20,0
26-dic-19	LOCALIZACION DE ESCALERAS EN ESPACIO PUBLICO	4005352	K00+68,66 - K00+45,0
27-dic-19	NIVELES DE PEA PARA ESPACIO PUBLICO	4005352	K00+72,60 - K00+58,23
28-dic-19	MATERIALIZACION DE NIVELES ESPACIO PUBLICO AMBOS COSTADOS	4005352	K00+68,66 - K00+45,0
28-dic-19	MATERIALIZACION DE NIVELES RASANTES PARA SIMBRADO CONCRETO	4005352	K00+72,60 - K00+53,0
28-dic-19	REMARCAION DE MODULACIONES	4005352	K00+72,60 - K00+53,0
02-ene-20	NIVELES PARA EXCAVACION DE ESPACIO PUBLICO COSTADO IZQUIERDO	4005352	K00+72,60 - K00+40
03-ene-20	NIVELES PARA EXCAVACION DE ESPACIO PUBLICO COSTADO IZQUIERDO	4005352	K00+40 - K00+000
07-ene-20	VERIFICACION DE ALINEAMIENTO DE BORDILLO	4005352	K00+72,60 - K00+55,30
07-ene-20	ALINEAMIENTO PARA EXCAVACION BORDILLO	4005352	K00+00 K00+20
08-ene-20	NIVELES PARA PEA ESPACIO PUBLICO	4005352	K00+00 K00+20
09-ene-20	NIVELES PARA EXCAVACION ESPACIO PUBLICO COSTADO DERECHO	4005352	K00+58,23 - K00+25
10-ene-20	NIVELES PARA EXCAVACION ESPACIO PUBLICO COSTADO DERECHO	4005352	K00+25 - K00+00
13-ene-20	MATERIALIZACION DE NIVELES PARA MUROS	4005352	K00+12,26 - K00+3,26
14-ene-20	MATERIALIZACION CON REFERENCIA NIVELES PARA EXCAVACION MUROS	4005352	K00+12,26 - K00+3,26
17-ene-20	NIVELES PARA ZARPA DE MUROS	4005352	K00+3,26

15

2430

Alcaldía de Bogotá	INFORME TOPOGRAFICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

CIV 4005079

106

3. ACTIVIDADES DIARIAS TOPOGRAFICAS

3.1 CIV 4005079 "TRAMO 10"

Fecha 02 de diciembre del 2019 nivelación del terreno natural K00+47 - K0+20,90.

Fecha 07 de diciembre del 2019 localización de eje para excavación manual escaleras K00+47 - K0+20,90.

Fecha 10 de diciembre del 2019 materialización de niveles para excavación K00+47 - K0+20,90.

Fecha 14 de diciembre 2019 materialización de niveles para excavación y referenciados K00+47 - K0+40,50.

Fecha 16 de diciembre del 2019 materialización de niveles y localización del eje K00+40,50 - K00+20,90.

Fecha 18 de diciembre del 2019 replanteo de módulos escaleras K00+47 - K0+20,90.

Fecha 19 de diciembre del 2019 niveles para en los descansos K00+47 - K0+20,90.

Fecha 23 de diciembre del 2019 niveles para talud en ambos costados K00+47 - K0+20,90.

Fecha 22 enero del 2020 localización y replanteo de ejes para escaleras y encofrar niveles de las mismas K00+13.78 - K00+20.90.

Fecha 01 febrero del 2020 se hace recorrido para cuantificar lo construido en la semana prefabricados costado derecho K00+047.0 - K00+35.35.

Costado izquierdo K00+047.0 - K00+27.56.

4. CANTIDADES CIV 4005079 "TRAMO 10"

4.1 EXCAVACION MANUAL

Excavación escaleras longitud 27.10mts ancho 3.30mts profundidad 0.96mts
= 85.76 metros cúbicos.

Excavación para talud izquierdo longitud 27.10mts ancho 1.30mts profundidad 0.484mts = 16.42 metros cúbicos / 2 = 8.53 metros cúbicos.

Excavación para talud derecho longitud 27.10mts ancho 0.70mts profundidad 0.39mts = 7.13 metros cúbicos / 2 = 3.70 metros cúbicos.

Excavación para nivelación de pozos longitud 5.30mts ancho 0.30mts profundidad 0.65mts = 1.03 metros cúbicos.

Excavación para caja de inspección longitud 0.60mts ancho 0.70mts profundidad 0.50mts = 0.21 metros cúbicos.

167

Excavación para instalación de tubería Novafort domiciliaria longitud 5.10mts ancho 0.40mts profundidad 0.90mts = 1.84 metros cúbicos.

Excavación para acometida de gas natural longitud 3.30mts ancho 0.20mts profundidad 0.20mts = 0.13 metros cúbicos.

Para un total = 102.23 metros cúbicos

4.2 CONCRETO 3000 PSI

Concreto para escaleras área de una escalera es de 0.027 ancho 2.60mts 16 unidades de escaleras = 1.13 metros cúbicos

Concreto para escaleras área de una escalera es de 0.027 ancho 2.60mts 14 unidades de escaleras = 0.99 metros cúbicos.

Concreto para escaleras área de una escalera es de 0.027 ancho 2.60mts 16 unidades de escaleras = 1.13 metros cúbicos.

Concreto para escaleras área de una escalera 0.027 ancho 2.60mts 16 unidades de escaleras = 1.13 metros cúbicos.

Placa de Contrapiso ancho 2.60 mts longitud 27.10 mts espesor 0.10 mts = 7.05 metros cúbicos.

Para un total de = 11.41 metros cúbicos.

4.3 SUBBASE GRANULAR PEATONAL

Sub base para escaleras y descansos longitud 27.10mts ancho 3.00mts profundidad 0.30mts = 24.39 metros cúbicos.

4.4 DEMOLICION DE POZO AGUAS RESIDUALES

Se hace demolición pozo en la abscisa K0+18.90 longitud 5.30mts ancho 0.25mts profundidad 1.00mts = 1.325 metros cúbicos.

4.5 INSTALACION DE TUBERIA

Instalación de tubería de 6 pulgadas longitud 1.50ml

Instalación de tubería de 6 pulgadas longitud 5.0ml

4.6 DEMOLICION ESCALERAS

Demolición de escaleras tramo inicial longitud 3.15mts ancho 2.50mts = 7.88 metros cuadrados

De la abscisa K0+043.85 a la abscisa K0+020 se demolieron 11.93 metros cúbicos.

4.7 INSTALACION DE SARDINEL TIPO A-10 COSTADO DERECHO

Instalación de Sardinel A-10 longitud 27.10mts

4.8 INSTALACION DE SARDINEL TIPO A-10 COSTADO IZQUIERDO

Instalación de Sardinel A-10 longitud 27.10mts

4.9 INSTALACION DE CAÑUELA A-120 COSTADO IZQUIERDO

Instalación de Cañuela prefabricada longitud 56mts

LUIS ARIEL BUITRAGO GOMEZ
Representante Legal
Buitrago Topógrafos SAS
NIT. 900.887.576-1

108

Sub base Moralba

	HP	E	DER
Kot 47.0	47.19	47.05	4.708
Kot 46.50	2.516	2.496	2.552
Kot 46.00	2.383	2.329	2.395
○ 859 047	V+2.935	Λ	861.982
Kot 36.30	1.454	0.18	0.197
Kot 34.30	1.327	1.727	1.315
○ 859 047	U+ 4.472	Λ	863.519
Kot 29.50	1.485	1.521	1.508
Kot 27.50	1.641	1.62	1.639
Kot 26.90	2.248	22	1.224
Kot 19.90	2.078	12	1.124

morbil

[Handwritten signature]

CARTERA TERRENO NATURAL MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00			
K0+42,50	3.245	3.276	3.35
K0+40,50	2.39	2.45	2.68
K0+36,30	0.314	0.219	0.524
K0+34,30	-0.54	-0.178	-0.10

Θ	V+	IA
862.878	0.468	863.346

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+29,50	2.932	3.932	3.505
K0+27,50	2.228	2.653	2.85
K0+20,90	0.635	0.738	0.843
K0+19,90	0.693	0.606	0.467

Θ	V+	IA
866.314	2.54	868.854

COTAS TERRENO NATURAL MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	857.125	857.000	857.172
K0+42,50	860.101	860.070	859.996
K0+40,50	860.956	860.896	860.666
K0+36,30	863.032	863.127	862.822
K0+34,30	863.886	863.524	863.446
K0+29,50	865.922	864.922	865.349
K0+27,50	866.626	866.201	866.004
K0+20,90	868.219	868.116	868.011
K0+19,90	869.547	869.460	869.321

CARTERA EXCAVACION MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00			
K0+42,50	3.92	4.05	3.905
K0+40,50	3.889	3.89	3.868
K0+36,30	1.34	1.328	1.305
K0+34,30	1.29	1.295	1.277

Θ	V+	IA
862.878	0.323	863.201

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+29,50	3.875	3.87	3.876
K0+27,50	3.834	3.812	3.773
K0+20,90	0.798	0.85	0.901
K0+19,90	0.777	0.726	0.653

Θ	V+	IA
866.314	2.281	868.595

COTAS EXCAVACION MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	856.785	856.840	856.850
K0+42,50	859.281	859.151	859.296
K0+40,50	859.312	859.311	859.333
K0+36,30	861.861	861.873	861.896
K0+34,30	861.911	861.906	861.924
K0+29,50	864.720	864.725	864.719
K0+27,50	864.761	864.783	864.822
K0+20,90	867.797	867.745	867.694
K0+19,90	869.372	869.321	869.248

77

CARTERA SUB-BASE MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	4.729	4.705	4.708
K0+42,50	2.516	2.496	2.552
K0+40,50	2.383	2.339	2.395
K0+36,30	0.151	0.18	0.197
K0+34,30	1.327	1.27	1.315
K0+29,50	1.485	1.521	1.508
K0+27,50	1.641	1.671	1.639
K0+20,90	1.248	1.22	1.224
K0+19,90	1.078	1.12	1.124

Θ	V+	IA
859.047	2.935	861.982

Θ	V+	IA
859.047	4.472	863.519

Θ	V+	IA
867.277	1.973	869.250

COTAS SUB-BASE MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	857.253	857.277	857.274
K0+42,50	859.466	859.486	859.430
K0+40,50	859.599	859.643	859.587
K0+36,30	862.133	862.162	862.179
K0+34,30	862.192	862.249	862.204
K0+29,50	865.004	865.040	865.027
K0+27,50	865.160	865.190	865.158
K0+20,90	868.002	868.030	868.026
K0+19,90	868.172	868.130	868.126

48

COTAS TERRENO NATURAL MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	857.125	857.000	857.172
K0+42,50	860.101	860.070	859.996
K0+40,50	860.956	860.896	860.666
K0+36,30	863.032	863.127	862.822
K0+34,30	863.886	863.524	863.446
K0+29,50	865.922	864.922	865.349
K0+27,50	866.626	866.201	866.004
K0+20,90	868.219	868.116	868.011
K0+19,90	869.547	869.460	869.321

ANCHO DE ESCALERAS

0.20 BORDILLO
 0.20 BORDILLO
 0.40 CUNETA
 2.50 ESCALERAS
 3.30 TOTAL

COTAS EXCAVACION MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	856.785	856.840	856.850
K0+42,50	859.281	859.151	859.296
K0+40,50	859.312	859.311	859.333
K0+36,30	861.861	861.873	861.896
K0+34,30	861.911	861.906	861.924
K0+29,50	864.720	864.725	864.719
K0+27,50	864.761	864.783	865.822
K0+20,90	867.797	867.745	867.694
K0+19,90	869.372	869.321	869.248

174

VOLUMEN EXCAVACION MORALBA

LONG	ABSCISA	IZQ	£	DER	promedio	altura	volumen long*ancho*altura
	K0+47,00	0.34	0.160	0.322	0.274		
4.50						0.543	8.071
	K0+42,50	0.820	0.919	0.700	0.813		
2.00						1.167	7.701
	K0+40,50	1.644	1.585	1.333	1.521		
4.20						1.319	18.279
	K0+36,30	1.171	1.254	0.926	1.117		
2.00						1.411	9.313
	K0+34,30	1.975	1.618	1.522	1.705		
4.80						1.191	18.860
	K0+29,50	1.202	0.197	0.630	0.676		
2.00						0.916	6.043
	K0+27,50	1.865	1.418	0.182	1.155		
6.60						0.763	16.607
	K0+20,90	0.422	0.371	0.317	0.370		
1.00						0.250	0.823
	K0+19,90	0.175	0.139	0.073	0.129		
LONG		TALUD 1	AREA	0.6292		TOTAL	85.698
27.10		TALUD 2	AREA	0.273			
					VOL TALUD 1	17.051	
					VOL TALUD 2	7.398	
					TOTAL	110.147	M3

46

COTAS EXCAVACION MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	856.785	856.840	856.850
K0+42,50	859.281	859.151	859.296
K0+40,50	859.312	859.311	859.333
K0+36,30	861.861	861.873	861.896
K0+34,30	861.911	861.906	861.924
K0+29,50	864.720	864.725	864.719
K0+27,50	864.761	864.783	864.822
K0+20,90	867.797	867.745	867.694
K0+19,90	869.372	869.321	869.248

COTAS SUB-BASE MORALBA

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+47,00	857.253	857.277	857.274
K0+42,50	859.466	859.486	859.430
K0+40,50	859.599	859.643	859.587
K0+36,30	862.133	862.162	862.179
K0+34,30	862.192	862.249	862.204
K0+29,50	865.004	865.040	865.027
K0+27,50	865.060	865.090	865.058
K0+20,90	868.102	868.130	868.026
K0+19,90	869.662	869.641	869.648

ANCHO ESCALERAS
3.30

176

VOLUMEN SUB-BASE

LONG	ABSCISA	IZQ	E	DER	promedio	altura	volumen long*ancho*altura
	K0+47,00	0.468	0.437	0.424	0.443		
4.50	K0+42,50	0.185	0.335	0.134	0.218	0.330	4.908
2.00	K0+40,50	0.287	0.332	0.254	0.291	0.254	1.680
4.20	K0+36,30	0.272	0.289	0.283	0.281	0.286	3.966
2.00	K0+34,30	0.281	0.343	0.280	0.301	0.291	1.923
4.80	K0+29,50	0.284	0.315	0.308	0.302	0.302	4.781
2.00	K0+27,50	0.299	0.307	0.236	0.281	0.292	1.924
6.60	K0+20,90	0.305	0.385	0.332	0.341	0.311	6.766
1.00	K0+19,90	0.290	0.320	0.330	0.313	0.327	1.079
					2.458	2.458	
					0.273	TOTAL	
							27.027 M3

177

CONSTRUCCION CAJA SIFON INSPECCION	LONG	ANCHO	PROF
	0.90	0.90	1.10
EXCAVACION PARA INSTALACION TUBERIA NOVAFORT Ø 6"	LONG	ANCHO	PROF
	5.0	0.30	0.90
DEMOLICION POZOS PARA INSTALACION CARGE EN SITIO	PROF		
	1.0		
BAJARON MANGUERA GAS NATURAL	LONG	PROF	
	3.30	0.20	
DEMOLICION DE ESCALERAS	LONG	ANCHO	
	3.15	2.5	7.88
1	1.21	0.32	0.39
2	1.11	0.31	0.34
3	1.07	0.33	0.35
4	0.93	0.35	0.33
5	0.95	0.37	0.35
6	0.91	0.36	0.33
7	0.82	0.38	0.31
8	0.86	0.35	0.30
9	0.77	0.42	0.32
10	0.74	0.4	0.30
11	0.63	0.6	0.38
12	0.64	0.5	0.32
13	0.7	0.39	0.27
14	0.73	0.47	0.34
15	0.62	0.5	0.31
16	0.8	0.37	0.30
17	0.71	0.42	0.30
18	0.73	0.35	0.26
19	0.65	0.55	0.36
20	0.8	0.35	0.28
21	0.61	0.57	0.35
22	0.6	0.57	0.34
23	0.7	0.56	0.39
24	0.6	0.53	0.32
25	0.64	0.52	0.33
26	0.53	0.51	0.27
27	0.57	0.58	0.33
28	0.6	0.56	0.34
29	0.58	0.52	0.30
30	0.6	0.54	0.32
31	0.8	1	0.80
32	0.8	0.5	0.40
33	0.7	0.45	0.32
34	0.6	0.3	0.18
35	0.74	0.43	0.32
36	0.7	0.28	0.20
			19.81

2943

Alcaldía de Bogotá	INFORME TOPOGRAFICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

CIV 4007971

129

3. ACTIVIDADES DIARIAS TOPOGRAFICAS

3.1 CIV 4007971 "TRAMO 11"

Fecha 26 de diciembre del 2019 nivelación del terreno natural.
 Fecha 10 de enero del 2020 se abscisa de la K00+000 – K00+050
 Fecha 13 de enero del 2020 materialización de niveles para excavación de la K00+000 – K00+050.
 Fecha 17 de enero del 2020 localización de límite de vía y marcación con arena en ambos costados de la K00+000 – K00+050.
 Fecha 20 enero del 2020 nivelación terreno excavación K00+035–K00+050, nivelación de rajón.
 Fecha 23 enero del 2020 nivelación del terreno de excavación y remarcación de abscisado K00+035 – K00+000.
 Fecha 25 enero del 2020 chequeo de niveles para excavación replanteo de vía para verificar espacio público.
 Fecha 31 enero del 2020 se hace levantamiento en guacamayas con detalles.
 Fecha 01 febrero del 2020 se hace recorrido en el tramo para sacar cantidades..

4. CANTIDADES CIV 4007971 "TRAMO 11"

4.1 EXCAVACION MECANICA

Excavación de vía longitud 58.0mts ancho 3.58mts profundidad 0.794mts = 164.87 metros cúbicos.

Para un total = 164.87 metros cúbicos.

4.2 ESTABILIZACION RAJON

Estabilizado rajón longitud 58.0mts ancho 3.58mts profundidad 0.30mts = 62.29 metros cúbicos.

Para un total de = 62.29 metros cúbicos.

ACTIVIDADES DE LA CLINICA

3.1. CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Fecha 16 de diciembre del 2018
 Fecha 10 de enero del 2019
 Fecha 13 de enero del 2019
 Fecha 17 de enero del 2019
 Fecha 21 de enero del 2019
 Fecha 25 de enero del 2019
 Fecha 29 de enero del 2019
 Fecha 31 de enero del 2019
 Fecha 3 de febrero del 2019
 Fecha 5 de febrero del 2019
 Fecha 7 de febrero del 2019
 Fecha 9 de febrero del 2019
 Fecha 11 de febrero del 2019
 Fecha 13 de febrero del 2019
 Fecha 15 de febrero del 2019
 Fecha 17 de febrero del 2019
 Fecha 19 de febrero del 2019
 Fecha 21 de febrero del 2019
 Fecha 23 de febrero del 2019
 Fecha 25 de febrero del 2019
 Fecha 27 de febrero del 2019
 Fecha 29 de febrero del 2019
 Fecha 31 de febrero del 2019

3.2. CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Fecha 16 de diciembre del 2018
 Fecha 10 de enero del 2019
 Fecha 13 de enero del 2019
 Fecha 17 de enero del 2019
 Fecha 21 de enero del 2019
 Fecha 25 de enero del 2019
 Fecha 29 de enero del 2019
 Fecha 31 de enero del 2019
 Fecha 3 de febrero del 2019
 Fecha 5 de febrero del 2019
 Fecha 7 de febrero del 2019
 Fecha 9 de febrero del 2019
 Fecha 11 de febrero del 2019
 Fecha 13 de febrero del 2019
 Fecha 15 de febrero del 2019
 Fecha 17 de febrero del 2019
 Fecha 19 de febrero del 2019
 Fecha 21 de febrero del 2019
 Fecha 23 de febrero del 2019
 Fecha 25 de febrero del 2019
 Fecha 27 de febrero del 2019
 Fecha 29 de febrero del 2019
 Fecha 31 de febrero del 2019

3.3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Fecha 16 de diciembre del 2018
 Fecha 10 de enero del 2019
 Fecha 13 de enero del 2019
 Fecha 17 de enero del 2019
 Fecha 21 de enero del 2019
 Fecha 25 de enero del 2019
 Fecha 29 de enero del 2019
 Fecha 31 de enero del 2019
 Fecha 3 de febrero del 2019
 Fecha 5 de febrero del 2019
 Fecha 7 de febrero del 2019
 Fecha 9 de febrero del 2019
 Fecha 11 de febrero del 2019
 Fecha 13 de febrero del 2019
 Fecha 15 de febrero del 2019
 Fecha 17 de febrero del 2019
 Fecha 19 de febrero del 2019
 Fecha 21 de febrero del 2019
 Fecha 23 de febrero del 2019
 Fecha 25 de febrero del 2019
 Fecha 27 de febrero del 2019
 Fecha 29 de febrero del 2019
 Fecha 31 de febrero del 2019

3.4. CUMPLIMIENTO DE LA LEY

4.3 SUBBASE GRANULAR TIPO C

Sub base para vía longitud 58.0mts ancho 3.58mts profundidad 0.241mts = 50.04 metros cúbicos.

Para un total de = 50.04 metros cúbicos.

4.4 INSTALACION DE GEOTEXTIL

Instalación de geotextil para la vía longitud 58.0mts ancho 3.58mts = 207.64 metros cuadrados.

4.5 EXCAVACION MANUAL

Excavación manual protección del tubo agua potable longitud 25mts ancho 1.70mts profundidad 0.60mts = 25.50 metros cúbicos.

Excavación para bajar domiciliaria longitud 1.20mts ancho 0.20mts profundidad 0.20 = 0.048 metros cúbicos.

Para un total de = 25.548 metros cúbicos.

4.6 CONCRETO 3000 PSI DADOS

Dado en concreto para potable longitud 0.50mts ancho 0.50mts profundidad 0.50mts = 0.125 metros cúbicos.

Dado en concreto para domiciliaria longitud 0.25mts ancho 0.25mts profundidad 0.25mts = 0.016

Para un total de = 0.141 metros cúbicos.



LUIS ARIEL BUITRAGO GOMEZ
Representante Legal
Buitrago Topógrafos SAS
NIT. 900.887.576-1

1944-1945

1946-1947

1948-1949

1950-1951

1952-1953

1954-1955

1956-1957

1958-1959

1960-1961

1962-1963

1964-1965

1966-1967

1968-1969

Quindío Km 11 10/Dic/2019

924.00 Vt 2.639
 926.639 CIV 400.7971

Nivelación natural	Cotas V.A.S	terreno	D.C.R
Kot 00	2,76	2,605	2,454
Kot 01	2,088	2,206	1,906
Kot 010	1,546	1,607	1,499
Kot 015	1,467	1,435	1,208
Kot 020	1,375	1,35	1,224
Kot 025	1,247	1,233	1,105
Kot 030	1,098	1,095	0,925
Kot 035	0,88	0,835	0,755

12 E DG

Koto 040 0.485 0.485 0.354
42100 vt 0.398

Koto 45 1.039 1.014 0.922

Koto 50 0.63 0.50 0.30

Empalme 0.510 0.464 0.468
0.415

Boca Puertas

Direction

46B-64^s 0.389

46B-70^s 1.487

46B-76^s 1.452

46B-84 1.48

46B-90^s 1.24

46B-94^s 1.274

Excavation. frame-11.	
12	2.684
3.004	2.884
2.493	2.482
2.329	2.371
2.133	2.205
1.902	1.892
1.784	1.795
1.694	1.693
1.691	1.691
0.927.00	vt - .546
3.557	3.537
3.404	3.485
2.794	2.757
2.203	2.108
1.968	1.874
1.378	1.378
0.927.00	vt 1.556
927.00	928.556

Excavation. frame-11.	
12	2.524
2.704	2.596
2.735	2.249
2.304	2.022
1.953	1.974
1.745	1.754
1.593	1.587
1.495	1.489
1.387	1.367
1.235	1.231
1.206	1.206
1.135	1.135
0.927.00	vt - 0.546
3.196	3.215
3.237	3.257
2.593	2.574
2.047	1.703
1.298	1.847
1.087	1.087
0.927.00	vt 1.556
927.00	928.556

CARTERA TERRENO NATURAL TRAMO 11

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	2.76	2.605	2.454
K0+05	2.088	2.206	1.906
K0+010	1.546	1.607	1.499
K0+015	1.467	1.475	1.208
K0+020	1.375	1.35	1.224
K0+025	1.247	1.233	1.105
K0+030	1.098	1.095	0.925
K0+035	0.88	0.875	0.755
K0+040	0.485	0.485	0.354
K0+045	1.039	1.014	0.922
K0+050	0.55	0.31	0.068
K0+058	0.051	0.164	0.445

Ø	V+	HA
924.00	2.639	926.639

Ø	V+	HA
927.00	0.398	927.398

COTAS TERRENO NATURAL TRAMO 11

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	923.879	924.034	924.185
K0+05	924.551	924.433	924.733
K0+010	925.093	925.032	925.140
K0+015	925.172	925.164	925.431
K0+020	925.264	925.289	925.415
K0+025	925.392	925.406	925.534
K0+030	925.541	925.544	925.714
K0+035	925.759	925.764	925.884
K0+040	926.154	926.154	926.285
K0+045	926.359	926.384	926.476
K0+050	926.853	927.084	927.330
K0+58	927.347	927.562	927.843

CARTERA EXCAVACION TRAMO 11			
ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	3.004	2.884	2.684
K0+05	2.493	2.482	2.452
K0+010	2.329	2.371	2.402
K0+015	2.133	2.162	2.205
K0+020	1.902	1.892	1.887
K0+025	1.784	1.795	1.791
K0+030	1.694	1.693	1.671
K0+035	3.55	3.537	3.495
K0+040	3.404	3.485	3.449
K0+045	2.794	2.757	2.759
K0+050	2.203	2.108	1.922
K0+058	1.568	1.541	1.327

Ø	V+	IA
927.00	0.546	926.454

Ø	V+	IA
927.00	1.556	928.556

COTAS DE EXCAVACION TRAMO 11			
ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	923.450	923.570	923.770
K0+05	923.961	923.972	924.002
K0+010	924.125	924.083	924.052
K0+015	924.321	924.292	924.249
K0+020	924.552	924.562	924.567
K0+025	924.670	924.659	924.663
K0+030	924.760	924.761	924.783
K0+035	925.006	925.019	925.061
K0+040	925.152	925.071	925.107
K0+045	925.762	925.799	925.797
K0+050	926.353	926.448	926.634
K0+058	926.988	927.015	927.229

VOLUMEN EXCAVACION

ANCHO EXCAVACION	ANCHOS VIA DE EXCAVACION	LONG	ABSCISA	IZQ	E	DER	promedio	altura	volumen long*ancho*altura
3.60	3.80		K0+000	0.429	0.464	0.415	0.436		
		5	K0+005	0.590	0.461	0.731	0.594	0.515	9.270
	3.50	5	K0+010	0.968	0.949	1.088	1.002	0.798	14.361
	3.50	5	K0+015	0.851	0.872	1.182	0.968	0.985	17.730
	3.50	5	K0+020	0.712	0.727	0.848	0.762	0.865	15.576
	3.50	5	K0+025	0.722	0.747	0.871	0.780	0.771	13.881
	3.50	5	K0+030	0.781	0.783	0.931	0.832	0.806	14.505
	3.50	5	K0+035	0.753	0.745	0.823	0.774	0.803	14.448
	3.50	5	K0+040	1.002	1.083	1.178	1.088	0.931	16.752
	3.50	5	K0+45	0.597	0.585	0.679	0.620	0.854	15.372
	4.10	5	K0+50	0.50	0.636	0.696	0.611	0.615	11.079
		8	K0+58	0.359	0.547	0.614	0.507	0.559	16.090
TOTAL									159.064 M3

107

CARTERA DE RAJON 11

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	2.704	2.596	2.524
K0+05	2.304	2.275	2.249
K0+010	2.022	1.953	1.974
K0+015	1.712	1.745	1.754
K0+020	1.602	1.59	1.587
K0+025	1.444	1.495	1.489
K0+030	1.392	1.387	1.367
K0+035	1.206	1.135	1.171
K0+040	3.237	3.196	3.215
K0+045	2.573	2.524	2.386
K0+050	2.047	1.703	1.637
K0+058	1.258	1.241	1.007

Ø	V+	IA
927.00	0.546	926.454

Ø	V+	IA
927.00	1.556	928.556

COTAS TERRENO RAJON 11

ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	923.750	923.858	923.930
K0+05	924.150	924.179	924.205
K0+010	924.432	924.501	924.480
K0+015	924.742	924.709	924.700
K0+020	924.852	924.864	924.867
K0+025	925.010	924.959	924.965
K0+030	925.062	925.067	925.087
K0+035	925.248	925.319	925.283
K0+040	925.319	925.360	925.341
K0+045	925.983	926.032	926.170
K0+050	926.509	926.853	926.919
K0+058	927.298	927.315	927.549

VOLUMEN RAJON

ANCHO EXCAVACION 3.60	LONG	ABSCISA	IZQ	E	DER	<i>promedio</i>	<i>altura</i>	<i>volumen</i> long*ancho*altura
		K0+000	0.300	0.288	0.160	0.249		
	5	K0+05	0.325	0.207	0.203	0.245	0.247	4.449
	5	K0+010	0.307	0.418	0.428	0.384	0.315	5.664
	5	K0+015	0.421	0.417	0.451	0.430	0.407	7.326
	5	K0+020	0.300	0.302	0.300	0.301	0.365	6.573
	5	K0+025	0.340	0.300	0.302	0.314	0.307	5.532
	5	K0+030	0.302	0.306	0.304	0.304	0.309	5.562
	5	K0+035	0.242	0.300	0.222	0.255	0.279	5.028
	5	K0+040	0.167	0.289	0.234	0.230	0.242	4.362
	5	K0+45	0.221	0.233	0.373	0.276	0.253	4.551
	5	K0+50	0.156	0.405	0.285	0.282	0.279	5.019
	8	K0+58	0.310	0.300	0.320	0.310	0.296	8.525

TOTAL	62.591	M3
-------	--------	----

CARTERA DE SUB BASE 11			
ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	3.466	3.349	3.146
K0+05	3.067	3.040	3.069
K0+010	2.606	2.576	2.608
K0+015	2.357	2.326	2.361
K0+020	2.258	2.230	2.260
K0+025	2.171	2.136	2.175
K0+030	2.065	2.041	2.064
K0+035	1.922	1.886	1.915
K0+040	1.767	1.735	1.772
K0+045	1.208	1.136	1.070
K0+050	0.653	0.424	0.180
K0+058	0.084	0.096	0.345

Ø	V+	IA
927.00	0.364	927.364

COTAS DE SUB BASE 11			
ABSCISA	IZQ	£	DER
K0+000	923.898	924.015	924.218
K0+05	924.297	924.324	924.295
K0+010	924.758	924.788	924.756
K0+015	925.007	925.038	925.003
K0+020	925.106	925.134	925.104
K0+025	925.193	925.228	925.189
K0+030	925.299	925.323	925.300
K0+035	925.442	925.478	925.449
K0+040	925.597	925.629	925.592
K0+045	926.156	926.228	926.294
K0+050	926.711	926.94	927.184
K0+058	927.448	927.46	927.709

VOLUMEN SUB BASE

ANCHO EXCAVACION 3.60	LONG	ABSCISA	IZQ	E	DER	promedio	altura	volumen long*ancho*altura
		K0+000	0.148	0.157	0.288	0.198		
	5						0.162	2.919
		K0+05	0.145	0.145	0.09	0.127		
	5						0.212	3.807
		K0+010	0.326	0.287	0.276	0.296		
	5						0.298	5.358
		K0+015	0.265	0.329	0.303	0.299		
	5						0.276	4.974
		K0+020	0.254	0.27	0.237	0.254		
	5						0.240	4.311
		K0+025	0.183	0.269	0.224	0.225		
	5						0.230	4.146
		K0+030	0.237	0.256	0.213	0.235		
	5						0.254	4.575
		K0+035	0.294	0.259	0.266	0.273		
	5						0.270	4.851
		K0+040	0.278	0.269	0.251	0.266		
	5						0.255	4.593
		K0+45	0.253	0.276	0.204	0.244		
	5						0.215	3.861
		K0+50	0.202	0.087	0.265	0.185		
	8						0.168	4.843
		K0+58	0.15	0.145	0.16	0.152		

TOTAL

48.238

M3

20/56

	INFORME TOPOGRAFICO	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

CIV 4007972

3. ACTIVIDADES DIARIAS TOPOGRAFICAS

3.1 CIV 4007972 "TRAMO 12"

Fecha 26 de diciembre del 2019 nivelación del terreno natural.

Fecha 10 de enero del 2020 se abscisa de la K00+000 – K00+050

Fecha 13 de enero del 2020 materialización de niveles para excavación de la K00+000 – K00+050.

Fecha 17 de enero del 2020 localización de límite de vía y marcación con arena en ambos costados de la K00+000 – K00+050.

4. CANTIDADES CIV 4007972 "TRAMO 12"

4.1 EXCAVACION MECANICA

Excavación de vía longitud 70.0mts ancho 4.20mts profundidad 1.02mts = 299.88 metros cúbicos.

Para un total = 299.88 metros cúbicos.

4.2 ESTABILIZADO RAJON

Estabilizado rajón longitud 70.0mts ancho 4.20mts profundidad 0.30mts = 88.20 metros cúbicos.

Para un total de = 88.20 metros cúbicos.

3 ACTIVIDADES DIARIAS TOPICAR 42

24 JUL - 1973 - PLANNO 12

Fact - 28 de julio de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 10 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 18 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 24 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 31 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.

4 ACTIVIDADES DIARIAS TOPICAR 42

24 JUL - 1973 - PLANNO 12

Fact - 28 de julio de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 10 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 18 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 24 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 31 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.

Fact - 28 de julio de 1973 en el nivel de la 12a planta.

24 JUL - 1973 - PLANNO 12

Fact - 28 de julio de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 10 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 18 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 24 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.
 Fact - 31 de agosto de 1973 en el nivel de la 12a planta.

Fact - 28 de julio de 1973 en el nivel de la 12a planta.

2998

terreno NATURAL - terreno 12

	12	2	002	K	①
Kot 7218	.171	.126	.011	>	936.0
Kot 70	.218	.162	.032		936.0
Kot 65	.80	.824	.733		936.0
Kot 60	1.485	1.506	1.619		936.0
Kot 55	1.99	2.02	2.144		
Kot 50	2.025	2.45	2.963		
Kot 45	1.22	4.134	4.047		
Kot 40	.737	.705	.694	>	936.0
Kot 35	1.884	1.843	1.882		936.0
Kot 30	2.889	2.867	2.917		936.0
Kot 25	3.819	3.894	3.763		936.0
Kot 20	1.39	1.229	1.317		
Kot 15	2.003	1.986	1.933		
Kot 10	2.65	2.646	2.66		
Kot 5	3.253	3.213	3.217		
Kot 00	3.920	3.768	3.820		

① 927.00 vt .743 π 927.743

terreno

"

927

7089

12 DEN
 1 1.049
 9 1.38
 73 1.342
 505 2.504
 699 3.685
 935 3.924
 936.364
 2 656
 2 1.586
 4 2.392
 30 3.48
 25 4.75
 931.239
 2.54
 2.891
 42 3.577
 15 4.138
 33 4.372
 927.87

2A. JON Trano 12 DEN
 K01218 585 601 64
 K0170 805 92 748
 K0169 1.342 1.424 1.349
 K0160 2.043 2.096 2.12
 K0155 2.704 2.675 2.725
 K0150 3.714 3.575 3.824
 936.00 vt 28.4 9.36 28.4
 K0145 575 49 14
 K0140 1.505 1.474 1.354
 K0135 2.543 2.528 2.452
 K0130 3.529 3.521 3.61
 K0125 4.817 4.857 4.798
 927.00 vt 4.593 931.593
 K0120 2.101 1.919 2.07
 K0115 2.749 2.73 2.687
 K0110 3.358 3.369 3.391
 K015 3.968 3.97 3.96
 K0100 4.385 4.788 4.788
 927.00 vt 9.87 927.987

10

174

2090

CARTERA TERRENO NATURAL TRAMO 12

ABSCISA	IZQ	£	DER
75			
K0+07218	0.171	0.125	0.011
K0+070	0.218	0.162	0.032
K0+065	0.80	0.824	0.733
K0+060	1.485	1.506	1.619
K0+055	1.99	2.02	2.144
K0+050	2.025	2.45	2.963
K0+045	4.22	4.134	4.047
K0+040	0.737	0.705	0.694
K0+035	1.884	1.843	1.882
K0+030	2.889	2.867	2.917
K0+025	3.819	3.894	3.763
K0+020	1.39	1.225	1.317
K0+015	2.003	1.986	1.933
K0+010	2.65	2.646	2.66
K0+005	3.253	3.213	3.217
K0+000	3.92	3.768	3.782

Ø	V+	IA
936.000	0.364	936.364

Ø	V+	IA
927.000	4.239	931.239

Ø	V+	IA
927.000	0.743	927.743

COTAS TERRENO NATURAL TRAMO 12

ABSCISA IZQ £ DER

75			
K0+07218	936.193	936.239	936.353
K0+070	936.146	936.202	936.332
K0+065	935.564	935.540	935.631
K0+060	934.879	934.858	934.745
K0+055	934.374	934.344	934.220
K0+050	934.339	933.914	933.401
K0+045	932.144	932.230	932.317
K0+040	930.502	930.534	930.545
K0+035	929.355	929.396	929.357
K0+030	928.350	928.372	928.322
K0+025	927.420	927.345	927.476
K0+020	926.353	926.518	926.426
K0+015	925.740	925.757	925.810
K0+010	925.093	925.097	925.083
K0+005	924.490	924.530	924.526
K0+000	923.823	923.975	923.961

4/5

2461

CARTERA EXCAVACION TRAMO 12

ABSCISA 75	IZQ	£	DER
K0+07218	1.054	0.981	1.049
K0+070	1.454	1.459	1.38
K0+065	1.724	1.893	1.742
K0+060	2.503	2.505	2.504
K0+055	3.594	3.699	3.685
K0+050	3.898	3.935	3.924
K0+045	0.571	0.557	0.656
K0+040	1.458	1.462	1.586
K0+035	2.483	2.374	2.392
K0+030	3.435	3.435	3.48
K0+025	4.783	4.725	4.75
K0+020	2.507	2.502	2.54
K0+015	2.822	3.826	2.891
K0+010	3.557	3.542	3.577
K0+005	4.178	4.145	4.138
K0+000	4.558	4.383	4.371

Ø	V+	IA
936.000	0.364	936.364

Ø	V+	IA
927.000	4.239	931.239

Ø	V+	IA
927.000	0.870	927.870

COTAS EXCAVACION TRAMO 12

ABSCISA 75	IZQ	£	DER
K0+07218	935.310	935.383	935.315
K0+070	934.910	934.905	934.984
K0+065	934.640	934.471	934.622
K0+060	933.861	933.859	933.860
K0+055	932.770	932.665	932.679
K0+050	932.466	932.429	932.440
K0+045	930.668	930.682	930.583
K0+040	929.781	929.777	929.653
K0+035	928.756	928.865	928.847
K0+030	927.804	927.804	927.759
K0+025	926.456	926.514	926.489
K0+020	925.363	925.368	925.330
K0+015	925.048	924.044	924.979
K0+010	924.313	924.328	924.293
K0+005	923.692	923.725	923.732
K0+000	923.312	923.487	923.499

966

COTAS: RENO NATURAL (RAN002)

ABSCISA	IZO	E	DER
FD-07718	936.193	936.273	936.353
FD-070	936.144	936.202	936.312
FD-065	935.564	935.540	935.631
FD-060	934.879	934.858	934.745
FD-055	934.324	934.344	934.220
FD-050	934.339	933.914	933.601
FD-045	933.144	932.230	932.317
FD-040	930.507	930.534	930.545
FD-035	929.355	929.396	929.357
FD-030	928.350	928.377	928.337
FD-025	927.420	927.345	927.476
FD-020	926.313	926.518	926.436
FD-015	925.745	925.757	925.810
FD-010	925.093	925.097	925.083
FD-005	924.490	924.530	924.526
FD-000	923.823	923.975	923.861

COTAS: EXCAVACION (RAN011)

ABSCISA	IZO	E	DER
FD-07718	935.310	935.381	935.315
FD-070	934.910	934.905	934.986
FD-065	934.640	934.471	934.622
FD-060	933.861	933.895	933.800
FD-055	932.770	932.695	932.679
FD-050	932.466	932.479	932.440
FD-045	930.668	930.682	930.583
FD-040	929.781	929.777	929.653
FD-035	928.756	928.865	928.847
FD-030	927.804	927.804	927.759
FD-025	926.456	926.514	926.489
FD-020	925.363	925.368	925.31
FD-015	925.048	924.044	924.979
FD-010	924.313	924.329	924.293
FD-005	923.692	923.775	923.732
FD-000	923.312	923.487	923.499

VOLUMEN EXCAVACION

ANCHO EXCAVACION	LONG	ABSCISA	IZO	E	DER	promedio	altura	volumen
4.16		FD-07718	0.683	0.856	1.038	0.826	1.110	long* ancho* altura 10.083
	2.14	FD-070	1.236	1.297	1.348	1.294	1.347	21.881
		FD-065	0.934	1.003	1.009	1.001	0.984	70.467
		FD-060	1.018	0.999	0.885	0.967	1.224	76.783
		FD-055	1.604	1.679	1.541	1.608	1.534	31.695
		FD-050	1.873	1.483	0.901	1.440	1.513	31.467
		FD-045	1.476	1.543	1.734	1.586	1.184	24.710
		FD-040	0.721	0.757	0.882	0.780	0.668	13.901
		FD-035	0.599	0.531	0.510	0.547	0.553	11.499
		FD-030	0.546	0.568	0.563	0.559	0.743	15.458
		FD-025	0.864	0.831	0.987	0.927	1.009	30.862
		FD-020	0.990	1.150	1.096	1.079	1.079	22.436
		FD-015	0.697	1.711	0.831	1.079	0.929	19.327
		FD-010	0.780	0.769	0.790	0.780	0.789	16.416
		FD-005	0.799	0.805	0.794	0.799	0.643	13.374
		FD-000	0.511	0.483	0.462	0.487		

TOTAL 307.334 M3

107

COTAS RAJON TRAMO 12

ABSCISA	IZQ	£	DER
75			
K0+07218	935.698	935.683	935.644
K0+070	935.479	935.364	935.536
K0+065	934.942	934.860	934.935
K0+060	934.241	934.188	934.164
K0+055	933.580	933.609	933.559
K0+050	932.570	932.709	932.710
K0+045	931.018	931.103	931.453
K0+040	930.088	930.119	930.239
K0+035	929.080	929.065	929.141
K0+030	928.064	928.072	927.983
K0+025	926.776	926.736	926.795
K0+020	925.886	926.068	925.917
K0+015	925.238	925.257	925.300
K0+010	924.629	924.618	924.596
K0+005	924.019	924.017	924.027
K0+000	923.602	923.807	923.799

Ø	V+	IA
936.000	0.284	936.284

Ø	V+	IA
927.000	4.593	931.593

Ø	V+	IA
927.000	0.987	927.987

CARTERA RAJON TRAMO 12

ABSCISA	IZQ	£	DER
75			
K0+07218	0.586	0.601	0.64
K0+070	0.805	0.92	0.748
K0+065	1.342	1.424	1.349
K0+060	2.043	2.096	2.12
K0+055	2.704	2.675	2.725
K0+050	3.714	3.575	3.574
K0+045	0.575	0.49	0.14
K0+040	1.505	1.474	1.354
K0+035	2.513	2.528	2.452
K0+030	3.529	3.521	3.61
K0+025	4.817	4.857	4.798
K0+020	2.101	1.919	2.07
K0+015	2.749	2.73	2.687
K0+010	3.358	3.369	3.391
K0+005	3.968	3.97	3.96
K0+000	4.385	4.18	4.188

COTAS EXCAVACION TRAMO 17

ABSCISA	IZQ	E	DER
FD-072.18	925.398	925.323	925.324
FD-070	925.164	925.062	925.218
FD-065	924.640	924.541	924.622
FD-060	923.941	923.879	923.864
FD-055	923.280	923.296	923.253
FD-050	922.756	922.609	922.400
FD-045	920.718	920.803	921.153
FD-040	920.791	920.797	920.939
FD-035	920.766	920.765	920.829
FD-030	922.764	922.754	922.683
FD-025	926.416	926.429	926.489
FD-020	925.563	925.764	925.806
FD-015	924.938	924.861	924.979
FD-010	924.313	924.308	924.291
FD-005	923.692	923.725	923.737
FD-000	923.312	923.487	923.491

COTAS RAJON TRAMO 17

ABSCISA	IZQ	E	DER
FD-072.18	925.698	925.683	925.644
FD-070	925.478	925.364	925.336
FD-065	924.942	924.800	924.875
FD-060	924.241	924.108	924.164
FD-055	923.580	923.609	923.559
FD-050	922.570	922.707	922.710
FD-045	921.018	921.103	921.453
FD-040	920.083	920.119	920.259
FD-035	920.080	920.065	920.143
FD-030	920.064	920.072	920.083
FD-025	926.776	926.796	926.795
FD-020	925.886	926.008	925.917
FD-015	925.238	925.257	925.300
FD-010	924.629	924.618	924.596
FD-005	924.018	924.012	924.077
FD-000	923.602	923.607	923.799

ANCHO EXCAVACION LONG
4.38

2.18

VOLUMEN RAJON

ABSCISA	IZQ	E	DER	promedio	altura	volumen long* ancho* altura
FD-072.18	0.800	0.300	0.320	0.307	0.309	2.799
FD-070	0.315	0.297	0.320	0.311	0.308	6.399
FD-065	0.302	0.299	0.315	0.305	0.304	6.370
FD-060	0.800	0.308	0.300	0.303	0.304	6.316
FD-055	0.300	0.313	0.300	0.304	0.306	6.368
FD-050	0.314	0.300	0.310	0.308	0.304	6.323
FD-045	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	6.306
FD-040	0.297	0.322	0.300	0.306	0.307	6.196
FD-035	0.314	0.300	0.312	0.309	0.307	6.399
FD-030	0.300	0.318	0.300	0.306	0.308	6.417
FD-025	0.330	0.307	0.306	0.311	0.311	6.472
FD-020	0.823	0.300	0.311	0.311	0.308	6.417
FD-015	0.300	0.294	0.321	0.306	0.308	6.399
FD-010	0.316	0.310	0.308	0.310	0.307	6.389
FD-005	0.327	0.290	0.295	0.305	0.304	6.373
FD-000	0.290	0.320	0.300	0.303		

TOTAL

82.258 m3

184

4.3 SUBBASE GRANULAR TIPO C

Sub base para vía longitud 70.0mts ancho 4.20mts profundidad 0.15mts = 44.10 metros cúbicos.

Para un total de = 44.10 metros cúbicos.

4.4 INSTALACION DE GEOTEXTIL

Instalación de geotextil para la vía longitud 70.0mts ancho 4.20mts = 294 metros cuadrados.



LUIS ARIEL BUITRAGO GOMEZ
Representante Legal
Buitrago Topógrafos SAS
NIT. 900.887.576-1

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

CONTRATO No. COP-340 de 2019

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL (SST – MAO) N° 05

PERIODO DE 30 DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

**ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRSITOBAL
FDLSC**

BOGOTÁ D.C., 31 DE ENERO DE 2020



*Diagonal 182 N°20-91 Oficina 255C Tel. 6945649 cel.3186594924 Bogotá D.C.
Punto CREA: Transversal 16C Este N°46A-05 Sur Tel. 3156346906 Barrio Altos del Virrey
Email: consorciomallavialbbc@gmail.com*

2467 2567

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.910.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	Residente Ambiental y SST Contratista	 Ing. Jhon Edwin Serrato V.
REVISÓ	Director de obra Contratista	 Ing. Oliverio Bonilla Hoyos
REVISÓ Y APROBÓ	UT ROAD DESIGN Dirección de Interventoría	 Ing. Andrés Peña Supelano

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN N°	DESCRIPCIÓN	FECHA
1	VERSIÓN ORIGINAL	31/01/2020

2

202

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCION -----	6
2. OBJETIVOS -----	7
2.1 OBJETIVO GENERAL -----	7
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS -----	7
2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO -----	8
2.3.1 DATOS DEL CONTRATO -----	8
2.3.2 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA -----	8
2.4 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL Y SG-SST N° 04 -----	10
2.4.1 ACTIVIDADES AMBIENTALES -----	10
2.4.1.1 COMPONENTE A- CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES -----	10
2.4.1.2 COMPONENTE B - MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COSNSTRUCTIVAS -----	10
2.4.1.3 COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO -	14
2.4.1.4 COMPONENTE D – GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -----	15
2.4.1.5 COMPONENTE E – PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD -----	16
3 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SST -----	17
3.1 POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO -----	17
3.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL -----	17
3.3 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO -----	18
3.3.1 Exámenes médicos de ingreso y egreso -----	18
3.3.2 Dotación y señalización de campamentos de obra -----	18
3.4 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. -----	18
3.4.1 Inducción y Capacitaciones -----	18
3.4.2 Copasst o vigía -----	19

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

3.4.3 Entrega de elementos de protección personal – EPP-----	19
3.4.4 Manejo de baños-----	19
3.4.5 Inspecciones planeadas durante el mes-----	19
3.4.6 Reporte de Accidentes de trabajo -----	19
3.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y BRIGADAS DE EMERGENCIA -----	20
3.6 ANEXOS-----	
ANEXOS-----	

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

LISTADO DE TABLAS

Pág.

Tabla 1. Datos del Contrato	8
Tabla 2. Localización de tramos a intervenir.	8
Tabla 3. Relación de Materiales	11
Tabla 4. Relación de Escombros.....	12
Tabla 5. Relación de RCD.....	13
Tabla 6. Relación de maquinaria.....	15
Tabla 7. Relación personal - prestación de servicios	17

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.319.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión</i> CMVBBC-01/2019

INTRODUCCION

La Alcaldía Local de San Cristóbal suscribió con el contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC el contrato de obra Pública N° COP-340-2019, cuyo objeto es: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

En cumplimiento de los requisitos exigidos de perfeccionamiento y legalización y demás normas Ambientales, se presentó el Programa de Manejo Ambiental de la Obra– MAO, documento integral de requerimiento previo al inicio de las labores constructivas de obra.

Este documento contiene los requisitos básicos para la gestión y control de los posibles impactos ambientales derivados de las actividades que se desarrollarán durante la ejecución del CONTRATO N° COP-340 de 2019; dichos requisitos garantizan el cumplimiento de las medidas tendientes a la protección de los recursos naturales existentes en la zona para prevenir, controlar, mitigar y/o compensar los impactos ambientales que puedan ser ocasionados durante la ejecución del proyecto.

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se cumplirá con la normatividad legal vigente aplicable a la gestión ambiental; las cuales definen las medidas de manejo ambiental mínimas a ser implementadas y/o contempladas por el contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC.

De igual forma el Consorcio Garantiza el bienestar físico, mental y social de todos los trabajadores, con la implementación y cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2410
1370

 Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión</i> CMVBBC-01/2019

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Informar la Gestión Ambiental y SST realizada en el periodo del **30 de diciembre de 2019 al 29 de enero de 2020**, con el objetivo de prevenir, mitigar y compensar los aspectos Ambientales, originados por las actividades del objeto del contrato que afectan los componentes Ambientales y los riesgos de seguridad y salud que se puedan evidenciar.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- ✓ Implementar acciones de manejo ambiental necesarias para la protección, conservación y optimización de los recursos naturales y manejo paisajístico.
- ✓ Dar cumplimiento a los requisitos establecidos por las autoridades ambientales locales para el trámite y obtención de los permisos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
- ✓ Garantizar que el desarrollo del contrato se realice bajo los estándares de desempeño Ambiental.
- ✓ Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente y SST.

7

205

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTF, 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

2.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.3.1 DATOS DEL CONTRATO

Tabla 1. Datos del Contrato

CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC
CONTRATO No.		COP-340-2019 LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL
OBJETO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRSITOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".	
PLAZO:	9 Meses	
FECHA DE INICIO:	30 de Agosto de 2019	
FECHA DE TERMINACIÓN:	29 de Mayo de 2020	
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 4.804.882.633,62	
INTERVENTORIA:	UNION TEMPORAL ROAD DESIGN	

Fuente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

2.3.2 LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

La actualización y/o ajustes de diseños y construcción de la malla vial se desarrollarán en los siguientes tramos:

Tabla 2. Localización de tramos a intervenir.

GRUPO 3						
IDENTIDAD			UBICACIÓN TRAMO VIAL			
Numero CMVBBC	Nombre UPZ 50	CIV	Barrio	Eje Vial	De	A
1	La Gloria	4007224	Altos Del Virrey	Cll 43 A Bis Sur	Kr 17 Bis Este	Kr 17 A Este
2	La Gloria	4007223	Altos Del Virrey	Kr 17 Bis Este	Cll 43 A Bis Sur	Cll 43 A Bis A Sur
3	La Gloria	4005040	Altos Del Virrey	Kr 17 A Este	Cll 42 C Bis B Sur	Cll 42 D Sur

Diagonal 182 N°20-91 Oficina 255C Tel. 6945649 cel.3186594924 Bogotá D.C.
Punto CREA: Transversal 16C Este N°46A-05 Sur Tel. 3156346906 Barrio Altos del Virrey
Email: consorciomallavialbbc@gmail.com

2471
2521

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT, 901.119.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

GRUPO 3						
IDENTIDAD			UBICACIÓN TRAMO VIAL			
Numero CMVBBC	Nombre UPZ 50	CIV	Barrio	Eje Vial	De	A
4	La Gloria	50007951	Altos Del Virrey	Kr 17 A Este	Cll 42 D Sur	Cll 42 D Bis Sur
5	La Gloria	4005073	Altos Del Virrey	Cll 42 D Bis Sur	Kr 17 A Este	Tv 16 C Este
6	La Gloria	4005480	Altos Del Virrey	Diag 46 A Sur	Tv 16 C Este	Cll 46 A Bis A Sur
7	La Gloria	4005497	Altos Del Virrey	Diag 46 A Sur	Tv 16 C Este	Cra 16 A Este
8	La Gloria	4005352	Altos Del Virrey	Cra 16 Bis Este	Cll 46 Sur	Cll 44 B Sur
9	La Gloria	4005530	Puente Colorado	Cra 15 Este	Cll 46 Sur	Calle 46 A Bis A Sur
10	La Gloria	4005079	Moralba	Tv 15 A Este	Cll 43 Sur	Cra 16 A Este
11	La Gloria	4007971	Quindio	Cra 16 D Este	Diag 46 C Sur	Cll 46 B Bis Sur
12	La Gloria	4007972	Quindio	Cll 46 C Sur	Cra 16 D Este	Cra 17 B Este
13	La Gloria	4004898	Altamira	Cll 42 B Sur	Kr 12 A Este	Kr 12 B Este
14	La Gloria	4008458	Altos Del Poblado	Cra 8 B Bis Este	Cll 40 Sur	Cll 40 A Sur
15	La Gloria	4002378	Guacamayas Iv	Kr 4 C	Cll 39 D Sur	Cll 39 C Sur
16	La Gloria	4002411	Guacamayas Iv	Kr 4 C	Kr 3 B	Cll 39 D Sur
17	La Gloria	4002441	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Kr 3 A Bis	Kr 3 B
18	La Gloria	4002490	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Kr 3 A	Kr 3 A Bis
19	La Gloria	4002572	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Kr 3 Bis	Kr 3 A
20	La Gloria	4002689	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Kr 2 R	Kr 3 Bis
21	La Gloria	4002814	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Kr 2 M Bis	Kr 2 N
22	La Gloria	4002785	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Cra 2 N	Cra 2 R
23	La Gloria	4002849	Guacamayas Iv	Cll 39 F Sur	Kr 2 M	Kr 2 M Bis

Fuente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

2

206

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.504-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

2.4 INFORME DE MANEJO AMBIENTAL Y SG-SST N° 04

2.4.1 ACTIVIDADES AMBIENTALES

2.4.1.1 COMPONENTE A- CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES

El consorcio Malla Vial BBC, mantiene su profesional Ambiental, de acuerdo a lo exigido al Anexo técnico del contrato y pliego. Por otra parte, el contratista ha cumplido a cabalidad las obligaciones ambientales exigidas por la supervisión e interventoría (asistencia a reuniones, participación a los comités de obra y demás compromisos ambientales.)

2.4.1.2 COMPONENTE B - MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

A) Programa B1. Manejo Ambiental de Campamentos Fijos y/o centros de acopio.

Se mantiene el campamento de obra en la Dirección Transversal 16C este #46ª – 05 sur, dotado de servicio de baño. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

Por otra parte, en el CIV 4005480- VIA 6 se trasladó el campamento-bodega del subcontratista inicial a una cuadra del sector, ubicado en la dirección Transversal 16C este #46-22 sur, para el almacenamiento de herramienta y materiales menores, y cuenta con servicio de baño para los trabajadores y cambio de ropa. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

Por otra parte, en cada frente de obra se mantiene la una carpa móvil de 2 m X 2, para que los operarios la utilicen como vestier o almacén de herramientas, al igual para la protección de la lluvia. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

B) Programa B2. Manejo de Materiales de Construcción

En relación al presente ítem, en el manejo de materiales, es de aclarar que de acuerdo al manejo de vales y solicitud de certificaciones en las canteras se maneja

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.110.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

mes vencido. Por lo anterior en el mes de diciembre de 2019 ingresaron un total de 350 m³ de materiales pétreos y 13 M³ de Concreto premezclado.

La relación de materiales se describe en la tabla N° 03, material que se acopia dentro de la obra y se le efectúa la debida protección

Tabla 3. Relación de Materiales

ITEM	PERIODO	MATERIAL	CANTIDAD (M ³)	PROVEEDOR	CERTIFICACION	
					SI	NO
01	SEPTIEMBRE	--	--	---	--	--
02	OCTUBRE	--	--	---	--	--
03	NOVIEMBRE	--	0	---	--	--
05	DICIEMBRE	SBG TIPO C	148	Villa Paula	X	
		B-200	103		X	
		RAJON	99		X	
		CONCRETO	13	TREMIX	X*	

* Para validar el concreto se cuenta con el comprobante de entrega, suministrado por la empresa.

Ver anexo N° 2. Relación de materiales y certificación.

C) Programa B3. Manejo Integral de Residuos Sólidos

Manejo de residuos Domésticos

Para el manejo de residuos domésticos en obra, se cuenta inicialmente con puntos ecológico en cada CIV intervenido, el cual consiste en una bolsa negra y blanca para la disposición de los inservibles generados por el personal dentro de una caneca; una vez las bolsas estén llenas, estas se disponen al servicio recolector de aseo del sector. **Ver anexo N° 1 Registró Fotográfico.**

Por otra parte, en el campamento de obra del contratista cuenta con recipientes adecuados para la disposición de los residuos, y que son dispuestos al servicio de aseo local en los días determinados.

Los horarios de recolección de basuras en la zona (localidad de San Cristóbal) y el operador de la zona se relacionan a continuación:

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

OPERADOR	DÍAS DE RECOLECCIÓN	HORARIO DE RECOLECCIÓN
Promoambiental Distrito	Martes -jueves y sábado	7:00 am – 5:00 pm

Una vez se tenga los frentes de obra activos, se dispondrá de puntos ecológicos, para la disposición de los residuos de los inservibles generados por el personal

Manejo de residuos Especiales

En relación a este ítem no aplica, ya que no se ha manejado este tipo de residuos.

Manejo de Aceites Usados

En relación a este ítem no aplica, ya que no se ha manejado este tipo de residuos.

Manejo y disposición de escombros

En relación al presente ítem, en el manejo y disposición de escombros, es de aclarar que de acuerdo al manejo de vales y solicitud de certificaciones en las escombreras se maneja mes vencido. Ante lo anterior la presentación del formato de relación de Escombros y la Certificación de la misma se dará por periodo de mes vencido.

De acuerdo a lo anterior en el mes de diciembre se generaron 450 m³ de excavación, dispuesto en sitio autorizado.

A continuación, se relaciona el volumen reportado de escombros, dispuestos actualmente.

Tabla 4. Relación de Escombros

ITEM	MATERIAL	VOLUMEN M ³	MES	SITIO DE DISPÓSICION	CERTIFICADO	
					SI	NO
01	ESCOMBRO	0	SEPTIEMBRE	N.A	--	--
02	ESCOMBRO	0	NOVIEMBRE	N.A	--	--
03	ESCOMBRO	45	DICIEMBRE	CEMEX	X	
		405		REX		X

Fuente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Nota 1: El PIN generado es el 17853.

Ver anexo N° 3. Relación de escombros y certificación.

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT, 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición – RCD

Los residuos de construcción y demolición se definen aquellos que se generan durante el desarrollo de un proyecto constructivo, entre los cuales se pueden encontrar RCD- susceptibles de aprovechamiento y RCD **No** susceptibles de aprovechamiento; los primeros se encuentran los productos de excavación, materiales pétreos no contaminados, demolición, entre otros, y los segundos están los materiales que se encuentran contaminados y que por sus características físicas y técnicas no pueden ser aprovechados.

Para el actual periodo y de acuerdo al PG-RCD presentado al inicio del proyecto, el reporte mensual de RCD se presenta por mes vencido, por lo anterior se radica el mes de diciembre relacionando el formato de archivo lineal, el formato de aprovechamiento insitu, el archivo master o plano y las certificaciones. **Ver anexo N° 14. Reporte de RCD mes de diciembre.**

Tabla 5. Relación de RCD

ITEM	MATERIAL	MES	VOLUMEN M³ REUTILIZADO
01	RCD	SEPTIEMBRE	0
02	RCD	OCTUBRE	0
03	RCD	NOVEIMBRE	0

Fuente: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

Por otra parte, el día 29 de enero, en las instalaciones de la Alcaldía Local en conjunto con el referente PIGA, Interventoría y Contratista, se efectuó el debido cargue de los reportes de RCD a la plataforma de la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, de los meses de septiembre a noviembre del 2019.

Ver anexo N° 3.1. Radicado de cargue de reporte de RCD a la SDA.

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MT. 902.110.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales

En relación al presente ítem, el manejo de los residuos líquidos del baño del campamento y bodega, es adecuado, ya que este se encuentra dentro del arrendamiento del local y el aseo es realizado periódicamente.

D) Programa B4. Control de Emisiones Atmosféricas

Para el control de emisiones atmosféricas se efectúa la debida instalación y seguimiento del cerramiento perimetral de obra, con el objeto de evitar la polución de material particulado que se generen de las actividades de obra a la vecindad, de igual forma los materiales son protegidos con plástico o polisombra, evitando el arrastre de material por acción de la lluvia y viento. **Ver anexo N° 1 Registró Fotográfico.**

Por otra parte, la maquinaria utilizada cumple las revisiones tecno mecánicas y las volquetas antes de salir de la obra son capadas y las vías de acceso son barridas permanentemente. **Ver anexo N° 1 Registró Fotográfico.**

E) Programa B5. Manejo Integral de Cuerpos de Agua

Durante el presente periodo en los CIV 4005073 VIA 5, 4005079 VIA 10 y 4005352 VIA 8 se cuenta con sumideros, a los cuales se le efectuó seguimiento y protección con polimalla azul. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

2.4.1.3 COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y PAISAJISMO

A) Programa C. Manejo de la Vegetación

Se efectúa seguimiento a la protección de los individuos arbóreos presentes en el CIV 4005352. Protección realizada en el periodo anterior, con polimalla azul soportado por durmientes. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

2474 2594

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

2.4.1.4 COMPONENTE D – GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A) Programa D. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

En el presente acápite se da cumplimiento al programa en la contratación de la maquinaria correspondiente para ser utilizada en la obra. A continuación, se relaciona la maquinaria contratada.

Tabla 6. Relación de maquinaria

ITEM	TIPO DE VEHICULO	PLACA		DOCUMENTOS LEGALES (TARJETA DE PROPIEDAD, LICENCIA, CC)		SEGURO (SOAT)			REVISION TECNOMECANICA			AUTORIZADA SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE			PIN	
		Nº	NA	SI	NO	SI	NO	NA	SI	NO	NA	SI	NO	NA	Nº	NA
MAQUINARIA Y EQUIPOS UTILIZADOS																
1	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR 420E		X	X				X			X			X		X
2	VIBROCOMPACTADOR INGERSOLL RAND CR-30		X	X				X			X			X		X
3	MINICARGADOR BOBCAT S175		X	X				X			X			X		X
4	VOLQUETA	SVD554		X		X			X			X			2461	
5	VOLQUETA	TLN940		X		X			X			X			9990	
6	VOLQUETA	SSG810		X		X			X			X			2259	
7	VOLQUETA	SWO936		X		X			X			X			2158	
8	VOLQUETA	SVB886		X		X			X			X			11630	
9	VOLQUETA	XIJ350		X		X			X			X			14138	
10	VOLQUETA	TFK279		X		X			X			X			9306	

Fuente: Autor

Por lo anterior se adjunta documentación de la maquinaria a utilizar. **Ver anexo N° 4. Documentación de maquinaria.**

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.810.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

2.4.1.5 COMPONENTE E – PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD

A) Programa E. Programa de señalización de seguridad

PMT

Durante el presente periodo se dio alcance a la prórroga de los COI #43 y 46 aprobados el 25 de octubre y 15 de noviembre respectivamente y presentados en el informe #03. Ante lo anterior se adjunta el nuevo COI # 04.

CIV	N.º DE COI	FECHA INICIO	FECHA FIN	AUTORIZADO
4005073 – vía 5	04 (23-01-20)	24-01-2020	23-04-2020	SI
4005352 – vía 8	04 (23-01-20)	24-01-2020	23-04-2020	SI
4005480 – vía 6	04 (23-01-20)	24-01-2020	23-04-2020	SI
4005079 – vía 10	04 (23-01-20)	24-01-2020	23-04-2020	SI

Ante lo anterior se adjunta copia de COI N° 04. Ver Anexo 05. Copia prórroga del COI.

Por otra parte, se mantiene los COI aprobados y relacionados en el informe #04.

CIV	N.º DE COI	FECHA INICIO	FECHA FIN	AUTORIZADO
4007971 – vía 11	48 (28-11-19)	29-11-2019	20-02-2020	SI
4007972 – vía 12	48 (28-11-19)	29-11-2019	20-02-2020	SI

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

3 ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTION DE SST

3.1 POLÍTICA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para el personal que ingreso en el periodo se le socializo la Política en Seguridad y Salud en el trabajo, la política antitabaquismo y antidrogas y el reglamento de higiene y seguridad industrial.

Se mantiene y retroalimenta en el campamento las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, la de antitabaquismo y antidrogas y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial publicadas a la vista de personal. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

3.2 AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Al personal que ingreso en el periodo, antes de iniciar labores, se verifico su afiliación a la Seguridad Social.

Los datos de las afiliaciones correspondientes a las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), Administradora de Fondo de Pensiones (AFP) y Administradora de Riesgos Laborales (ARL) se relacionan en el presente informe. (Solo personal administrativo) **Ver anexo N° 06. – Cuadro relación de personal, Planillas y afiliaciones.**

Adicionalmente prestan servicio los profesionales relacionados en la tabla N° 06, por prestación de servicios profesionales esporádicos de acuerdo a la necesidad; lo anterior conlleva a que estos perfiles no se conciernen en el cuadro de personal directo y permanente presentado en el anexo 6.

Tabla 7. Relación personal - prestación de servicios

NOMBRE	CARGO
Ing. Oliverio Bonilla H	Director de Obra
Ing. Fernando A. Nieto	Especialista en Geotecnia
Ing. Omara Archila	Especialista Hidráulico
Ing. Gabriel Díaz	Especialista en Transito
Ing. Erika A. Bonilla C.	Esp. Gerencia de Proyectos
Ing. Diego F. González	Especialista en Pavimentos

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC RVT, 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

3.3 PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

El programa de medicina preventiva y del trabajo está orientado a la promoción de la salud, prevención de la alteración del estado de salud del diagnóstico y atención de la enfermedad manteniéndolo en aptitud de producción de trabajo. A continuación se describen las actividades realizadas durante el presente periodo.

3.3.1 Exámenes médicos de ingreso

Se realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso al personal nuevo, éstos fueron practicados en un centro médico ocupacional SERVSALUD OCUPACIONAL IPS SAS que cuenta con licencia de salud ocupacional. Dichos exámenes fueron practicados por un médico especialista en Salud Ocupacional.

Ver anexo N° 7. Exámenes de ingreso del periodo.

3.3.2 Dotación y señalización de campamentos de obra

Adquirido el campamento, éste se doto y mantiene con camilla, extintor y un botiquín de primeros auxilios. **Ver Anexo 01. Registro Fotográfico.**

3.4 PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

Este programa busca mitigar y controlar los efectos de los riesgos que se puedan presentar en los frentes de trabajo por las actividades de obra. Las actividades desarrolladas durante el presente periodo se describen a continuación:

3.4.1 Inducción y Capacitaciones

Durante la ejecución del presente periodo se realizó inducción y notificación al riesgo al personal nuevo, los temas tratados fueron: Sistema General de riesgo, uso y mantenimiento de elementos de protección personal, socialización de las políticas SST, política de prevención de drogas, reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. ***Ver anexo N° 8.- Registro de inducción y notificación al riesgo.***

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 – FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

Por otra parte, se efectuó acompañamiento a la reunión de inicio en el sector de guacamayas, donde se dio a conocer a la comunidad del alcance ambiental y SST del proyecto.

En relación a las capacitaciones durante el periodo y de acuerdo al cronograma del SG-SST para el mes de Enero no se establecen sensibilizaciones.

3.4.2 Copasst o vigía

En el presente Periodo se efectuó la reunión mensual del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo Copasst. **Ver anexo N° 9 – Acta de Reunión del Copasst.**

3.4.3 Entrega de elementos de protección personal – EPP

Durante el presente periodo, antes iniciar las labores de obra, al personal nuevo y actual (reposición) se le entregó de la respectiva dotación y elementos de protección personal, quedando como soporte las planillas de entrega de EPP. **Ver anexo N° 10. – Entrega de Dotación- EPP.**

3.4.4 Manejo de baños

Actualmente el servicio de baño se está manejando dentro del inmueble del campamento y bodega de arrendamiento del contratista.

3.4.5 Inspecciones planeadas durante el mes

Durante el presente periodo se reporta una inspección de frente de obra e inspección de EPP. **Ver Anexo 11. Registro Inspección planeada y registro de capacitaciones.**

3.4.6 Reporte de Accidentes de trabajo

Durante el presente periodo se reportó un accidente de trabajo, cuya descripción es la siguiente, "el trabajador se encontraba transportando una mezcla de concreto en un balde para colocar un muro, en ese momento se suelta el gancho que sostiene

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MIT, 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 - 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

la caneca ocasionándose una laceración en el dedo 1(Pulgar) de la mano derecha, presenta inflamación y dolor”.

Una vez sucedido el Accidente se tomaron las medidas pertinentes para los primeros auxilios en el lugar, posterior a ello se remitió al trabajador al centro médico más cercano para su atención especializada; de igual forma se efectuó el reporte ante la aseguradora de riesgos laborales.

Por otra parte, para el cálculo de la accidentalidad se tiene en cuenta el número de personas que trabajaron para el contrato durante el mes, teniendo en cuenta tanto el personal administrativo como el personal operativo y el número de HHT. **Ver anexo N° 12. Formato mensual de accidentes de trabajo y reporte AT.**

3.5 PLAN DE CONTINGENCIA Y BRIGADAS DE EMERGENCIA

Se socializo en la inducción el listado de números de emergencia y se toma el registro de números de contacto de las personas en caso de una emergencia de los trabajadores. **Ver anexo N° 13. - Formato Registro Medevac.**

3.6 CONCLUSIONES

- ✓ El componente ambiental cumplió con los requerimientos establecidos contractualmente presentados en el MAO y por la normatividad ambiental vigente.
- ✓ Se mantiene una buena comunicación con el Coordinador Ambiental de la supervisión y el profesional Ambiental de la Interventoría, el cual permite el buen desarrollo de las actividades pertinentes al componente ambiental.
- ✓ No se ha realizado reutilización de RCD en actividades de ejecución del proyecto.
- ✓ Se instruyó al personal entrante, sobre el MAO, PG-RCD, manejo de residuos, protección de sumideros y vegetación.
- ✓ Se instruyó al personal, sobre el cuidado de individuos arbóreos que puedan ser afectados.

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

- ✓ No se generó en el periodo reportado ningún incidente o accidente ambiental, buscando en los frentes de trabajo, la protección y cuidado de los recursos.

En el área SST se dio cumplimiento al Sistema de Gestión de seguridad y salud en trabajo presentado al inicio del contrato.

- ✓ Se realiza inducción y notificación de riesgos al personal de ingreso.
- ✓ Se hace entrega de los elementos de protección personal a los trabajadores que realizan tareas específicas.
- ✓ Se realiza la inspección de frentes de obra.
- ✓ Se verifico los campamentos de los sitios de intervención, que garantizarán el bienestar físico de los trabajadores, contando con área de cambio de ropa y servicio de baño como lo esencial.
- ✓ Se da cumplimiento a las metas propuestas en los indicadores de accidentalidad.

ANEXOS

- ANEXO 01. REGISTRO FOTOGRAFICO
- ANEXO 02. RELACION DE MATERIALES Y CERTIFICACIÓN
- ANEXO 03. RELACION DE ESCOMBROS Y CERTIFICACIÓN
- ANEXO 3.1 RADICADO DE CARGUE DE REPORTE DE RCD A LA SDA.
- ANEXO 04. DOCUMENTACION MAQUINARIA
- ANEXO 05. COPIA DE COI
- ANEXO 06. RELACIÓN DE PERSONAL, PLANILLAS Y AFILIACION
- ANEXO 07. EXÁMENES MÉDICOS
- ANEXO 08. REGISTRO DE INDUCCIONES Y NOTIFICACION DE RIESGOS
- ANEXO 09. ACTA DE CONFORMACION COPASST
- ANEXO 10. PLANILLA ENTREGA EPP
- ANEXO 11. REGISTRÓ INSPECCIÓN PLANEADA Y CAPACITACIONES
- ANEXO 12. FORMATO MENSUAL DE AT.
- ANEXO 12. FORMATO REGISTRO MEDEVAC.
- ANEXO 14. REPORTE RCD – DICIEMBRE 2019.

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.210 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 01. REGISTRO FOTOGRAFICO



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FOLSC

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ACOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización: CIV 4005079 VIA 10

Descripción: Segulmineto a cerramiento Instalado



Localización: CIV 4005073 VIA 5

Descripción: Segulmineto a cerramiento Instalado




Localización: CIV 4007971-7972 VIA 11 -12

Descripción: Segulmineto a cerramiento Instalado



Localización: CIV 4005073 VIA 5

Descripción: Segulmineto a cerramiento Instalado

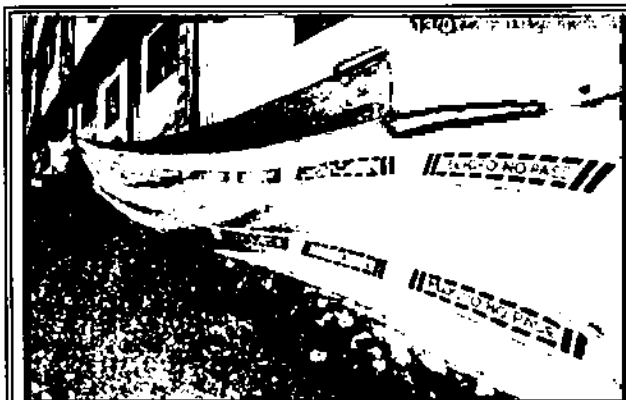

Localización: CIV 4005352 - VIA 8

Descripción: Segulmineto a cerramiento Instalado



Localización: CIV 4005352 - VIA 8

Descripción: Segulmineto a cerramiento Instalado



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FOLSC

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Localización: CIV 4007971-7972 VIA 11 -12

Descripción: Segulmineto a cerramiento instalado



Localización: CIV 4007971-7972 VIA 11 -12

Descripción: Segulmineto a cerramiento instalado

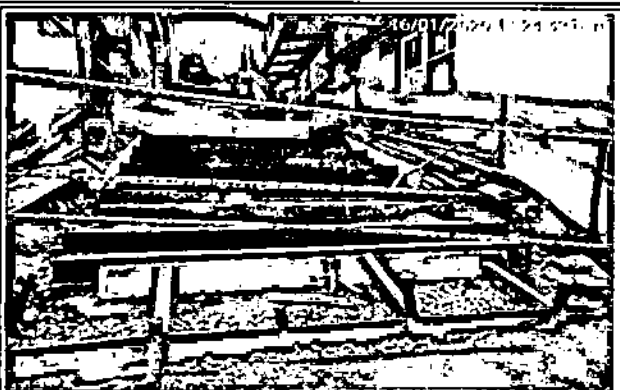


Localización: Todos los CIV

Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo



Localización: Todos los CIV

Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo

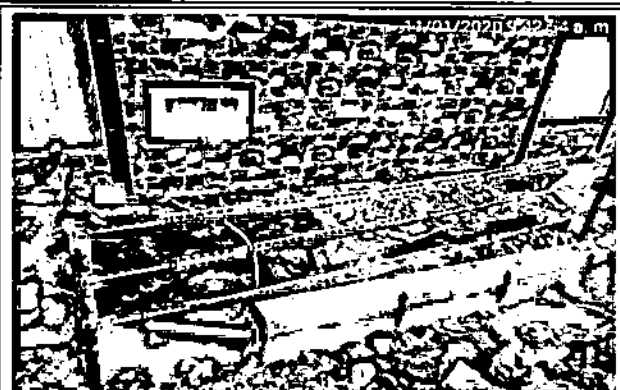

Localización: Todos los CIV

Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo



Localización: Todos los CIV

Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo




**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FDLSC

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO

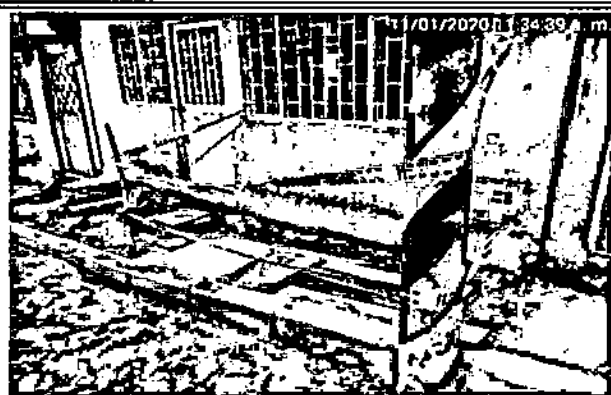

Localización: Todos los CIV
Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo



Localización: Todos los CIV
Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo



Localización: Todos los CIV
Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo



Localización: Todos los CIV
Descripción: Señalización y demarcación áreas de trabajo



Localización: Todos los CIV
Descripción: Señalización de área de peligro



Localización: Todos los CIV
Descripción: Adecuación de acceso peatonal



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FDLSC

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento identificación de maquinaria



Localización: Todos los CIV

Descripción: Carpa - zona de resguardo



Localización: Todos los CIV

Descripción: Carpa - zona de resguardo



Localización: Todos los CIV

Descripción: Instalación Valla Movil de obra



Localización: Todos los CIV

Descripción: Instalación Valla Movil de obra



Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento Barricada



"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO




Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento Barricada




Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento Barricada

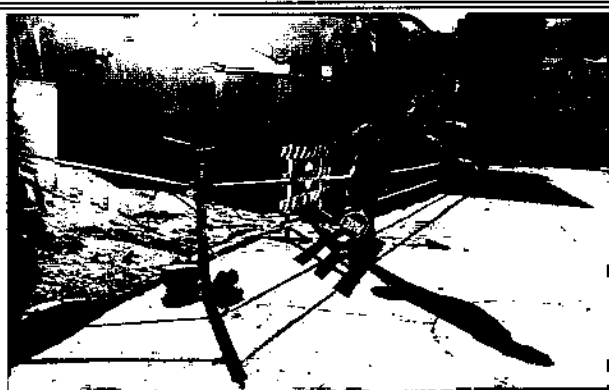

Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento Barricada




Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento protección de sumideros



Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento protección de sumideros

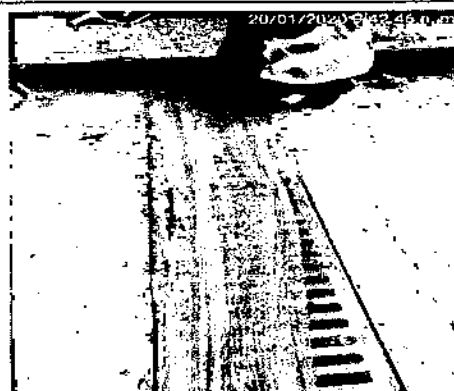

Localización: Todos los CIV

Descripción: Seguimiento protección de sumideros



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FDLSC

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización: CIV 4005352 - VIA 8

Descripción: Punto Ecologico



Localización: CIV 4005352 - VIA 8

Descripción: Instalación señales SST



Localización: Campamento - Bodega

Descripción: Instalación señales SST



Localización: Todos los CIV

Descripción: Limpieza de vías



Localización: Punto Crea

Descripción: Campamento - Punto Crea



Localización: Bodega

Descripción: Campamento - Bodega



"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización: Todos los CIV
Descripción: Manejo de trafico - auxiliar



Localización: Todos los CIV
Descripción: Protección de materiales



Localización: CIV 4005352 - VIA 8
Descripción: Seguimiento protección de individuos arboreos



Localización: CIV 4005352 - VIA 8
Descripción: Seguimiento protección de individuos arboreos



Localización: CIV 4005352 - VIA 8
Descripción: Manejo de raíces



Localización: CIV 4005352 - VIA 8
Descripción: Manejo de raíces



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FDLSC

"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".


CONTRATO No. 340 DE 2019

30 DICIEMBRE/2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Localización:	Campamento
Descripción:	Equipos de emergencia

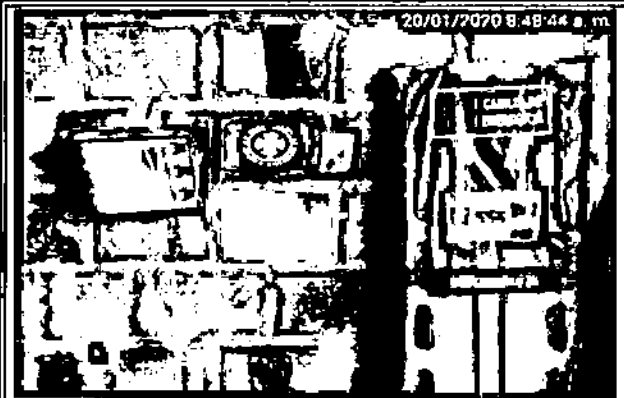

Localización:	Frentes de obra
Descripción:	Equipos de emergencia




Localización:	Campamento
Descripción:	Cartelera SST



Localización:	Campamento
Descripción:	Inducción y Notificación de Riesgos





Localización:	Campamento
Descripción:	Entrega de EPP



Localización:	
Descripción:	

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 02. RELACIÓN DE MATERIALES Y CERTIFICACIÓN

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FOLSC		CONTROL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN										Version 00 Fecha de emisión 2019			
CONTRATO No.		COP-340 DE 2019													
CONTRATISTA		CONSORCIO MALLA VIAL BBC													
MES DE REPORTE		DICIEMBRE DE 2019													
OSA	V1	Proveedor V1	V2	Proveedor V2	V3	Proveedor V3	V4	Proveedor V4	V5	Proveedor V5	V6	Proveedor V6	V7	Proveedor V7	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9			15	VILLA PAULA	14	VILLA PAULA									
10															
11	15	VILLA PAULA	30	VILLA PAULA											
12	15	VILLA PAULA	30	VILLA PAULA	14	VILLA PAULA									
13	15	VILLA PAULA	15	VILLA PAULA	14	VILLA PAULA									
14															
15															
16	28	VILLA PAULA			14	VILLA PAULA									
17			28	VILLA PAULA											
18					28	VILLA PAULA									
19															
20															
21															
22															
23															
24															
25															
26			15	VILLA PAULA	15	VILLA PAULA									
27	30	VILLA PAULA	15	VILLA PAULA											
28															
29															
30															
31															
TOTAL	103,0		148,0		99,0		0,0		0,0		0,0		0,0		
Tipo de Material V1: B-250		Tipo de Material V5:													
Tipo de Material V2: BSG - C		Tipo de Material V6:													
Tipo de Material V3: PIEDRA RAJON		Tipo de Material V7:													
 CONTRATISTA		 INTERVENTOR													

¡Agregados Confiables!



CERTIFICADO: MG-074

Bogotá, D.C., jueves, 30 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN

MINER GROUP SAS identificada con NIT. 900.200.056-5, titular de la **CANtera VILLA PAULA**, Ubicada en la vereda Mochuelo, Ciudad Bolívar.

HACE CONSTAR QUE:

Suministró al cliente objeto del certificado, los materiales en los periodos, volúmenes y unidades de medida que se detallan en el presente documento, así:

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE O RAZON SOCIAL		CONSORCIO MALLA VIAL BBC				
CC O NIT		901.310.904				
DESCRIPCION DE LA OBRA:						
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTÁ D.C GRUPO 3.						
TIPO CONTRATO		IDU	NÚMERO	COP 340 DE 2019	PIN AMBIENTAL	17853

DATOS DEL MATERIAL:

Periodo inicial	Periodo final	Material suministrado	Volúmen	Unidad
1/12/2019	31/12/2019	B200	58	M ³
1/12/2019	31/12/2019	Piedra Rajon	43	M ³
1/12/2019	31/12/2019	Sub base granular tipo C	58	M ³

Firma digital autorizada:

Para confirmaciones

comuníquese al correo del pie de página

Janeth Blanco

¡Agregados Confiables!



MINERGROUP

CERTIFICADO: MG-077

Bogotá, D.C., viernes, 31 de enero de 2020

CERTIFICACIÓN

MINER GROUP SAS identificada con NIT. 900.200.056-5, titular de la **CANtera VILLA PAULA**, Ubicada en la vereda Mochuelo, Ciudad Bolívar.

HACE CONSTAR QUE:

Suministró al cliente objeto del certificado, los materiales en los periodos, volúmenes y unidades de medida que se detallan en el presente documento, así:

DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		CONSORCIO MALLA VIAL BBC			
CC O NIT		901			
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:					
EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES DE DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C. GRUPO 3.					
TIPO CONTRATO	IDU	NÚMERO	COP-340 de 2019	PIN AMBIENTAL	17853

DATOS DEL MATERIAL:

Periodo inicial	Periodo final	Material suministrado	Volúmen	Unidad
1/10/2019	31/12/2019	Piedra Rajon	56	M ³
1/10/2019	31/12/2019	B200	45	M ³
1/10/2019	31/12/2019	Sub base granular tipo C	42	M ³
1/10/2019	31/12/2019	Sub base granular tipo C	48	

Firma digital autorizada:

Para confirmaciones

comuníquese al correo del pie de página

Janeth Blanco

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 03. RELACIÓN DE ESCOMBROS Y CERTIFICACIÓN



**CONSORCIO
MALLA VIAL BBC**
CO-340-2019 - FDLSC

CONTROL DE GENERACIÓN DE ESCOMBROS

Versión
00

Fecha emisión
2019

CONTRATO No. COP-340 DE 2019

FECHA DE INICIO 30 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN 29 DE MAYO DE 2020
CONTRATISTA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA ROAD DESIGN
PERIODO REPORTADO DICIEMBRE DE 2019

FECHA	PLACA DEL VEHICULO	PIN DEL VEHICULO	TIPO DE ESCOMBRO	VOLUMEN TRANSPORTADO Y/O REUTILIZADO	ETAPA DE GENERACIÓN	ETAPA DE APROVECHAMIENTO	SITIO DE DISPOSICIÓN	HOMBRE RESPONSABLE DEL DESPACHO
9/12/2019	TKF279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
11/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
12/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
13/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
13/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
13/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
14/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
16/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
16/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
17/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
17/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
20/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
23/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
26/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
26/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
26/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
26/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
27/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
27/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
27/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
27/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
28/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
28/12/2019	TFK279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
23/12/2019	SWL435	4041	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
23/12/2019	SWL435	4041	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
23/12/2019	SVB886	11632	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
7/12/2019	TKF279	9306	EXCAVACIÓN	15	MEJORAMIENTO DE VAS		REX INGENIERIA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC

405

Firma del contratista (Residente Ambiental)

Firma del interventoria

Vo/Bo

* Se debe anexar a este formato los vales y la certificación correspondiente a la disposición final de escombros y la certificación de re-utilización y/o aprovechamiento en los casos que aplique.



Versión
 00

Fecha emisión
2019

CONTRATO No. COP-340 DE 2019

FECHA DE INICIO	30 DE AGOSTO DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	29 DE MAYO DE 2020
CONTRATISTA	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA	ROAD DESIGN
PERIODO REPORTADO	DICIEMBRE DE 2019

[illegible]

45

Firma del contratista (Residente Ambiental)

Firma del interventoría

 Y_0/B_0

* Se debe anexar a este formato los vales y la certificación correspondiente a la disposición final de escombros y la certificación de re-utilización y/o aprovechamiento en los casos que aplique.



Construyendo un mejor futuro

CEMEX COLOMBIA S.A - NIT: 860.002.523-1

SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE - PIN: 1778 - 8418

MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO. 1506 - 2006 / 1112 - 2012

CERTIFICA QUE:

**CEMEX COPIA**

La firma CONSORCIO MALLA VIAL BBC con identificación 901310904 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 12 del año 2019, un total de 3 viajes expresados en: 0.00 M3 volqueta sencilla (aprox 7 m3/viaje) y 45.00 M3 en Volqueta Doble Troque (aprox 15 m3/viaje).

La presente se expide a solicitud del interesado a los 25 días del mes 01 del año 2020, para presentar a la obra COP 340 de 2019 "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGO con PIN: 17853.

En constancia se firma:

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: Ru8LZLQd-18013, generado en: 2020-01-25

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyaca # 72 - 04 sur, Telefono: 3112209197 Bogota, D.C.
Colombia.



SOLICITUD DE CERTIFICACION RDC-ESCOMBRERA SAN ANTONIO

FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AA)

--	--	--

QUEEN SOLICITA LA CERTIFICACION (Si es primera vez que certifica debe anotar documentos)

NOMBRE Y/O RAZON SOCIAL

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

N° NIT Y/O CC

901.310.904-1

DIRECCION

Diagonal 182 #20-91 Oficina 255C

PERSONA DE CONTACTO

JHON EDWIN SERRATO

TELEFONO

3125711442

CORREO ELECTRONICO

sisomamallavialbbc@gmail.com

DATOS DE LA OBRA GENERADORA DE RCD

NOMBRE DE LA OBRA

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

N° CONTRATO

(Especificar si corresponde a contrato IDU)

COP 340 DE 2019

OBJETO DEL CONTRATO

(Si aplica)

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3°.

N° PIN OBRA

17853

DIRECCION OBRA

Transversal 16C Este #46a-05 sur. Altos del Virrey

DATOS DE LA CERTIFICACION

PERIODO A CERTIFICAR

--



SOLICITUD DE CERTIFICACION RDC ESCOMBRERA SAN ANTONIO

VOLUMEN A CERTIFICAR

Material	Sencilla 7(m3)		Doble Troque 15(m3)		Mula 22(m3)	
	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.	Cant.	Vol.
Escombro						
Excavación			27	405		
Capa Vegetal						
Tierra Negra						
Lodo						
Asfalto						
TOTAL	0	0	27	405		


OBSERVACIONES:

*La documentación que se debe anexar para tramitar la certificación por primera vez es:

1. Persona natural: RUT y fotocopia de la cedula
2. Empresa: Camara de comercio, RUT y fotocopia de la cedula del representante legal
3. Consorcio: RUT y fotocopia cedula del representante legal

**Se deben anexar los vales verdes pegados en hojas, en caso de que se entreguen sueltos no se respondera por vales faltantes o no certificados. No se certifican vales amarillos y/o fotocopias.

***Se debe diligenciar un formato por frente de disposicion (Av. Boyaca y Av. Caracas)

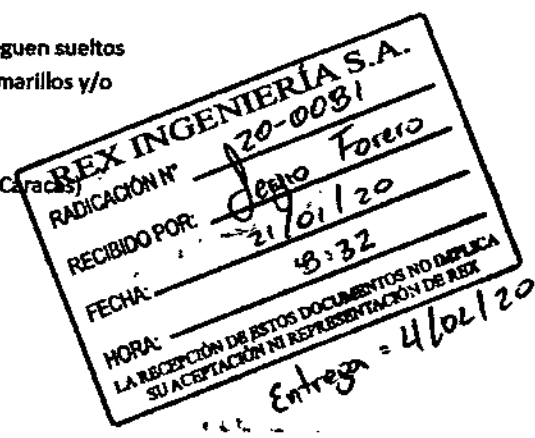

Contacto: Angela Henao
angelahenao.rex@hotmail.com

Tel: 7652157 Ext. 112

REMISION / CARTA PORTE



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA
16.12.2019

FOLIO
170216238



EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP. 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No 72-04 Sur

CP BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPANIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO:
MAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

CANTIDAD
1,000 EA

PEDIDO 170216236 ZTA 000010 PRODUCTO SERV. DISPOSICIÓN EXCAVACIÓN DOBLE
OC: SVB886 11630 70000 Contrato:

DESPACHADO
16 DIC 2019
CEMEX
RCD

NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripción	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Fallantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 16.12.2019

Hora: 08:13:21

IVILLANUEZ NOHEMY VILLANUEVA ZARATE

CLIENTE

1/1

www.cemexcolombia.com



ORIGINAL



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

REMISION / CARTA PORTE

FECHA
20.12.2019

FOLIO
170477719



EXPEDIDA EN:

CO-ESCOBRERA-TUNJUELO
Avenida el Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE

DE MERCANCIA QUE SERA FACTURADA A:

OTC ESCOBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida el Llano No 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

COMPANIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

OTC ESCOBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida el Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIAJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO: 170477718 ZTA 000010
PRODUCTO: SERV. DISPOSICIÓN EXCAVACIÓN DOBLE
OC: SVB886 11630 70000 Contrato:

CANTIDAD
1,000 EA



NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 20.12.2019

Hora: 08:59:44

NYILLANUEZ NOHEMY VILLANUEVA ZARATE

CLIENTE

1/1

www.cemexcolombia.com



ORIGINAL

225

REMISION / CARTA PORTE



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 00 No. 0A 54 Piso 0
CO 0030000

FECHA
23.12.2010

FOLIO
170591118



EXPEDIDA EN:

CO ESCOMBIRERA-TUNJUELO
Avenida el Llano Sur 72-04
CIP 11001000 Bogotá CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE
DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:
OTC ESCOMBIRERA TUNJUELO ZUN076012
Avenida el Llano No 72-04 Sur
00001A D.C 11
0000026231

OTC ESCOMBIRERA TUNJUELO ZUN076012
Avenida el Llano No 72-04 Sur
CIP 11001000 Bogotá, D.C. 11, CO

COMPañIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO:
VIJE:
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO 170591115 ZTA 000010 PRODUCTO SERV. DISPOSICIÓN EXCAVACIÓN DOBLE
OC: XIJ350 14138 70000 Controla:

CANTIDAD
1.000 EA



NOTAS:

ACUSE DE RECIBO

Descripción	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Húmedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 23.12.2010
Hora: 14:03:58

WILLANUEZ NOHEMY VILLANUEVA ZARATE

CLIENTE
1/1

www.cemexcolombia.com



ORIGINAL

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

487932

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 296011

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE

PLACAS VEHICULO

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☒
Excavación ☒
Cape Vegetal ☒
T. Negra ☒
Lodo ☒

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

09/12/2019 02:08:36 p.m.

Tierra Negra Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF279

Particular

Espacio Para Freno

CERTIFICACIÓN

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490295

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 296011

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE

PLACAS VEHICULO

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

11/12/2019 05:20:00 p.m.

Excavación Doble Troque
Pin 11622 Placa SVB886

Particular

Espacio Para Freno

CERTIFICACIÓN

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490115

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 297219

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE

PLACAS VEHICULO

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☒
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

12/12/2019 05:07:05 p.m.

Escombro Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF279

Particular

Espacio Para Freno

CERTIFICACIÓN

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490029

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 297581

EMPRESA GENERADORA

OBRA/FRENTE

PLACAS VEHICULO

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

13/12/2019 03:53:05 p.m.

Escombro Doble Troque
Pin 11622 Placa SVB88

Particular

Espacio Para Freno

CERTIFICACIÓN

Recibido Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0838 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490061

FECHA: DÍA 13 MES 12 AÑO 2019 CONTRATO IDU: Registro N° 397300

EMPRESA GENERADORA Na

OBRA/FRENTE C-2 PIN

PLACAS VEHICULO SV8885 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☒
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

13/12/2019 10:20:43 a.m.
Escombros Doble Troque
Pin 9306 Placa SV8885
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

Fotografía Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0838 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490030

FECHA: DÍA 1 MES 20 AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 397300

EMPRESA GENERADORA Na

OBRA/FRENTE C-2 PIN

PLACAS VEHICULO TKF275 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☒
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

13/12/2019 03:55:01 p.m.
Escombros Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF275
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

Fotografía Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0838 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

489833

FECHA: DÍA 14 MES 12 AÑO 2019 CONTRATO IDU: Registro N° 39775

EMPRESA GENERADORA Na

OBRA/FRENTE C-2 PIN

PLACAS VEHICULO SV8885 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

14/12/2019 10:44:43 a.m.
Escombros Doble Troque
Pin 9306 Placa SV8885
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

Fotografía Por: Fernando Riquelme

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0838 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

489956

FECHA: DÍA 14 MES 12 AÑO 2019 CONTRATO IDU: Registro N° 39754

EMPRESA GENERADORA Na

OBRA/FRENTE C-2 PIN

PLACAS VEHICULO SV8885 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

14/12/2019 10:24:43 a.m.
Escombros Doble Troque
Pin 9306 Placa SV8885
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

Fotografía Por: Sergio Forero

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490388

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 200120

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Partida PIN

PLACAS VEHICULO TKF279 PIN

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	16/12/2019 03:10:07 p.m. Escombro Doble Troque Pin 9305 Placa TKF27 Particular Espacio Para Imprimir
Excavación ☐	Doble Troque ☐	
Capa Vegetal ☐	Troque Camión ☒	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490627

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 200122

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Partida PIN

PLACAS VEHICULO SVB886 PIN

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	17/12/2019 11:23:17 am Escombro Doble Troque n° 11622 Placa SVB88 Particular Espacio Para Imprimir
Excavación ☐	Doble Troque ☐	
Capa Vegetal ☐	Troque Camión ☐	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

490631

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 200124

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Partida PIN

PLACAS VEHICULO TKF279 PIN

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	17/12/2019 11:28:42 am Escombro Doble Troque Pin 9305 Placa TKF27 Particular Espacio Para Imprimir
Excavación ☒	Doble Troque ☐	
Capa Vegetal ☐	Troque Camión ☐	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492351

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 200126

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Partida PIN

PLACAS VEHICULO SVB886 PIN

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	20/12/2019 06:43:45 pm Escombro Doble Troque n° 11622 Placa SVB88 Particular Espacio Para Imprimir
Excavación ☐	Doble Troque ☐	
Capa Vegetal ☐	Troque Camión ☐	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492712

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300157

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO SV8886 PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

23/12/2019 04:55:37 p.m.
Tierra Negra Doble Troque
Pin 11632 Placa SV8886
Particular
Espacio Para Trabajo

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO FESD 1913

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492807

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300530

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO SV8886 PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

26/12/2019 04:58:23 p.m.
Escombro Doble Troque
Pin 11632 Placa SV8886
Particular
Espacio Para Trabajo

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO FESD 1915

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492809

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300533

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO TKF279 PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

26/12/2019 05:03:31 p.m.
Escombro Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF279
Particular
Espacio Para Trabajo

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO FESD 1841

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492785

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300436

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO TKF279 PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☒
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

26/12/2019 07:52:28 p.m.
Escombro Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF279
Particular
Espacio Para Trabajo

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492776

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300412

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Particular PIN

PLACAS VEHICULO SVB886 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☒
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

26/12/2019 02:08:47 p.m.
Tierra Negra Doble Troque
m 11622 Placa SVB886
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492887

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300412

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Particular PIN

PLACAS VEHICULO TKF219 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

27/12/2019 04:49:13 p.m.
Tierra Negra Doble Troque
m 9306 Placa TKF219
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492865

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300764

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Particular PIN

PLACAS VEHICULO SVB886 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☒
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☐

27/12/2019 03:29:11 p.m.
Tierra Negra Doble Troque
m 11622 Placa SVB886
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 16 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492818

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300603

EMPRESA GENERADORA N.A.

OBRA/FRENTE Particular PIN

PLACAS VEHICULO SVB886 PIN

TIPO DE MATERIAL

Escombro ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Sencillo ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☐

27/12/2019 04:23:11 p.m.
Tierra Negra Doble Troque
m 11622 Placa SVB886
Particular
Espacio Para Timbre

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492822

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300630

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☐
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

27/12/2019 08:57:22 am
Tierra Negra Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF279
Particular
Espacio Para Tierra

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 0730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492921

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300630

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☐
Excavación ☒
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

28/12/2019 10:57:00 am
Escombros Doble Troque
Pin 11622 Placa SVB885
Particular
Espacio Para Tierra

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492941

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 301050

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE PIN

PLACAS VEHICULO PIN 0

TIPO DE MATERIAL

Escombros ☒
Excavación ☐
Cape Vegetal ☐
T. Negra ☐
Lodo ☐

TIPO DE VEHICULO

Simple ☐
Doble Troque ☐
Tracto Camión ☒

28/12/2019 12:38:59 p.m.
Escombros Doble Troque
Pin 9306 Placa TKF279
Particular
Espacio Para Tierra

CERTIFICACIÓN

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492670

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300014

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO SWL435 PIN 0

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	23/12/2019 12:14:55 pm Tierra Negra Doble troque Pin 4041 Placa SWL435 Particular Espacio Particular
Excavación ☐	Doble Troque ☐	
Cape Vegetal ☐	Troque Camión ☒	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

Hecho Por: Sergio Fierro

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492387

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 299833

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO SWL435 PIN 0

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	23/12/2019 09:06:55 am Escombro Doble troque Pin 4041 Placa SWL435 Particular Espacio Particular
Excavación ☒	Doble Troque ☐	
Cape Vegetal ☐	Troque Camión ☒	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

Hecho Por: Sergio Fierro

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

497889

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 295770

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO TKF270 PIN 0

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	07/12/2019 12:46:32 pm Tierra Negra Doble Troque Pin 5306 Placa TKF270 Particular Espacio Particular
Excavación ☐	Doble Troque ☐	
Cape Vegetal ☐	Troque Camión ☒	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

Hecho Por: Sergio Fierro

SAN ANTONIO

VALE POR UN VIAJE

DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIALES SELECCIONADOS Y ESCOMBROS
RESOLUCIÓN 0836 DEL 18 DE JULIO DE 2015 DE ANLA
RESOLUCIÓN 1110 DEL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE ANLA
REGISTRO SDA PIN 9730
REGISTRO PROVEEDOR IDU NO. 427 - 2015

492675

FECHA: DÍA MES AÑO CONTRATO IDU: Registro N° 300006

EMPRESA GENERADORA NA

OBRA/FRENTE Particular PIN 0

PLACAS VEHICULO SVB886 PIN 0

TIPO DE MATERIAL	TIPO DE VEHICULO	
Escombro ☐	Sencillo ☐	23/12/2019 12:53:01 pm Escombro Doble Troque Pin 11632 Placa SVB886 Particular Espacio Particular
Excavación ☐	Doble Troque ☐	
Cape Vegetal ☐	Troque Camión ☒	
T. Negra ☐		
Lodo ☐		

CERTIFICACIÓN

Hecho Por: Sergio Fierro

2495-2595

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 3.1 RADICADO DE CARGUE DE REPORTE DE RCD A LA SDA.

24

230

V-Residuos orgánicos	1282,71
VI-Residuos contaminantes	1891,28

Ingrese los datos y de clic en el botón guardar. La información se visualizará como reportada cuando sea aprobada por la Secretaría Distrital de Ambiente

Guardar Agregar Eliminar			DISPOSICIÓN FINAL DE RCD					
	Mes	Año	Cantidad Residuos Pétreos	Unidades Residuos Pétreos	Tipo de Residuo Residuos Pétreos	Cantidad Residuos Finos no expansivos	Unidades Residuos Finos no Expansivos	Tipo de Res Residuos F no Expans
1	Septiembre	2019	0	Toneladas	No aplica	0	Toneladas	No aplica
2	Octubre	2019	0	Toneladas	No aplica	0	Toneladas	No aplica
3	Noviembre	2019	0	Toneladas	No aplica	0	Toneladas	No aplica
< >								

REGISTRO MENSUAL DE TRANSPORTE DE RCD

Para ingresar los reportes mensuales de clic en el numeral de la fila correspondiente

Secretaría Distrital de Ambiente
VENTANILLA VIRTUAL

Actividad Reporte, consulta y modificación de información

Número de radicación 2020ER18626

Fecha inicio 2020-01-29 08:08:09

Fecha fin 2020-01-29 09:00:37

Trámite Seguimiento y Control a Obras Públicas y Privadas

	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.319.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión</i> CMVBBC-01/2019

ANEXO 04. DOCUMENTACION MAQUINARIA



Consulta Automotores

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

PLACA DEL VEHÍCULO:

SVB886

NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:

ESTADO DEL VEHÍCULO:

TIPO DE SERVICIO:

CLASE DE VEHÍCULO:

Información general del vehículo

MARCA:

LÍNEA:

MODELO:

COLOR:

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de póliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
23151409	 09/08/2019	 10/08/2019	 09/08/2020	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	Ⓢ VIGENTE
39703489	 09/08/2018	 10/08/2018	 09/08/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Ⓢ NO VIGENTE
37062807	 09/08/2017	 10/08/2017	 09/08/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Ⓢ NO VIGENTE

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de gases (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
---------------	------------------	----------------	----------------	---------	------------------

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
REVISION TECNICO-MECANICO	 16/08/2019	 16/08/2020	CDA AVENIDA SEXTA LTDA.	SI	142911553
REVISION TECNICO-MECANICO	 15/08/2018	 15/08/2019	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	137321408
REVISION TECNICO-MECANICO	 13/08/2017	 13/08/2018	CDA CAR PITS SA	NO	131929314

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Cáuición

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

☒ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)



Consulta Automotores	Realizar otra consulta
Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.	
PLACA DEL VEHÍCULO: TFK279 NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO: ESTADO DEL VEHÍCULO: TIPO DE SERVICIO: CLASE DE VEHÍCULO:	
Información general del vehículo	
MARCA:	
LÍNEA:	
MODELO:	
COLOR:	

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí

(http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular)

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
14183900013830	 28/12/2019	 30/12/2019	 29/12/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	⊙ VIGENTE
14183900004010	 29/12/2018	 30/12/2018	 29/12/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	⊙ NO VIGENTE
37596470	 29/12/2017	 30/12/2017	 29/12/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	⊙ NO VIGENTE

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de gases (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
---------------	------------------	----------------	----------------	---------	------------------

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
REVISION TECNICO-MECANICO	 28/11/2019	 28/11/2020	CENTRO DE REVISIONES TECNOMECANICAS DEL META SAS	SI	144483401
REVISION TECNICO-MECANICO	 28/11/2018	 28/11/2019	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	138810750
REVISION TECNICO-MECANICO	 27/11/2017	 27/11/2018	CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR SEGURA	NO	133378982

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad



Garantías a Favor De



Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)



Consulta Automotores		Realizar otra consulta
Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.		
PLACA DEL VEHÍCULO:		
XIJ350		
NRO. DE LICENCIA DE TRÁNSITO:		
ESTADO DEL VEHÍCULO:		
TIPO DE SERVICIO:		
CLASE DE VEHÍCULO:		
Información general del vehículo		
MARCA:		
LÍNEA:		
MODELO:		
COLOR:		

REGRABACIÓN VIN (SI/NO):

NRO. REGRABACIÓN VIN

VEHÍCULO ENSEÑANZA (SI/NO):

PUERTAS:

Para conocer el historial de propietarios

Consulte el Histórico Vehicular Aquí<http://www.runt.com.co/ciudadano/consulta-historico-vehicular>

Datos Técnicos del Vehículo

Poliza SOAT

Número de poliza	Fecha expedición	Fecha inicio de vigencia	Fecha fin de vigencia	Entidad expide SOAT	Estado
13819800013140	 11/10/2019	 12/10/2019	 11/10/2020	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	⊙ VIGENTE
40164717	 10/10/2018	 11/10/2018	 10/10/2019	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	⊙ NO VIGENTE
37066403	 03/08/2017	 04/08/2017	 03/08/2018	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	⊙ NO VIGENTE

 Pólizas de Responsabilidad Civil

Certificado de revisión técnico mecánica y de gases (RTM)

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
---------------	------------------	----------------	----------------	---------	------------------

17/11/2020

Consulta Ciudadano - RUNT

Tipo Revisión	Fecha Expedición	Fecha Vigencia	CDA expide RTM	Vigente	Nro. certificado
REVISION TECNICO-MECANICO	 24/11/2019	 24/11/2020	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	SI	144427004
REVISION TECNICO-MECANICO	 29/08/2017	 29/08/2018	CENTRO MOTOR AVENIDA BOYACA	NO	132153887
REVISION TECNICO-MECANICO	 12/02/2016	 12/02/2017	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR LA VICTORIA	NO	124433614

Certificados de revisión técnico Ambiental o de Enseñanza

Información Blindaje

Certificado de revisión de la DIJIN

Certificado de desintegración física

Compromiso de desintegración física total y Pólizas de Caución

Tarjeta de Operación

Limitaciones a la Propiedad

 Garantías a Favor De

☒ Garantías Mobiliarias (Registro de la garantía en el RNGM por parte de RUNT / Registro del levantamiento a través del RNGM en el RUNT)

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTY. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 05. COPIA PRORROGA COI

2504

		SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE BAJO EL ESTÁNDAR NIPO				PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE				Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)				VERSIÓN: 1.0					
CÓDIGO: PM02-PR01-F04		COI No. 04 ENERO 23 DE 2020 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD														SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO			
1713	CUADRANTE: 17m AL ORIENTE DE LA KR 110 Y 77m AL OCCIDENTE DE LA KR 118 ENTRÉ CL 80 Y 150m AL NORTE		CONSORCIO JUAN AMARILLO JMC	24-ene-20	27-feb-20	09:00-18:00	09:00-18:00	ORD-3042- 2019	NOTA: 1. LA PRESENTE AUTORIZACION NO EXIME AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE HORARIOS PARA LA DEMOLICION, CONSTRUCCION O REPARACION POR OBRAS SEGUN LA NORMATIVIDAD VIGENTE. LA SOM AUTORIZA RETROALIMENTACION No. 1 AL PMT AUTORIZADO EN EL COI 43-20 - NUMERAL 40180, PARA CERRER PARCIAL DE ZONA VERDE PARA OBRAS DE CONSTRUCCION DE PARQUE JUAN AMARILLO (CÓDIGO ORD No. 10-171), IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE OHTA, GARANTIZAR EL ADECUADO MANEJO DE PEATONES CON EL PERSONAL ASABERADO PROPUESTO, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SENDERO PEATONAL DE MÍNIMO 1,8m SEGURO Y CÓMODO PARA SU USO EN LOS COSTADOS DE LA ZONA DE OBRA, LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, LAS ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SE DEBEN REALIZAR AL INTERIOR DE CADA ZONA DE OBRA, LA SEÑALIZACION DEBE PERMANECER TODO EL TIEMPO QUE DURE LA INTERVENCIÓN.				SI	ENQATIVA	TATIANA A. CUEPONES R.	7803-2020			
1714	CUADRANTE HOR "KR 17A ESTE"	CUADRANTE HOR "KV 19C ESTE"	CONSORCIO MALLA VAL'88C	24-ene-20	27-feb-20	09:00-18:00	09:00-18:00	ORD-3042- 2019	LA SOM AUTORIZA PROHIBICIÓN DE TRANSITO Y/O AUTORIZADO EN EL COI 43-19 "NUMERAL 46182 PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE VIA PEATONAL, DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE "ASEGURADA" CON "POLISOMERIA" PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUTOLIBRES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LONGITUDINALES Y TRANSVERSALIZADA LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE "RAMPAS" Y/O "ESCALERAS" QUE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES, GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLATONES DE MADERA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRIMIENTO PROPUESTO, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VÍA NI FORMACIÓN DE COLAS CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CERRIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN APROBADA.				SI	ENQ CERRADO	RODRIGO MARRAÑEN	7803-2020			
1715	CUADRANTE HOR "CL 41 SUR"	CUADRANTE HOR "KV 19C SUR"	CONSORCIO MALLA VAL'88C	24-ene-20	27-feb-20	09:00-18:00	09:00-18:00	ORD-3042- 2019	LA SOM AUTORIZA PROHIBICIÓN DE TRANSITO Y/O AUTORIZADO EN EL COI 43-19 "NUMERAL 46182 PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE VIA PEATONAL, DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE "ASEGURADA" CON "POLISOMERIA" PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUTOLIBRES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LONGITUDINALES Y TRANSVERSALIZADA LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE "RAMPAS" Y/O "ESCALERAS" QUE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES, GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLATONES DE MADERA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRIMIENTO PROPUESTO, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VÍA NI FORMACIÓN DE COLAS CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CERRIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN APROBADA.				SI	ENQ CERRADO	RODRIGO MARRAÑEN	7803-2020			
1716	CUADRANTE HOR "CL 41 SUR"	CUADRANTE HOR "KV 19C SUR"	CONSORCIO MALLA VAL'88C	24-ene-20	27-feb-20	09:00-18:00	09:00-18:00	ORD-3042- 2019	LA SOM AUTORIZA PROHIBICIÓN DE TRANSITO Y/O AUTORIZADO EN EL COI 43-19 "NUMERAL 46182 PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCION DE VIA PEATONAL, DEBE IMPLEMENTAR Y MANTENER EN TODO MOMENTO LA SEÑALIZACION PROPUESTA Y APROBADA EN BUEN ESTADO, LA ZONA DE OBRA DEBE ESTAR PERMANENTEMENTE "ASEGURADA" CON "POLISOMERIA" PARA GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS AUTOLIBRES DE TRANSITO PARA CONTROLAR EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL, IMPLEMENTAR Y GARANTIZAR SENDERO PEATONAL LONGITUDINALES Y TRANSVERSALIZADA LA OBRA, ESTO INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE "RAMPAS" Y/O "ESCALERAS" QUE GARANTICEN CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LOS PEATONES, GARANTIZAR EL ACCESO SEGURO A LOS PREDIOS MEDIANTE PLATONES DE MADERA, LA MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA DEBEN PERMANECER EN TODO MOMENTO DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, NO SE AUTORIZA ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE FUERA DEL CERRIMIENTO PROPUESTO, NO SE AUTORIZA PARQUEO DE VEHICULOS EN VÍA NI FORMACIÓN DE COLAS CUANDO FINALICE LA OBRA, SE DEBE RETIRAR EN SU TOTALIDAD EL CERRIMIENTO Y LA SEÑALIZACIÓN APROBADA.				SI	ENQ CERRADO	RODRIGO MARRAÑEN	7803-2020			

NORMATIVIDAD

El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) es responsable de la calidad de los servicios que se ofrecen en el sistema, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. SERVICIO PÚBLICO

Regla Ley 789 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre", Artículos 65-66-75-76-101-102-103-104-105-113-114-115-118-127-131.

B. EXCEPCIONES PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 026 del 10 de febrero 2008 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

Decreto 573 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 171 y 300 de 2012"

Decreto 520 de noviembre 13 2013 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

Decreto 690 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2013, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones"

NOTA

1. En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plan de PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.

2. No se permite el uso de escombreros o materiales por tierra en la zona de obra.

3. El contratista y la interventoría son responsables solidariamente de la correcta implementación del PMT.

4. En los casos en los que existan condiciones excepcionales en las que se genere la necesidad de señalización adicional se deberá solicitar la autorización de señalización adicional en el Concepto Técnico 17 de la SDM.

5. Para intervenciones con profundidad superior a 0,5m, deberán utilizarse y/o colocarse mediante métodos seguros y adecuados.

6. En caso de congestión vehicular por obra de la Policía de Tránsito, deberá intervenir el plan de tránsito y seguridad vial.

7. La señalización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el manual de señalización vial vigente.

8. La longitud de transición a implementar para plan de obra deberá cumplir las especificaciones técnicas establecidas en el Concepto Técnico 18 de la SDM.

Ing. Marcela Neira Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V1.0

Página 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Bayona Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 30 de 137

 GOBIERNO DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y MOVILIDAD Secretaría del Área 200														SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR ISO 9001 PROCESO GESTIÓN DE TRÁNSITO Y CONTROL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Reporte Consolidado de Obras de Infraestructura (COI)													
CÓDIGO: PM02-PR01-F04														VERSIÓN: 1.0													
COI No. 04 ENERO 23 DE 2020 SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD SECCIÓN 2. OBRAS DE MEDIO Y BAJO IMPACTO - SUBDIRECCIÓN DE PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO																											
DIRECCIÓN DE LA OBRA			CONTRATISTA	FECHA		HORARIO DE TRABAJO	HORARIO DE CIERRE	Nº CONTRATO	OBSERVACIONES	AUTORIZADO	LOCALIDAD	Nº RESPONSABLE	Nº RADICADO														
Nº	INICIO	FIN		INICIO	FIN																						
1717	DO 4886 SUR CL 100 ESTE	DO 4886 SUR CL 4886 SUR	CONSORCIO MALLA VIAL 280	24-ene-20	23-ene-20	10:00-18:00	24 HORAS	FDLSC-340- 2019	LA BDM AUTORIZA PROHIBIR EL CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 48-19 - NUMERAL 8022, PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL, DEBE GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA PRESENCIA DE LOS BANDEREROS PROPUESTOS, SEÑALIZACIÓN DE OBRA Y DE DESVÍOS, BARRICADAS Y CERRES DEBEN PERMANECER LAS 24 HORAS MIENTRAS DURE LA INTERVENCIÓN. NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN ANDECHES, MANTENER EN TODO MOMENTO ABIERTA LA ZONA DE OBRA. NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN INTERSECCIONES, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO EL ACCESO Y SALIDA A LOS RESIDENTES Y COMERCIANTES DEL SECTOR, GARANTIZAR SEÑEROS PEATONALES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES A LA OBRA. NO SE AUTORIZA POR NINGUN MOTIVO EL PARQUEO DE MAQUINARIA O ACTIVIDAD DE CARQUE Y DESCARQUE DE MATERIALES FUERA DEL CERRAMIENTO DE OBRA. NO SE AUTORIZA GENERACIÓN DE FILAS DE VOLQUETAS EN ESPERA DE INGRESAR A LA OBRA, DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA.	SI	SAN CRISTÓBAL	MIQUELTA SUAREZ N.	8953-2020														
1719	CL 4886 SUR 200 AL OCCIDENTE DE LA DO 4886 SUR		CONSORCIO MALLA VIAL 280	24-ene-20	23-ene-20	10:00-18:00	10:00-18:00	FDLSC-340- 2019	LA BDM AUTORIZA PROHIBIR EL CONFORME A LO AUTORIZADO EN EL COI 48-19 - NUMERAL 8022, PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE CARQUE Y DESCARQUE, IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y APROBADA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, REALIZAR CERRAMIENTO CON DELINEADORES TUBULARES Y TRIPLE CINTA, NO SE AUTORIZA GENERACIÓN DE FILAS DE VEHÍCULOS SOBRE LAS VÍAS, SE AUTORIZA EL PARQUEO DE MÁXIMO UN (1) VEHÍCULO, EL ESTACIONAMIENTO SE AUTORIZA POR UN TIEMPO MÁXIMO DE SESENTA (60) MINUTOS, LAS VÍAS UTILIZADAS PARA EL TRÁNSITO DE VOLQUETAS DEBEN DEJARSE EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS ENCONTRADAS Y SE DEBE REALIZAR LIMPIEZA CONSTANTE A LAS MISMAS, NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN ANDECHES NI DE CALZADA, NO SE AUTORIZA EL USO DE ANDECHES COMO ZONA DE ACOPIO DE MATERIAL, DEBE GARANTIZAR LA PRESENCIA DE AUXILIARES DE TRÁNSITO PARA EL CONTROL DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR, DEBE ACATAR EN TODO MOMENTO LO DISPUESTO EN LA NORMATIVA PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE CARGA, UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE CARQUE Y DESCARQUE SE DEBE HABILITAR LA CALZADA EN CONDICIONES SEGURAS DE MOVILIDAD, CUANDO FINALICE LA OBRA, EN SU TOTALIDAD SE DEBE REMOVER LA SEÑALIZACIÓN Y EL CERRAMIENTO.	SI	SAN CRISTÓBAL	MIQUELTA SUAREZ N.	8953-2020														
1719	KR 22 CL 108	KR 22 DO 108	CONSORCIO MALLA VIAL USAQUEEN	23-ene-20	19-mar-20	LUNES A SABADO 07:00-18:00	24 HORAS	FDLSC-140- 2019	LA BDM AUTORIZA PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN VIAL, DEBE IMPLEMENTAR TODA LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA Y MANTENERLA EN BUEN ESTADO, NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN INTERSECCIONES, DEBE CONTAR CON PERSONAL ABANDERADO PARA COORDINAR EL PASO DE PEATONES Y VEHÍCULOS, EL PERSONAL ABANDERADO DEBE PERMANECER EL MISMO TIEMPO QUE DURE EL CERRAMIENTO, NO SE AUTORIZA INTERVENCIÓN EN ANDECHES, GARANTIZAR EN TODO MOMENTO SEÑEROS PEATONALES DE MÍNIMO 1,5m, SEGURO Y CÓMODO PARA SU USO, LA ACTIVIDAD DE CARQUE Y DESCARQUE DEBE REALIZARSE DENTRO DE LA ZONA DE OBRA, GARANTIZAR LA TOTAL IMPLEMENTACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN PROPUESTA, GARANTIZAR ACCESO Y SALIDA PEATONAL Y VEHICULAR SEGURO A LOS RESIDENTES Y USUARIOS DEL SECTOR, EN AFECTACIÓN A GARAJES COORDINAR CON LA COMUNIDAD EL INGRESO Y SALIDA DE VEHÍCULOS DE LOS GARAJES, LA MAQUINARIA Y EL EQUIPO UTILIZADO DEBEN PERMANECER DENTRO DE LA ZONA DE OBRA.	SI	USAQUEEN	SANDRA L. CARDENAS P.	10005-2020 10097-2020														
1720	DO 89 KR 117	DO 89 KR 118	CONSORCIO MI 230	-	-	-	-	FDLSC-230- 2019	LA BDM NO AUTORIZA PMT PARA CERRER TOTAL DE CALZADA PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN VIAL, TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE ATENDIERON LAS OBSERVACIONES ENVIADAS AL CORREO ELECTRONICO EL 21-ENE-20. 1. ACLARAR TODA VEZ QUE LA DIRECCIÓN REPORTADA EN EL FORMATO NO FUE POSIBLE UBICARLA. 2. PRESENTAR ACTAS DE SOCIALIZACIÓN CON TODOS LOS PREDIOS AFECTADOS POR LA INTERVENCIÓN, DONDE SE EVIDENCIE EL CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, OBRAS A REALIZAR, MEDIDAS DE CONTINGENCIA A IMPLEMENTAR, DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, FECHAS TENTATIVAS DE INICIO DEL CIERRE Y HORARIOS DE INTERVENCIÓN. 3. DEBE PRESENTAR PROPUESTA DE DESVÍO TANTO PARA PARA TRANSPORTE PÚBLICO COMO PARA PARTICULAR, CONTEMPLANDO TODAS LAS RUTAS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y PARADEROS AFECTADOS POR EL CIERRE.	NO	ENIGATIVA	TATIANA A. CRUENTES R.	9705-2020														
1721	CL 725 KR 101	CL 725 KR 103	CONSORCIO MI 230	-	-	-	-	FDLSC-230- 2019	LA BDM DA POR TERMINADO EL PMT AUTORIZADO EN EL COI 61-19 - NUMERAL 5359, POR SOLICITUD DIRECTA DEL CONTRATISTA POR MEDIO DEL RADICADO BDM-8704-20.	TERMINADO	ENIGATIVA	CAROLINA RUEVARA O.	9704-2020														

NORMATIVIDAD

El plan de manejo de tránsito (PMT) debe cumplir con lo establecido en el manual de señalización vial vigente.

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) le recuerda que la calidad de controlada no le exime, en ningún caso, del cumplimiento de la normatividad que rige a todos los habitantes del Distrito Capital, principalmente la reglamentación que rige la utilización del espacio público, la circulación de vehículos dentro del perímetro urbano, el manejo de tránsito y seguridad para peatones por la ejecución de obras civiles.

A. ESPACIO PÚBLICO

Según Ley 769 de 2002 "Código Nacional de Tránsito Terrestre", Artículos 65-69-76-78-101-102-103-104-109-112-114-115-119-127-131.

B. RESTRICCIÓN PARA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

Decreto 034 del 05 de febrero 2001 "Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

Decreto 573 del 17 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 300 de 2012".

Decreto 520 de noviembre 13 2012 "Por el cual se establecen restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

Decreto 650 del 31 de diciembre de 2013 "Por medio del cual se modifica el Decreto 520 de 2012, que establece restricciones y condiciones para el tránsito de los vehículos de transporte de carga en el área urbana del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones".

NOTA

- En el lugar de desarrollo de las actividades deberá permanecer copia del plano del PMT aprobado y de la autorización emitida por la SDM para la verificación por parte de las autoridades competentes del cumplimiento a la implementación del PMT.
- No se autoriza acopio de escombros o materiales por fuera de la zona de obra.
- El controlador y la interventoría son responsables conjuntamente de la correcta implementación del PMT.
- En todas las reuniones y/o cuando las condiciones atmosféricas lo permitan se debe garantizar la instalación de señalización luminosa conforme las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 17 de la SDM.
- Para espedientes con prioridad superior a 9.0m, deberán instalarse y mantenerse durante todo el proceso de ejecución.
- En caso de circulación vehicular por cualquier espacio de la Policía de Tránsito, deberá tenerse en cuenta la instalación de señalización vial.
- La autorización a implementar debe cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el manual de señalización vial vigente.
- La longitud de tránsito a implementar para obras de obra deberá cumplir las especificaciones técnicas estipuladas en el Concepto Técnico 14 de la SDM.

Ing. Marcela Peña Medina
Directora de Ingeniería de Tránsito

PM02-PR01-F04 V1.0

Página 2 de 2

Ing. Martha Cecilia Beyer Gómez
Subdirectora Técnica de Planes de Manejo de Tránsito

Página 31 de 137

25052806

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> <i>340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> <i>2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 06. RELACIÓN DE PERSONAL, PLANILLA Y AFILIACIONES

2602
2506

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-343-2011 - FOLSC		OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".										RELACION DE PERSONAL INFORME # 05	
NTT: 901.310.904-1		CONTRATO: COP-340 - 2019											
LISTADO DE PERSONAL													
No.	CONTRATO	CONTRATISTA RESPONSABLE ANTE EL FOLSC	CONTRATISTA PLANILLA	CARGO	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOVEDAD		PERIODO COTIZADO		A.R.L
									ING	RET	AFP, ARL, CCF, GENA, ICBF.	SALUD	
PERSONAL ANTIGUO													
ADMINISTRATIVO													
1	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	INDEPENDIENTE	Representante legal	19.498.117	Oliverio Bonilla Hoyos	1 de septiembre de 2019						COLPATRIA
2	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	Residente civil	79.656.054	Nelson Orlando Neme Perez	14 de septiembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
3	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	Residente Ambiental y SST	3.135.316	Jhon Edwin Serrano Valencia	14 de septiembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
4	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	Profesional Social	52.738.966	Nini Johanna Baquero Torres	14 de septiembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
5	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	Auxiliar de Ingeniería	1.023.949.852	Robert Steven Botafios Aponso	3 de octubre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
6	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	Auxiliar Social	2.230.744	Manuel Guillermo Fajal Raquelo	20 de noviembre de 2018				dic-19	ene-20	COLPATRIA
7	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BOAL	1.023.949.712	Angel David Orjuela Chaparro	22 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
8	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BOAL	1.023.938.170	Cristian Camilo Pabon H.	22 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
9	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BOAL	1.023.918.170	Cristian Camilo Poveda	22 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
10	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BOAL	51.807.391	Graciela Molina	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
PERSONAL OPERATIVO													
11	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	19.181.504	Cristobal Sosa Sosa	20 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
12	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	79.257.841	Eugenio Garcia Cuam	20 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
13	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Maestro	5.888.112	Cesar Augusto Castro	28 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
14	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Maestro	11.481.296	Julio Cesar Vasquez	28 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
15	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	4.112.977	Jairo Barrera Velandia	28 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
16	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	84.049.759	Manuel de Jesus Villa	28 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
17	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Inspector	79.910.545	Edgar Galvis	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
18	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	86.039.763	Victor Manuel Delgado	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
19	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.101.814.949	Javier Jimenez Bohorquez	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
20	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	1.069.053.849	Yomey Escobar	11 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
21	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.012.401.548	Blayron Andres Gutierrez	18 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
22	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	1.047.238.519	Julio Cesar Lopez Caballero	16 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
23	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	79.944.601	Jorge Alirio Pardo	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA
24	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Ayudante	93.344.748	Eder Yate	6 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
25	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Ayudante	17.701.352	Alvaro Camecho	6 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
26	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Ayudante	80.813.952	Yelson Yair Rodriguez	6 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
27	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Ayudante	4.351.434	Luis Alberto Ries	9 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
28	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Oficial	5.837.326	Pablo Emilio Rungo Zambrano	16 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
29	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	ARABA	Operador Vibro-	27.142.077	Cesar Pita	29 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	POSITIVA

4/12



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FOLIO

NIT: 901.310.904-1

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

CONTRATO: COP-340 - 2019

RELACION DE
PERSONAL
INFORME # 05

LISTADO DE PERSONAL

No.	CONTRATO	CONTRATISTA RESPONSABLE ANTE EL FOLIO	CONTRATISTA PLANILLA	CARGO	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO	NOVEDAD		PERIODO COTIZADO		A.R.L.
									ING	RET	AFP, ARL, CCF, SENA, ICBF.	SALUD	
PERSONAL OPERATIVO - TOPOGRAFIA													
30	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BUTRAGO TOPOGRAFOS SAS	Topografo 1	1.022.929.116	Luis Ariel Butrago	25 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
31	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BUTRAGO TOPOGRAFOS SAS	Cadenero	79.815.085	Clemente Gómez Miranda	25 de noviembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
32	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BUTRAGO TOPOGRAFOS SAS	Topografo	1.019.087.720	Luis Alejandro Montaña	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
33	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BUTRAGO TOPOGRAFOS SAS	Cadenero	79.890.907	Carlos Vladimir Rodriguez	2 de diciembre de 2019				dic-19	ene-20	COLPATRIA
PERSONAL NUEVO													
PERSONAL NUEVO ADMINISTRATIVO													
34	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	BOAL	1.023.979.387	Frank Martinez	20 de diciembre de 2019		X		Afiliacion	Afiliacion	COLPATRIA
PERSONAL NUEVO OPERATIVO													
35	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	M 943935711061978	Roque Rufino Hernandez	10 de enero de 2020		X		dic-19	ene-20	POSITIVA
36	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	83.412.459	Jhon Fredy Gomez	10 de enero de 2020		X		Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
37	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	79.829.391	Elver Ernesto Rodriguez	14 de enero de 2020		X		Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
38	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.105.616.200	Jesison Fernando Gomez	16 de enero de 2020		X		Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
39	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	18.969.178	Luis Miguel Herrera Collante	20 de enero de 2020		X		Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
40	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	ARABA	Operador	1.010.010.098	Angel Espitia Quintero	15 de enero de 2020		X		Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
41	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	MACONSAMERICA LTDA	Operador	79.994.664	Milton Avila Poloche	11 de enero de 2020		X		dic-19	ene-20	SURA
NOVEDADES - RETIRO													
42	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	7.354.613	Higinio Contreras Fabra	28 de noviembre de 2019	10/01/20		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
43	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	ARABA	Operador Retro-	79.249.326	Edgar Daza Campos	7 de diciembre de 2019	14/01/20		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
44	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	MACONSAMERICA LTDA	Operador Man-	1.096.226.451	Ludwing Alberto Caballero	11 de diciembre de 2019	09/01/20		X	dic-19	ene-20	SURA
45	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	INJAGART SAS	Operador Retro-	1.077.085.266	Ivan Dario Casallas	10 de diciembre de 2019	18/01/20		X	nov-19	dic-19	SURA
46	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	80.275.821	Jose Perez Cetina	20 de noviembre de 2019	30/12/19		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
47	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	952.331.418.041.978	Jairo Antonio Perez	2 de diciembre de 2019	20/01/20		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
48	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.000.783.424	Robinson Delgado Moreno	28 de noviembre de 2019	11/01/20		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
49	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	80.322.923	Gustavo Hernan Vasquez	28 de noviembre de 2019	11/01/20		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
50	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.002.425.331	Luis Alfonso Carpio	29 de noviembre de 2019	11/01/20		X	dic-19	ene-20	POSITIVA
51	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.002.300.402	Antonio Barrera carrero	29 de noviembre de 2019	30/12/19		X	nov-19	dic-19	POSITIVA
52	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Oficial	7.527.170	Carlos Cabrera	6 de diciembre de 2019	11/01/20		X	Afiliacion	Afiliacion	COLPATRIA
53	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	CONSTRUCCIONES JFC SAS	Oficial	19.373.555	Hector Jesus Rodriguez	6 de diciembre de 2019	30/12/19		X	Afiliacion	Afiliacion	COLPATRIA
NOVEDADES - INGRESO - RETIRO													
54	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.005.670.912	Harold Dayan Ortiz	9 de enero de 2020	14/01/20	X	X	Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
55	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Ayudante	1.013.645.872	David Yezid Peña	15 de enero de 2020	16/01/20	X	X	Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA
56	340-2019	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	Oficial	1.028.023.929	Tecobaldo Barrera Toro	17 de enero de 2020	25/01/20	X	X	Afiliacion	Afiliacion	POSITIVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901310904
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	DIAGONAL 182 #20-91 OF 255 C TELÉFONO:	4740067
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7740529446	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2019	AÑO: 2020
DÍAS DE MORA:	4	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/01/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		544785158

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	2	\$ 281.400
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	3	\$ 577.800
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 132.900
800224808	230301	230301-PORVENIR	5	\$ 1.416.600
SUBTOTAL:			11	\$ 2.388.700
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830003584	EPS017	EPS017-FAMISANAR	2	\$ 112.500
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 100.300
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	3	\$ 77.600
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	\$ 33.300
900298372	EPSC34	EPSC34-CAPITAL SALUD EPS	1	\$ 33.300
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	2	\$ 200.600
901097473	EPS044	EPS044-MEDIMÁS	1	\$ 40.200
SUBTOTAL:			11	\$ 597.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	CCF24	CCF24-COMPENSAR	11	\$ 597.800
SUBTOTAL:			11	\$ 597.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860002183	14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11	\$ 807.000
SUBTOTAL:			11	\$ 807.000

TOTAL PAGADO: \$ 4.391.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900678572-0	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO		CLL 100 57-78 DE 402	6272803	TRAMITACIONES@SEGURIDAD SOCIAL@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MPYME	SAN CRISTOBAL	01	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA A SOCIEDAD	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS UPC
2020-01	2019-12	E	21/01/2020	40083371	21 0
					TOTAL A PAGAR
					\$3.033.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Afiliados	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP6002	Salud Total EPS	800130807-4	183.000	0		0		0	1	200	0	184.100	10
EP9005	Servicio EPS	800251440-6	35.500	0		0		0	1	100	0	35.600	2
EP5006	Compensar EPS	800008942-7	2.300	0		0		0	1	100	0	2.400	1
EP6010	EPS Sur	800088702-2	33.200	0		0		0	1	100	0	33.300	1
EP6015	Compensar EPS	805000427-1	35.500	0		0		0	1	100	0	35.600	2
EP5017	Facturas EPS	830003564-7	33.200	0		0		0	1	100	0	33.300	1
EP5037	Nueva EPS	800150264-0	54.200	0		0		0	1	100	0	54.300	27
EP5041	NUEVA E.P.B. S.A. MOV.	800150264-2	2.300	0		0		0	1	100	0	2.400	1
ESS007	EPS-6 Mutual Ser	806006364-7	2.300	0		0		0	1	100	0	2.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Otros Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (RIG + Proteccion)	800229730-9	274.100	0	0	0	0	1	200	0	274.300	5
230301	Pension	800224808-6	733.500	0	0	0	0	1	600	0	734.100	8
231001	Ceifandos	800227949-0	282.800	0	0	0	0	1	300	0	283.100	4
25-14	Colaboraciones	920336004-7	273.900	0	0	0	0	1	200	0	274.100	3

TOTALES RIESGOS LABORALES													
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad
				No. Autorización	Valor								
14-23	Positiva Segura	800011153-0	581.700				581.700	1	500	581.600	1	5.814	581.800

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF74	Compensar Caja	800006694-2-7	392.100	1	100	392.200	21

2508

2609



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
N	900578372-6	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO		CLL 105 57-78 OF 402	6272603	TRAMITACIONESSEGURIDAD SOCIAL@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	C - MPYME	BAN CRISTOBAL	01	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				21
					D
					TOTAL A PAGAR
2020-01	2019-12	E	21/01/2020	43093371	\$3 033 800

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Atributos
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEVA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	392.400	393.400
Penalón	4	1.504.900	1.505.000
Riesgos Laborales	1	681.400	681.800
CCF	1	392.400	392.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	15	3 030.500	3 033 800

PAGADA

244

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	HOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
H	900785724	SOLICITANTES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO	CLL 105 97-75 OF 402
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	HOMBRE APORTANTE	DEPARTAMENTO
SUCURSAL	C - MPYME	SAN CRISTOBAL	BOGOTÁ D.C.
CORREO		TRANSMISIÓN DE ASESORIA SOCIAL	
EJECUTIVO PAGO PARAFISCALES Y SALUD		BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (04/05/2012)	TIPO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PAGO	FECHA PAGO (04/05/2012)	NÚMERO PLANILLA
2012-01	2012-12	E	40093371
TOTAL A PAGAR			\$1.003.000

DETALLE POR COTIZANTE

No. Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	INFORMACIÓN GENERAL												INFORMACIÓN LABORAL												PARAFISCALES			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Cód. APT	Cál. APT	Cál. EPS	Cál. EPS	Cál. APT	Cál. EPS	Cál. APT	Cál. EPS	Cál. APT	Cál. EPS	Cál. APT	Cál. EPS	Cál. APT	Cál. EPS	Cál. APT	Cál. EPS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
1	OC	DELCADO MONTANO RODRIGUEZ MARTEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
2	OC	REFRANDEZ CARPIO LUIS ALFONSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
3	OC	OUTIERREZ RODRIGUEZ ANTONIO ANTONIO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
4	OC	LOPEZ CARRASQUIN RODRIGUEZ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
5	OC	ECHEVERRIA JACQUELINE TORRES	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
6	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
7	OC	VARELA RODRIGUEZ JACQUELINE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
8	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
9	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
10	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
11	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
12	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
13	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
14	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
15	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
16	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
17	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
18	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
19	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
20	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008
21	OC	ARMSTRONG RODRIGUEZ JORGE EDUARDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008	2008

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
M	900079719-3	Guillermo Ballester Ortiz	Calle 100 No 19 81 of 505	6361847	ARABASAS@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ONCA	C - USPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO A SOCIAO (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAOS 6 UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-01	2019-12	E		3065864	\$1.485.300

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EP8002	Salud Total EPS	800130007-4	36.700	0		0		0	0	0	0	36.700	1
EP8005	Salud EPS	800251440-6	43.000	0		0		0	0	0	0	43.000	1
EP8008	Compensar EPS	800000942-7	36.000	0		0		0	0	0	0	36.000	1
EP8017	Familianar EPS	830003564-7	45.700	0		0		0	0	0	0	45.700	2
EP8037	Nueva EPS	800158264-2	43.000	0		0		0	0	0	0	43.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (RIG - Protección)	800229730-0	486.700	0	0	0	0	0	0	0	486.700	3
231001	Colfondos	800227940-6	330.700	0	0	0	0	0	0	0	330.700	3

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NTI	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	289.100				289.100	0	0	289.100			2.881	289.100	6

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	800099942-7	199.400	0	0	199.400	6


TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, RP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	199.400	199.400
Pensión	2	797.400	797.400
Riesgos Laborales	1	289.100	289.100
CCF	1	199.400	199.400
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	1.485.300	1.485.300

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	000978719-3	Gustavo Barrón Ortiz		Calle 100 No 19 81 of 505	8351847	ARABASAS@HOTMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C - MPYME			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLAZADOS UPE
					5 0
PORRANGO SALUD	PORRANGO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-01	2018-12	E		39858964	\$1.485.300

DETALLE POR COTIZANTE																																									
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN EMPLEADOR										PENSION					SALUD		RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES							
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Grupos de Vida	Cód. AFP	BrC AFP	Cotización	Voluntario a AFB	Voluntario Aperturo	Fondo preestablecido de vejez/vejez	Fondo preestablecido de vejez/vejez	Cód. EPS	BrC EPS	Cotización de Valor UPC	Cód. APL	BrC APL	Grupos de Vida	Cotización	Código CCF	BrC CCF	Aporte CCF	BrC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICSP	Aporte EAP	Aporte RETA
1	CC	9223383080	VELASQUEZ RODRIGUEZ LEON MARYURY	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271001	900.000	144.000	0	0	0	0	EP0008	900.000	36.800	14-25	800.800	1	4.700	CCF24	900.000	36.800	0	0	0	0	0
2	CC	1004803181	SECERRA GALINDO PABLO ALFONSO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231001	188.867	26.700	0	0	0	0	EP0017	188.867	8.700	14-25	188.867	5	11.700	CCF24	188.867	8.700	0	0	0	0	0	
3	CC	1075225296	SARDINO AVILES JOSE ESTEBAN	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731001	1.800.000	189.000	0	0	0	0	EP0057	1.800.000	40.600	14-25	1.800.800	5	89.600	CCF24	1.800.000	40.000	0	0	0	0	0	
4	CC	79248329	GAZA CAMPOS EDGAR ARMANDO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732001	916.867	166.700	0	0	0	0	EP0003	916.867	36.700	14-25	916.867	5	63.800	CCF24	916.867	36.700	0	0	0	0	0	
5	CC	7949629	FORERO LARA JAVIER ALEJANDRO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230001	1.800.000	189.000	0	0	0	0	EP0017	1.800.000	40.800	14-25	1.800.800	5	89.600	CCF24	1.800.000	40.000	0	0	0	0	0	
6	PE	84964201111	MENA PEREZ CESAR DANIEL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230001	1.800.800	189.000	0	0	0	0	EP0001	1.800.800	40.800	14-25	1.800.000	1	89.600	CCF24	1.800.000	40.000	0	0	0	0	0	



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

677

C-EN RECAUDOS
2020
54813806

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO DE IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CIUDADANÍA (PAÍS): DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, PENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CRA 15 NO 94-13 OF 108 TELÉFONO: 01-4576400 CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONÓMICA: ÚNICO			CÓDIGO PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: DEAS DE MORA: FECHA PAGO (AAAA-MM-DD):		MES: AÑO: 7741512881 TIPO DE PLANILLA: 2018 PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2020CIVIL NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES	MORA
010001	PROYECTO PROYECTO (PROYECTO)	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010002	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010003	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010004	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010005	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
SUB-TOTALES:													

ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES	MORA
010001	PROYECTO PROYECTO (PROYECTO)	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010002	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010003	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010004	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010005	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
SUB-TOTALES:													

ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES	MORA
010001	PROYECTO PROYECTO (PROYECTO)	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010002	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010003	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010004	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010005	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
SUB-TOTALES:													


ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES	MORA
010001	PROYECTO PROYECTO (PROYECTO)	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010002	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010003	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010004	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010005	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
SUB-TOTALES:													

ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES	COTIZACIÓN	TOTAL APORTES A PENSIÓN				TOTAL APORTES A SALUD				TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE			APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES VOLUNTARIOS	APORTES OBLIGATORIOS	SOLIDARIDAD	PREPAGO	APORTES	MORA
010001	PROYECTO PROYECTO (PROYECTO)	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010002	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010003	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010004	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
010005	PROYECTO PROYECTO	1	1.174.700	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.174.700	0.0
SUB-TOTALES:													

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NTF	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900152840	NÚMERO PLANILLA:	7741512881	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Y RAZÓN SOCIAL:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL		DEPARTAMENTO DE BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:	1	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	2020
Ciudad/Municipio:	CRA 15 NO 99-13 OF 508		TELEFONO:	4787979	MES:	enero	AÑO:
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		BAJENOS DE 200 COTIZANTES	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/01/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	548130566
TIPO EMPRESA:	PRIVADA		ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y no reguladoras de la actividad			
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO						
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							
				SI			

[illegible]

TOTAL	\$ 3,808,900
--------------	---------------------



Planilla Pagada

2511 2612



PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2020-01-10 01:44:18 PM
 Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS
 Nombre Planilla: 102655569

Período Cotización: diciembre de 2019
 Período Servicio: enero de 2020

PAGADO 10/01/2020

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BUTRAGO TOPOGRAFOS SAS		
Documento	N900687576		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Dirección	CL 44B #57 A - 22
Tipo Persona	JURÍDICA	Teléfono	4582980
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Forma Presentación	UNICO
Representante Legal	BUTRAGO GOMEZ LUIS ARIEL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Total Afiliados	9	Identificación	CC 1022629116
		ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

TALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Fecha de Nacimiento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																																	
02-0000000	RODRIGUEZ FELIX ALBERTO	M	01/01/1975																					</												

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCIONES JFC SAS identificado(a) con NI 901123656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ALVARO CAMACHO identificado(a) con CC 17701352

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										Ing	ret	ide	tar	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lps	lms	vac	avp	vct	lri				vip
9402187405	554584440	E	2020-01-28	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	25	X																	\$890,067	4%	\$27,700
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	25	X																	\$890,067	18%	\$110,500
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	25	X																	\$890,067		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	25	X																	\$890,067		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	25	X																	\$0	0%	\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2019-12	25	X																	\$0	0%	\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	25	X																	\$890,067	6.95%	\$48,100
9402187405	554584440	E	2020-01-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	25	X																	\$890,067	4%	\$27,700

Este certificado se expide el día 2020-01-28 a las 08:31.

Se certifica que CONSTRUCCIONES JFC SAS identificado(a) con NI 901123656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para EDER YATE COLO identificado(a) con CC 93344746

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										Ing	ret	ede	luc	tdp	lap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	lri				vip
9402187405	554584440	E	2020-01-28	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	25	X																	\$690,097	4%	\$27,700
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	25	X																	\$690,097	15%	\$110,500
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	25	X																	\$690,097		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	25-14	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	25	X																	\$690,097		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	25	X																	\$0	0%	\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFLADO	2019-12	25	X																	\$0	0%	\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	25	X																	\$690,097	8.95%	\$48,100
9402187405	554584440	E	2020-01-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	25	X																	\$690,097	4%	\$27,700

Este certificado se expide el día 2020-01-28 a las 08:33.

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCIONES JFC SAS identificado(a) con NI 901123656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para LUIS ALBERTO RIOS identificado(a) con CC 4351434

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	ide	cas	cap	cap	vip	cor	val	din	tp	lma	vde	avp	val	di				dp
9402187405	554584440	E	2020-01-28	EPS	EPS000	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	22	X																	\$607,286	4%	\$24,300
9402187405	554584440	E	2020-01-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	22	X																	\$607,286	6.96%	\$42,300
9402187405	554584440	E	2020-01-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	22	X																	\$607,286	4%	\$24,300

Este certificado se expide el día 2020-01-28 a las 08:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCIONES JFC SAS identificado(a) con NI 901123656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para PABLO EMILIO ÑUNGO ZAMBRANO identificado(a) con CC 5837326

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tdc	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp	tdp				tdp
9402187405	554584440	E	2020-01-28	EPS	EPS002	SALUD TOTAL	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	15	X																	\$414,058	4%	\$16,600
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	15	X																	\$414,058	16%	\$66,300
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	15	X																	\$414,058		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	15	X																	\$414,058		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	15	X																	\$0	0%	\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACION VOLUNTARIA AFILADO	2019-12	15	X																	\$0	0%	\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-12	15	X																	\$414,058	6.96%	\$28,900
9402187405	554584440	E	2020-01-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-12	15	X																	\$414,058	4%	\$16,600

Este certificado se expide el día 2020-01-28 a las 08:32.

Certificado de Aportes

Se certifica que CONSTRUCCIONES JFC SAS identificado(a) con NI 901123656 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para YEISON JAIR RODRIGUEZ CANTOR identificado(a) con CC 80813952

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	cto	inc	dep	exp	vcp	cop	vac	din	tp	lmp	vac	exp	vac	lil				qjp
9402187405	554584440	E	2020-01-28	EPS	EPSC34	CAPITAL SALUD	COTIZACION OBLIGATORIA	2020-01	25	x																	\$690,097	4%	\$27,700
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-12	25	x																	\$690,097	15%	\$110,500
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	25	x																	\$690,097		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	25	x																	\$690,097		\$0
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	25	x																\$0	0%	\$0	
9402187405	554584440	E	2020-01-28	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACION VOLUNTARIA AFILIADO	2019-12	25	x																\$0	0%	\$0	
9402187405	554584440	E	2020-01-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-12	25	x																\$690,097	6.96%	\$48,100	
9402187405	554584440	E	2020-01-28	CCF	CCF24	COMPENSAR	COTIZACION OBLIGATORIA	2019-12	25	x																\$690,097	4%	\$27,700	

Este certificado se expide el día 2020-01-28 a las 08:32.

**INGRESO EMPLEADO****DATOS DE LA EMPRESA**

Tipo de Identificación: NIT
Número de documento: 901310904
Número Afiliación: 265950
Razón social: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

DATOS DEL EMPLEADO:

Tipo de documento: CÉDULA
Número de Documento 1023979387
Nombre: FRANK ESTEBAN MARTINEZ
HERNANDEZ
Fecha Ingreso: 21/01/2020
Salario básico: 900.000
Nit empresa en misión: 0
Código Sucursal: 1
Centro de trabajo: 4210
Tasa: 6,960
Fecha hora transacción: 20/01/2020 09:28:37 a.m.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 19/12/2019

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorre@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMASQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	110	20/12/2019	M 943935711081976	HERNANDEZ GOMEZ ROQUE	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

0C58ED2E7EF6D9FD7B17199C2CCD3047

Certificado Impreso el día 12/19/2019 7:05:01 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA
ACCIDENTES LABORALES

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá: **6 000 811** Línea Nacional: **01 8000 941 541** Desde el celular: **#533**

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá: **786 838 07 55**

Llámenos por cobrar desde cualquier otro país: **+ (571) 743 01 06**

www.positiva.gov.co

POSITIVA
REPARACIÓN DE DAÑOS

ROQUE RUFINO

HERNANDEZ GOMEZ

943935711081976

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S
 900678572

Este carné es personal e intransferible

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

EFICIENCIA



FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Salud Total EPS-S

No de Radicación

4004555081

Fecha de Radicación

1/9/12/2019

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades ☐	2. Tipo de afiliación B. Colectiva ☐	A. Individual: - Cotizante Cabeza de familia ☒ - Beneficiario afiliado adicional ☐ B. De oficio ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	Código (a registrar por la EPS)	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres HERNANDEZ Primer apellido	GOMEZ Segundo apellido	ROQUE Primer nombre	RUFINO Segundo nombre
7. Tipo documento de identidad	8. Número del documento de identidad 943935711081976	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 11/10/81/1976

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos personales			
11. Etnia 6	12. Discapacidad Tipo ☒ Condición ☒	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		16. Administradora de Pensiones PORVENIR EPC	17. Ingreso base de cotización - IBC 828118
18. Residencia CL 45 77 55 Dirección BOGOTA Municipio/Distrito			
3456788 Teléfono fijo		556YTTFC@GMAIL.COM Correo electrónico	
BOGOTA Municipio/Distrito		BOGOTA Departamento	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres completos			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres			
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo ☐ Condición ☐
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

32. Datos de residencia

Municipio/Distrito	Zona Urbana ☐ Rural ☐	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS VS AMERICAS - UOD CPO AMERICAS	Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSAMERICAS - UODCPOAMER
B	
B	
B	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS	36. Tipo de identificación NIT	37. Número de documento de identificación 900678572	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
39. Ubicación CL 147 13 67 Dirección	6272803 Teléfono	F.CARDONA@SIDSAS.COM Correo electrónico	BOGOTA Municipio/distrito
			BOGOTA Departamento

25A-2018

No de Radicacion
4004555081

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado


VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de Identidad	Número documento de Identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha			
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		19/11/2019			
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			
Código: ☐							

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

	
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TL. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐

Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0

☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.

☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.

☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.

☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor

☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.

☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.

☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud

☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.

☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

56. Identificación de la Entidad Territorial		57. Datos del SISBEN		58. Fecha de radicación		59. Fecha de validación	
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel			
☐	☐	☐	☐	☐			
70. Datos funcionario que realiza la validación				71. Firma del funcionario			
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad						
☐							
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

253

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido HERNANDEZ	Segundo apellido (o de casada) GOMEZ	Primer nombre ROQUE	Segundo nombre RUFINO
No de identificación 943935711081976	Tipo de documento RG TI CC CE PA	Fecha de nacimiento 1976 08 11	Sexo X F
			Fecha diligenciamiento 2019 12 19

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? ☒ SI ☐ NO
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? ☒ SI ☐ NO
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? ☒ SI ☐ NO
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? ☒ SI ☐ NO
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? ☒ SI ☐ NO

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.


*Yo: ROQUE RUFINO HERNANDEZ GOMEZ identificado con el documento de identidad número: 943935711081976 ☒ SI ☐ NO autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante:

Roque Hernandez
www.saludtotal.com
Línea local en Bogotá 4854555
Línea gratuita de atención al cliente 018000114524
Síguenos en  Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no
es a medias
debe ser **total**

Salud Total



Huella digital
(en caso de no saber firmar)
F309-RVA V1.0-2013



Fondo de Pensiones Obligatorias

Solicitud de Vinculación o Traslado

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. NIT 800.144.331-3

Nº 21482704



21482704

2619
2518

Ciudad BOGOTÁ Fecha de Solicitud de Afiliación 2019/12/19

1. Tipo de Vinculación

Vinculación Inicial
Marque con X, si el solicitante va a cotizar por primera vez y no ha estado afiliado nunca a una AFP, Colpensiones o Caja y desea vincularse a Porvenir.
Pensiones Obligatorias ☒

Traslado de AFP
(Permanencia mínima de 6 meses en otra AFP)
Pensión Familiar ☐

Traslado de Régimen
(Marque con X si el solicitante ha estado vinculado al régimen de prima media en alguna entidad oficial, en Colpensiones o cajas durante más de 5 años y desea vincularse a Porvenir)
Entidad Origen Traslado ☐ Pensión Familiar ☐
Entidad Destino ☐

2. Datos Básicos

Tipo de Documento C.C. TI C.E. PAS R.C. CD N° de Documento de Identidad PE9439357 Fecha de Expedición del Documento de Identidad 2019.01.11 Lugar de Expedición BOGOTÁ Género M ☒ F ☐ Es Pensionado (Jubilado) ☐ SI ☒ NO ☐

Primer Apellido HERNANDEZ Segundo Apellido COTIEZ Primer Nombre RODOLFO Otros Nombres RODOLFO

Fecha de Nacimiento 1975.08.11 Lugar de Nacimiento BOGOTÁ Nacionalidad Colombiana Otra ¿Cuál? VENEZOLANO

3. Datos de Localización

Dirección de Residencia CALLE 106 # 5778 Barrio BOGOTÁ
Departamento BOGOTÁ N° de Teléfono Fijo 62772803 N° de Teléfono Celular 162772803 Autorización de Envío de Información a Través de Medios Electrónicos. Autorizo a Porvenir S.A. para enviar notificaciones, extractos y cualquier información de interés a mi correo electrónico y/o a mi teléfono celular. ☐ SI ☒ NO ☐

Dirección Laboral SEPTIMADA S.A. - septimada.com N° de Teléfono 162772803
Departamento BOGOTÁ Ciudad BOGOTÁ

4. Datos Empleador e Información del Vínculo Laboral

Tipo de Documento NT ☒ C.C. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ TI ☐ N° de Documento de Identidad 900678572 Nombre y/o Razón Social PUENOS DE INERFA ESTRUCTURA SAS
Ciudad BOGOTÁ Dirección Empleador CALLE 106 # 5778 Departamento BOGOTÁ Teléfono(s) 162772803

Ocupación o Cargo Actual Asesoría de Obra Civil Salario o Ingreso Mensual \$828.116 Salario Integral 1113

Envío de Notificación ☐ Sucursal Principal ☐ Sucursal Ciudad ☐ Tipo de Trabajador ☐ Independiente Contratista ☐ Dependiente ☒ Voluntario ☐

5. Datos Beneficiarios

Nombre y Apellido	Género	Tipo de documento	N° de Documento de Identidad	Fecha de Nacimiento	Código Parentesco
	M	F			
	M	F			
	M	F			
	M	F			

*Códigos parentesco: 01 Cónyuge 02 Compañero permanente 03 Padres 04 Hijo 05 Hijo Invalído 06 Hermano Invalído *Los beneficiarios relacionados en este formulario deben estar inscritos en el Registro de Beneficiarios de la Ley 100 de 1993.

6. Clientes Considerados PEP'S

¿Usted Maneja Fondos Públicos? ☐ SI ☒ NO ☐ ¿Es Reconocido Públicamente? ☐ SI ☒ NO ☐ Si es reconocido públicamente indique en cuál actividad ASesoría de Obra Civil

7. Derecho a Bono Pensional

Tengo derecho al Bono Pensional porque antes de mi vinculación a Porvenir S.A. estuve afiliado a Colpensiones, a una Caja o Fondo Prestacional y coticé 150 semanas. ☐ SI ☒ NO ☐

8. Régimen de Transición e Información del Producto

Importante: Manifiesto que luego de haber recibido asesoría amplia y suficiente sobre el producto ofrecido, conozco y entiendo las implicaciones legales que tiene mi decisión de traslado al régimen de ahorro individual por medio de la vinculación al Fondo de Pensiones Obligatorias de Porvenir S.A. particularmente en lo que tiene que ver con el régimen de transición establecido en la ley. Así mismo fui informado del derecho que me asiste de retractarme de mi decisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la presente solicitud.

- Anexe la fotocopia de su documento de identidad emplada al 150% en blanco y negro. - Si usted es independiente adjunte la documentación correspondiente.

9. Voluntad de Selección y afiliación

Declaro bajo juramento que los antecedentes del trabajador incluidos en el presente contrato corresponden a la información que me ha sido suministrada.

Hago constar que la selección del Régimen de ahorro individual la he efectuado en forma libre y espontánea y sin presiones. Manifiesto que he elegido a Porvenir S.A. para que administre mis aportes pensionales y que los datos proporcionados en esta solicitud son verdaderos.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 09/01/2020

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 78984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorre@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMAQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 78984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	118	10/01/2020	C 93412459	GOMEZ RUIZ JHON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

BBDA85B499B799CE2A23A737093D9FFD

Certificado impreso el día 1/9/2020 8:35:49 AM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

 POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá	Línea Nacional	Desde el celular
 6 000 811	01 8000 941 541	 533

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá:  786 838 07 55

Llamada por cobrar desde cualquier otro país:  (57) 743 01 06

www.positiva.gov.co


POSITIVA
CORPORACIÓN

JHON FREDY


GOMEZ RUIZ

93412459

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S

900678572

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

 PROMOCIONA

 10000 POR UN
NUEVO PAIS

Este carné es personal e intransferible.

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



No de Radicación

4004614928

Fecha de Radicación

09/01/2020

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☐ B. Reporte de Novedades ☒	2. Tipo de afiliación A. Individual ☐ B. Colectiva ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	6. Código (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres GOMEZ Primer apellido	RUIZ Segundo apellido	JHON Primer nombre	FREDY Segundo nombre
7. Tipo documento de Identidad CC	8. Número del documento de Identidad 93412459	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 05/11/21/97/8

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia 6	12. Discapacidad Tipo ☒ Condición ☒	13. Puntaje SISBEN 11	14. Grupo de población especial
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	16. Administradora de Pensiones PORVENIR FPC	17. Ingreso base de cotización - IBC 877803	
18. Residencia CR 35 12 A 15 SUR LA NUEVA UNIÓN SOACHA Dirección	4567899 Teléfono fijo	UHJHUYG@GMAIL.COM Teléfono celular	CUNDIRAMARCA Correo electrónico
SOACHA Municipio/Distrito	zona Urbana ☒ Rural ☐	Localidad / comuna	Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

19. Apellidos y nombres completos Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			
25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento
B1			
B2			
B3			
B4			
B5			

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo ☐ Condición ☐
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		
32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana ☐ Rural ☐	Departamento
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		
33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EP)		

Selección de la IPS Primaria

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS VS SOACHA TERREROS - VS SOACHA TERREROS	Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSSOACHA - VSSOACHA
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS	36. Tipo de identificación NIT	37. Número de documento de identificación 900678572	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
39. Ubicación CL 147 13 67 Dirección	6272803 Teléfono	F.CARDONA@SIDSAS.COM Correo electrónico	BOGOTÁ Municipio/distrito
			BOGOTÁ Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha			
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		0/9/01/2/0/2/0			
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			
Código: ☐							

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

- ☐ 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- ☐ 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- ☐ 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- ☐ 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
- ☐ 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
- ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
- ☐ 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

	
54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

- ☐ 56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☐ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
- Cantidad: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Total: ☐ 0
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
- ☐ 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN		68. Fecha de radicación		69. Fecha de validación	
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel			
☐	☐	☐	☐	☐			
70. Datos funcionario que realiza la validación				71. Firma del funcionario			
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad						
☐							
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

JHON FREDY GOMEZ RUIZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **93.412.459**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 09 de Enero del 2020.

Cordialmente,

Vicepresidente de Clientes y Operaciones



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.



Bogotá DC. 9 de Enero de 2,020

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860066942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 9/1/2020, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 93412459
Nombres y Apellidos	JHON FREDY GOMEZ RUIZ
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NI 900678572
Razón Social Empleador	
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	9/1/2020
Fecha de Ingreso a Compensar	9/1/2020
Cargo	AYUDANTE
Horas Labor Mes	240
Sueldo básico	\$ 877803

Firma del Trabajador
Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 13/01/2020

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorrea@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMASQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	122	14/01/2020	C 79829391	RODRIGUEZ GARZON ELVER	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8A636EAF65D07A88AFFFD29A1E15E0F

Certificado impreso el día 1/13/2020 8:02:45 AM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LINEA ORO

En Bogotá: 6 000 811 | Línea Nacional: 01 8000 941 541 | Desde el celular: #533

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico/ Canadá: 786 838 07 55 | Llamada por cobrar desde cualquier otro país: (571) 743 01 06

www.positiva.gov.co

POSITIVA
CONSTRUCTORA

ELVER ERNESTO
RODRIGUEZ GARZON

78820381

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S
900678572

Este carné es personal e intransferible.

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

ASISTENCIA



I. DATOS DEL TRÁMITE

Lee las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo

1. Tipo de trámite A. Afiliación B. Reporte de Novedades	2. Tipo de Afiliación A. Individual: - Cotizante o cabeza de Familia B. Colectiva C. Institucional D. De oficio	3. Régimen A. Contributivo B. Subsidado	4. Tipo de afiliado A. Cotizante B. Cabeza de familia C. Beneficiario	5. Tipo de cotizante A. Dependiente B. Independiente C. Pensionado
--	---	---	--	---

A. AFILIACIÓN N. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres RODRIGUEZ	7. Tipo de documento de identidad CC	8. Número del documento de identidad 79829391	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento D 20 D 02 M 1976 A
-------------------------------------	---	--	--	---

III. DATOS COMPLEMENTARIOS (Datos personales)

11. Etnia	12. Discapacidad Tipo F N M Condición T P	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial	15. Administradora de riesgos laborales - ARL POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16. Administradora de pensiones
-----------	--	--------------------	---------------------------------	--	---------------------------------

17. Ingreso base de cotización - IBC \$877.803	18. Residencia Dirección: _____ Teléfono fijo: _____ Teléfono celular: _____
---	---

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR (Datos básicos de identificación del cónyuge o compañero(a) permanente cotizante)

19. Apellidos y nombres Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____ Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____	20. Tipo de documento de identidad	21. Número del documento de identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento D D M M A A A A
--	------------------------------------	---------------------------------------	--	--

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre
B1				
B2				
B3				
B4				
B5				

25. Tipo de documento de identidad	26. Número del documento de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento	29. Parentesco	30. Etnia
B1					
B2					
B3					
B4					
B5					

31. Discapacidad	32. Datos de residencia	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
Tipo: F N M Condición: T P	Municipio / Distrito: _____ Zona: Urbana ☐ Rural ☐ Departamento: _____ Teléfono fijo y/o celular: _____	
B1		
B2		
B3		
B4		
B5		

34. Nombre de la institución prestadora de servicios de salud - IPS C	Código de la IPS (a registrar por la EPS)
B1	
B2	
B3	
B4	
B5	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA	36. Tipo de documento de identificación INTJ	37. Número del documento de identificación 900678572	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS)
39. Ubicación CL 106 54 78 OF:402	6272803	Como electrónico	BOGOTA Municipio / Distrito
			DISTRITO CAPITAL Departamento

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad	1. Modificación de datos básicos de identificación ☐	2. Corrección de datos básicos de identificación ☐	3. Actualización del documento de identidad ☐	4. Actualización y corrección de datos complementarios ☐	5. Terminación de la inscripción en la EPS ☐	6. Remisión en la EPS ☐	7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐	8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales ☐	9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar ☒	10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando ☐	11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐	12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas ☐	13. Movilidad: A. Régimen Contributivo ☐ B. Régimen Subsidado ☐	14. Traslado: A. Mismo Régimen ☐ B. Diferente Régimen ☐	15. Reporte de fallecimiento ☐	16. Reporte del trámite de protección al cesante ☐	17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado ☐	18. Reporte de la calidad de Pensionado ☐
---------------------	---	---	--	---	---	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de identificación Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____ Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____	42. Fecha de nacimiento D D M M A A A A	43. EPS anterior	44. Motivo de traslado Código: _____	45. Caja de Compensación Familiar o Pagador de Pensiones
46. Tipo de documento de identidad	47. Número del documento de identidad	48. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	49. Fecha de nacimiento D D M M A A A A	50. Fecha de radicación D 13 D 01 M 2020 A

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.	☐
47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.	☐
48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.	☐
49. Declaración de no información del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.	☐
50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.	☐
51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.	☐
52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.	☐
53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.	☐

VIII. FIRMAS

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de Oficio
--	---

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad: CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ OD ☐ BC ☐	Cantidad: _____ Total: _____
57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.	☐
58. Copia del registro civil de matrimonio o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.	☐
59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.	☐
60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.	☐
61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.	☐
62. Copia del documento en que conste la pérdida de la patria potestad o el certificado de defunción de los padres o la declaración susrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.	☐
63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.	☐
64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.	☐
65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.	☐

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la entidad territorial Código del municipio: _____ Código del departamento: _____	67. Datos del SISBEN Número de la ficha: _____ Puntaje: _____ Nivel: _____	68. Fecha de radicación D D M M A A A A	69. Fecha de validación D D M M A A A A
--	---	--	--

70. Datos del funcionario que realiza la validación Primer Apellido: _____ Segundo Apellido: _____ Primer Nombre: _____ Segundo Nombre: _____	71. Firma del funcionario
72. Tipo de documento de identidad	73. Número del documento de identidad
OBSERVACIONES: CARGO: AYUDANTE DE CONSTRUCCION	

VIOLADO SUPLENTE

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) RODRIGUEZ GARZON ELVER ERNESTO identificado(a) con CC número 79.829.391 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 29 de agosto de 2001 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 13 de enero de 2020.

Cordialmente,

Laura Patricia Merchan Metaute
Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:

Línea de servicio Protección: Bogotá: 744 44 64 - Medellín y Cali 510 90 99

Barranquilla: 319 79 99 - Cartagena: 642 49 99 - Nacional 01 8000 52 8000

www.proteccion.com

2020011322372

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 13 de Enero de 2,020

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información:

Tipo de Identificación	: CC
No. de Identificación	: 79829391
Nombre	: ELVER ERNESTO RODRIGUEZ GARZON
Empresa/Contratante	: SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS
Identificación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 900678572
Fecha de Afiliación a CCF	: 2020/01/13
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2020/01/13
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

La presente certificación se expide con destino a quien interese y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación

Atentamente.

Paula Andrea Ramirez

GESTIÓN DE INFORMACION EMPRESARIAL

Elaboró: Portal Compensar



FOR-PSA-0111


POSITIVA
 COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 13/01/2020
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorreia@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMAQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	123	14/01/2020	C 1105616200	GOMEZ BELTRAN JEISON	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

8A636EAF65D07A88AFFFD29A1E15E0F

Certificado impreso el día 1/13/2020 10:31:10 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
**SISTEMA GENERAL DE
 RIESGOS LABORALES**

POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá **6 000 811** Línea Nacional **01 8000 941 541** Desde el celular **#533**

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá. **786 838 07 55**

Llamada por cobrar desde cualquier otro país. **+(571) 743 01 06**

www.positiva.gov.co

POSITIVA
 CREDITO A LA SEGURIDAD

JEISON FERNANDO

GOMEZ BELTRAN

1105616200

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S

900678572

Este carné es personal e intransferible.

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL





* 0 1 0 7 0 4 2 8 2 3 *

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

56. Anexo copia del documento de identidad: ☐ CN ☐ RC ☐ TI ☐ CC ☐ PA ☐ CE ☐ CD ☐ SC ☐ PE Total

261


LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Documento **Cédula de Ciudadanía** número **1105616200**, *no está Registrado* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 13 de enero de 2020.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 13 de Enero de 2,020

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información:

Tipo de Identificación	: CC
No. de Identificación	: 1105616200
Nombre	: JEISON FERNANDO GOMEZ BELTRAN
Empresa/Contratante	: SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS
Identificación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 900678572
Fecha de Afiliación a CCF	: 2020/01/13
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2020/01/13
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

La presente certificación se expide con destino a quien interese y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación

Atentamente.

Paula Andrea Ramírez

GESTIÓN DE INFORMACION EMPRESARIAL

Elaboró: Portal Compensar



FOR-PSA-0111

Caja de Compensación Familiar Compensar



VIGILADO



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 17/01/2020

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorre@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMASQUINAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	130	18/01/2020	C 18969178	HERRERA COLLANTE LUIS	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

901AADBA6B238A6B664AEAB2A43E0EC2

Certificado impreso el día 1/17/2020 11:10:19 PM por el portal de empresas Edesk

2527-2628

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá: **6 000 811** Línea Nacional: **01 8000 941 541** Desde el celular: **#533**

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá: **786 838 07 55**

Llamada por cobrar desde cualquier otro país: **+(571) 743 01 06**

www.positiva.gov.co

POSITIVA
COMPAÑÍA S.A.S.

**LUIS MIGUEL
HERRERA COLLANTE**
18969178

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S
800678572

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

INFORMACIÓN



Este carné es personal e intransferible.

263

NIT. 900.156.254-2



★ 0 1 0 7 2 9 9 4 2 2 *

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

EL DATOS COMPLEMENTARIOS

IV. DATOS DE IDENTIFICACION DE LOS MIEMBROS DEL NUCLEO FAMILIAR Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

B. REPORTE DE NOVEDADES

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

VI. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declaro que convivo con el(a) Señor(a) _____, identificado(a) con No. _____, desde el día _____ del mes _____ del año _____.

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(los) Beneficiario(s) reportar(ot) dependencia económica con el(los) beneficiario(s) afiliado(s) a la EPS.

47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios o afiliados adicionales.

49. Declaración de la no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigentes y afiliados adicionales.

52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con la Ley 1581 de 2012.

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensuales de texto.

Identificado(a) con No. _____

RECIBO PARA ESTUDIO EN LA EPS

Nombre: DIEGO CAHERRA FALLA

Clave de servicio: 1581

Fecha: 15-01-2024

VII. FIRMAS

54. Firma de entrega: *Luis Miguel Herrera*

55. Firma a todo el personal, accionistas o socios: *[Firma]*

IX. ANEXOS									
56 Anexo copia del documento de identidad:	CN	RC	TI	CC	PA	GE	CD	SC	PE
Cantidad:									
Total									



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

LUIS MIGUEL HERRERA COLLANTE, identificado(a) con cédula de ciudadanía **18.969.178**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 17 de Enero del 2020.

Cordialmente,

Vicepresidente de Clientes y Operaciones



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 10/01/2020

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900979719	Cédula Usuario:	C 19055773
Nombre:	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ARABA SAS				
Dirección:	CALLE 100 19 61 OFICINA 506				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	arabajas@hotmail.com				
Teléfono:	3157279313		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5712201 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION Y DE INGENIERIA CIVIL CON SUMINISTRO DE OPERARIOS				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 19055773	GUSTAVO BALLARIN ORTIZ

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	14	11/01/2020	C 1010010098	ESPITIA QUINTERO ANGEL	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

D4FA3F8FB454F4B572F61F5E616E17EE

Certificado impreso el día 1/10/2020 2:05:41 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE
RIESGOS LABORALES

POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá: 6 000 811 | Línea Nacional: 01 8000 941 541 | Desde el celular: #533

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá: 786 838 07 55 | Llamada por cobrar desde cualquier otro país: + (571) 743 01 06

www.positiva.gov.co



ANGEL JESUS

ESPITIA QUINTERO

1010010098

EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ARABA SAS

900979719

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

VERIFICACIÓN



Este carné es personal e intransferible.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR
NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ANGEL JESUS ESPITIA QUINTERO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.010.010.098**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir** y al **Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 10 de Enero del 2020.

Cordialmente,

Vicepresidente de Clientes y Operaciones



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.


POSITIVA
 COMPAÑIA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 07/01/2020
DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorreia@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMASQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	115	08/01/2020	C 1005870912	ORTIZ QUIJANO HAROLD	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor dirijase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
 Positiva Compañía de Seguros S.A.

FFD2ABD1FD5D43C188217710034608C7

Certificado Impreso el día 17/7/2020 11:31:11 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LINEA ORO

En Bogotá: **6 000 8111** Línea Nacional: **01 8000 941 541** Desde el celular: **#533**

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico/ Canadá: **786 838 07 55** Llamada por cobrar desde cualquier otro país: **4 (571) 743 01 06**

www.positiva.gov.co



HAROLD DAYAN

ORTIZ QUIJANO

1005870912

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S

900678572

Este carné es personal e intransferible.

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

"Código Único para dependientes y afiliaciones al Régimen Subsidiado"

NIT. 900.155.264-2



* 0 1 B 1 3 3 5 4 2 6 6 *



* 0 1 0 7 2 9 9 4 2 6 *

I. DATOS DEL TRÁMITE

Lea atentamente las instrucciones antes de diligenciar este formulario

1. TIPO DE TRÁMITE		2. TIPO DE AFILIACIÓN				3. RÉGIMEN	
A. AFILIACIÓN	B. REPORTE DE NOVEDADES	A. Individual: a) Cotizante o cabeza de familia ☒ b) Beneficiario o afiliado adicional ☐ B. Colectiva ☐ C. Institucional ☐ D. De oficio ☐				C. Contributivo ☐ S. Subsidiado ☒	
4. TIPO DE AFILIADO		5. TIPO DE COTIZANTE				6. FECHA DE LA SOLICITUD	
CO Cotizante ☒ CF Cabeza de Familia ☐ BE Beneficiario ☐		A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐ D. Independiente por prestación de servicio ☐				04 03 2020	

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		7. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		8. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		9. SEXO		10. FECHA NACIMIENTO	
PRIMER APELLIDO: ORTIZ SEGUNDO APELLIDO: QUIRANO		R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C. P.E.		3.005870917		X M		05 03 2001	

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. ORIGEN ÉTNICO		12. DISCAPACIDAD		13. PUNTAJE Y NIVEL DEL SISBEN		14. GRUPO DE POBLACIÓN ESPECIAL		15. ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	
Tipo F N M Condición T P		Tipo F N M Condición T P						POSITIVA	
16. ADMINISTRADORA DE PENSIONES		17. INGRESO BASE DE COTIZACIÓN - IBC		18. UBICACIÓN O DIRECCIÓN DE RESIDENCIA		LOCALIDAD / COMUNA		BARRIO	
POLIENIR		\$ 877.803		Dg sobis # 83 int 2 sur					
CIUDAD / MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		ZONA		TELÉFONO FIJO		TELÉFONO MÓVIL	
BOGOTÁ		BOGOTÁ		U. ☒ R. ☐				327 2390155	
CORREO ELECTRÓNICO		CÓDIGO IPS						segundadsocial@gmail.com	

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR Datos de identificación del beneficiario (Cónyuge o compañero (a) permanente del cotizante)

19. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS		20. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		21. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		22. SEXO		23. FECHA NACIMIENTO		DÍA MES AÑO		CÓDIGO IPS	
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:		1. C.C. C.E. P.A. C.D. P.E.				F M							

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DE LOS BENEFICIARIOS		25. TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD		26. NÚMERO DE IDENTIDAD		27. SEXO		28. FECHA DE NACIMIENTO		29. PARENTESCO		30. ETNIA		31. DISCAPACIDAD	

32. DATOS DE RESIDENCIA		33. VALOR UPIC AFILIADO ADICIONAL (Lo define la EPS)		34. Nombre y código de la IPS		EXCEPCIÓN DEL TRASLADO		NIVEL DE SISBEN		GRUPO POBLACIONAL	
Ciudad / Mpio. Departamento. Zona. Teléfono Fijo. Teléfono Mvil.						COBERTURA GEOGRÁFICA. IMPERACIÓN GRUPO POBLACIONAL. CUMPLIMIENTO TIEMPO POR CESIÓN. SERVICIO ASIGNADO POR SIS.		I. II.		I. II.	

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o Razón Social		36. Tipo documento de identidad		37. Número documento de identidad		38. Tipo de aportante o pagador de pensiones	
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA SAS		C.C. C.E. P.A. C.D. P.E.		900.678.572		6	
39. UBICACIÓN O DIRECCIÓN		CIUDAD / MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		TELÉFONO MÓVIL	
CALE 106 # 5778		BOGOTÁ		BOGOTÁ		6272803	
FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL		CARGO		SALARIO			
07 01 2020		Ayudante obra civil		\$ 877.803			

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. TIPO DE NOVEDAD		41. EXCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES		42. MOVILIDAD	
1. MODIFICACIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN		3. INICIO DE RELACIÓN LABORAL O ADQUISICIÓN DE CONDICIONES PARA COTIZAR		A) AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO	
2. CORRECCIÓN DE DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN		10. TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL O PÉRDIDA DE LAS CONDICIONES PARA SEGUIR COTIZANDO		B) AL RÉGIMEN SUBSIDIADO	
3. ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD		11. VINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS		A) MISMO RÉGIMEN	
4. ACTUALIZACIÓN Y/O CORRECCIÓN DE DATOS COMPLEMENTARIOS		12. DESVINCULACIÓN A UNA ENTIDAD AUTORIZADA PARA REALIZAR AFILIACIONES COLECTIVAS		B) DIFERENTE RÉGIMEN	
5. TERMINACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN LA EPS				15. REPORTE DE FALLECIMIENTO	
Código ☐				16. REPORTE DEL TRÁMITE DE PROTECCIÓN AL CESANTE	
6. REINSCRIPCIÓN EN LA EPS				17. REPORTE DE LA CALIDAD DE PREPENSIONADO	
7. INCLUSIÓN DE BENEFICIARIOS O DE AFILIADOS ADICIONALES				18. REPORTE DE LA CALIDAD DE PENSIONADO	

DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN		42. EXCEPCIÓN DEL TRASLADO		43. CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR O PAGADOR DE PENSIONES	
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO: PRIMER NOMBRE: SEGUNDO NOMBRE:		COBERTURA GEOGRÁFICA. IMPERACIÓN GRUPO POBLACIONAL. CUMPLIMIENTO TIEMPO POR CESIÓN. SERVICIO ASIGNADO POR SIS.			
TIPO DOCUMENTO DE IDENTIDAD. R.C. T.I. C.C. C.E. P.A. C.D. S.C. P.E. NÚMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD. SEXO. F. M. FECHA NACIMIENTO. DÍA. MES. AÑO.					
42. FECHA (a partir de)		43. EPS ANTERIOR			
DÍA. MES. AÑO.		Código			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

Declaración Juramentada de convivencia: Declare que convive con el(la) Señor(a) _____ desde el día _____ del mes _____ del año _____

46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales: Declaro bajo la gravedad de juramento que el(la) Beneficiario(s) reportado(s) es(es) económicamente de mi responsabilidad.

47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.

48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios. Anexo soporte de la Entidad.

49. Declaración de no intermediación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios.

50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados a las entidades públicas y privadas que sus funciones les requieran.

51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados.

52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1317 de 2013.

53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

VIII. FIRMAS

54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario		55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio y/o independiente por prestación de servicio	
Harold Dayan Ortiz Q.		[Sello y Firma]	

IX. ANEXOS

56. Anexo copia del documento de identidad:		Cantidad:		Total:	
CN RC TI CC PA CE CD SC PE					

Protección

Fondo de Pensiones Obligatorias Protección

NIT 800.198.281

Hace constar que:

El(la) Señor(a) ORTIZ QUIJANO HAROLD DAYAN identificado(a) con CC número 1.005.870.912 se encuentra afiliado(a) en Pensiones Obligatorias a PROTECCIÓN, desde el día 04 de junio de 2019 y sus recursos se encuentran en el FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCIÓN MAYOR RIESGO.

Esta constancia se expide a petición del interesado(a) el día 07 de enero de 2020.

Cordialmente,



Laura Patricia Merchan Metaute
Dirección servicios transaccionales para clientes
Protección S.A.

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

***Si desea verificar la veracidad de esta información comuníquese con nosotros:**

Línea de servicio Protección: Bogotá: **744 44 64** - Medellín y Cali **510 90 99**

Barranquilla: **319 79 99** - Cartagena: **642 49 99** - Nacional 01 **8000 52 8000**

www.proteccion.com

202001072335



Bogotá DC. 7 de Enero de 2020

SOLICITUD DE AFILIACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860065942

Señor usuario, reciba un cordial saludo de su Caja de Compensación Familiar Compensar. Informamos que el día 7/1/2020, se ha recibido una solicitud de afiliación, la cual estará sujeta a verificación.

Si el trabajador desea recibir cuota monetaria de subsidio debe consultar los requisitos en www.compensar.com/subsidio. De cumplir con las condiciones, es necesario realizar la solicitud adjuntando los documentos de soporte a través del portal corporativo www.compensar.com.

A continuación ofrecemos el detalle de la información suministrada del trabajador:

Tipo y Número de Identificación	CC 1005870912
Nombres y Apellidos	ORTIZ QUIJANO HAROLD DAYAN
Tipo y Número de Identificación del Empleador	NI 900678572
Razón Social Empleador	
Código Sucursal	0
Código Centro de Costo	0
Fecha de Ingreso Empresa	7/1/2020
Fecha de Ingreso a Compensar	7/1/2020
Cargo	AYUDANTE
Horas Labor Mes	240
Sueldo básico	\$ 877803

 Firma del Trabajador
 Identificación

La presente constancia se expide con destino a , este documento impreso debe reposar firmado en la hoja de vida del trabajador.

Para mayor información de nuestros servicios consulte nuestra página web www.compensar.com o contáctenos a nuestra central telefónica de atención al usuario 3 077001.



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DÍA 13/01/2020

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	Nº	Número de documento:	900878572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTÁ D.C.		Municipio:	BOGOTÁ D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorre@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMASQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	124	14/01/2020	C 1013545972	PEÑA SOCHA DAVID	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

8A636EAF65D07A88AFFFD29A1E15E0F

Certificado impreso el día 1/13/2020 10:33:06 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA

 **SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES** 

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

 En Bogotá	 Línea Nacional	 Desde el celular
 6 000 811	 01 8000 941 541	 #533

 Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá.

 Llámese por cobrar desde cualquier otro país.

 786 838 07 55

 +(571) 743 01 06

www.positiva.gov.co


POSITIVA
CONFESIÓN S.A.S.

DAVID YEZID

PEÑA SOCHA

1013045972

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S

900676572

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

 INNOVACIENDA

 BUENOS DÍAS

Este canal es personal e intransferible.



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTIAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR
NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

DAVID YEZID PENA SOCHA, identificado(a) con cédula de ciudadanía **1.013.645.972**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 13 de Enero del 2020.

Cordialmente,

Vicepresidente de Clientes y Operaciones



Tenga en cuenta:

En este momento de su vida, lo que más le conviene es estar en un fondo privado como Porvenir, ¿por qué? porque está acumulando semanas, ahorrando dinero y obteniendo rendimiento.

2584 2585



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR

NIT.860.066.942-7

Bogotá D.C., 13 de Enero de 2,020

A QUIEN INTERESE

Compensar, Caja de Compensación Familiar, certifica que el cliente se encuentra afiliado en la modalidad TRABAJADOR DEPENDIENTE, con la siguiente información :

Tipo de Identificación	: CC
No. de Identificación	: 1013645972
Nombre	: DAVID YEZID PEÑA SOCHA
Empresa/Contratante	: SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS
Identificación Empresa	: NIT
No. Identificación Empresa	: 900678572
Fecha de Afiliación a CCF	: 2020/01/13
Fecha de Ingreso a la empresa	: 2020/01/13
Estado	: Afiliado
Categoría	: A

La presente certificación se expide con destino a quien interese y tiene vigencia de un mes a partir de la fecha de expedición.

Esta certificación no es válida para presentar los documentos requeridos para la acreditación del subsidio monetario, considerando solo validos el formato de inscripción, modificación a la Caja de Compensación

Atentamente.

Paula Andrea Ramírez

GESTIÓN DE INFORMACION EMPRESARIAL

Elaboró: Portal Compensar



FOR-PSA-0111

Caja de Compensación Familiar COMPENSAR Constituyente



VIGILADO

270

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS



Nº de Radicación
4004632291

Fecha de Radicación
13/01/2020

I. DATOS DEL TRÁMITE

(Lea las instrucciones que se encuentran anexas al formulario antes de diligenciarlo)

Página 1 de 2

1. Tipo de trámite A. Afiliación ☒ B. Reporte de Novedades ☐	2. Tipo afiliación A. Individual ☐ B. Colectiva ☐ B. Institucional ☐	3. Régimen A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐
4. Tipo de afiliado A. Cotizante ☒ B. Cabeza de Familia ☐ C. Beneficiario ☐	5. Tipo de cotizante A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐	6. Código (a registrar por la EPS) 1

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres PEÑA Primer apellido	SOCHA Segundo apellido	DAVID Primer nombre	YESID Segundo nombre
7. Tipo documento de identidad CC	8. Número del documento de identidad 1013645972	9. Sexo Femenino ☐ Masculino ☒	10. Fecha de nacimiento 26/12/1993

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

11. Etnia 6	12. Discapacidad Tipo FNM Condición TIP	13. Puntaje SISBEN	14. Grupo de población especial
15. Administradora de riesgos Laborales - ARL POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS		16. Administradora de Pensiones PORVENIR FPC	17. Ingreso base de cotización - IBC 877803
18. Residencia CR 45 66 44 Dirección BOGOTÁ Municipio/Distrito		4665432 Teléfono fijo	DAVID@GMAIL.COM Correo electrónico
BOGOTÁ Municipio/Distrito		11 Localidad / comuna	BOGOTÁ Departamento

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

19. Apellidos y nombres completos Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
20. Tipo documento de identidad	21. Número documento identidad	22. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	23. Fecha de nacimiento

Datos básicos de identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

24. Apellidos y nombres Primer apellido Segundo apellido Primer nombre Segundo nombre			
25. Tipo documento de identidad	26. Número de identidad	27. Sexo Femenino ☐ Masculino ☐	28. Fecha de nacimiento

Datos complementarios

29. Parentesco	30. Etnia	31. Discapacidad Tipo F N M Condición P
----------------	-----------	--

32. Datos de residencia Municipio/Distrito	Zona Urbana Rural	Departamento	Teléfono Fijo y/o celular	33. Valor de la UPC del afiliado adicional (a registrar por la EPS)
---	----------------------	--------------	---------------------------	---

34. Nombre de la Institución Prestadora de Salud - IPS C VS AMERICAS - UOD CPO AMERICAS	Código de la IPS (a registrar por la EPS) VSAMERICAS - UODCPOAMER
--	--

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

35. Nombre o razón social SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO SAS	36. Tipo de identificación NIT	37. Número de documento de identificación 900678572	38. Tipo de aportante o pagador de pensiones (a registrar por la EPS) 01
39. Ubicación CL 147 13 67 Dirección	6272803 Teléfono	F.CARDONA@SIDSAS.COM Correo electrónico	BOGOTÁ Municipio/Distrito

No de Radicación

4004632291

Página 2 de 2

B. REPORTE DE NOVEDADES

40. Tipo de Novedad

- ☐ 1. Modificación datos básicos de identificación
- ☐ 2. Corrección datos básicos de identificación
- ☐ 3. Actualización documento de identidad
- ☐ 4. Actualización y/o corrección datos complementarios
- ☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS.
- Código: ☐
- ☐ 6. Reinscripción en la EPS
- ☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar
- ☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- ☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando

- ☐ 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- ☐ 13. Movilidad: ☐ A. Régimen Contributivo
☐ B. Régimen Subsidiado
- ☐ 14. Traslado: ☐ A. Mismo régimen
☐ B. Diferente régimen
- ☐ 15. Reporte de fallecimiento
- ☐ 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- ☐ 17. Reporte de la calidad de pre-Pensionado
- ☐ 18. Reporte de la calidad del pensionado

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

41. Datos básicos de la identificación

Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad	Número documento de identidad	Sexo	Fecha de nacimiento	42. Fecha			
☐		Femenino ☐ Masculino ☐		13/01/2020			
43. EPS anterior		44. Motivo de traslado Código: ☐		45. Caja de Compensación Familiar o pagador de pensiones			

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

46. ☐ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
47. ☐ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
48. ☐ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
49. ☐ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Salud.
50. ☐ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- ☐ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieren
- ☐ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
53. ☐ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o celular como mensaje de texto

VIII. FIRMAS

54. Cotizante o cabeza de familia o beneficiario	55. El empleador aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva institucional o de oficio

IX. ANEXOS

56. Anexo Copia del documento de identidad: CN. ☐ RC. ☐ TI. ☐ CC. ☒ PA. ☐ CE. ☐ CD. ☐ SC. ☐
- Cantidad: ☐ ☐ ☐ 1 ☐ ☐ ☐ ☐ Total: 1
- ☐ 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- ☐ 58. Copia registro civil de matrimonio, o de la escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- ☐ 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial para que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- ☐ 60. Copia certificado de adopción o acta de entrega del menor
- ☐ 61. Copia orden judicial o acto administrativo de custodia.
62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los padres.
- ☐ 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud
- ☐ 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- ☐ 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que consiste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

66. Identificación de la Entidad Territorial		67. Datos del SISBEN		68. Fecha de radicación		69. Fecha de validación	
Código del municipio	Código del Departamento	Número ficha	Puntaje	Nivel			
☐	☐	☐	☐	☐			
70. Datos funcionario que realiza la validación							
Primer apellido		Segundo apellido		Primer nombre		Segundo nombre	
Tipo documento de identidad		Número documento de identidad		71. Firma del funcionario			
☐							
Observaciones							

Recuerde que la firma, al final del formulario, valida las declaraciones marcadas y/o diligenciadas en el capítulo VII Declaraciones y IX. Autorizaciones, así como la veracidad de las demás información registrada.

CUESTIONARIO CARTA DE DERECHOS DEL AFILIADO Y DEL PACIENTE Y CARTA DE DESEMPEÑO

Información para ser diligenciada por el cotizante del grupo familiar:

Primer apellido PEÑA	Segundo apellido (o de casada) SOCHA	Primer nombre DAVID	Segundo nombre YESID
No de identificación 1013645972	Tipo de documento RC TI CC CE PA	Fecha de nacimiento 1993 12 26	Sexo X F
			Fecha diligenciamiento 2020 01 13

Apreciado usuario: La Carta de derechos del afiliado y del paciente y la carta de desempeño son unas importantes herramientas de consulta para que conozca sus derechos y deberes, al igual que la infraestructura con la que contamos para brindarle la mejor atención, lo estipulado en normatividad vigente y, por supuesto, los canales de comunicaciones con los que puede hacernos llegar sus comentarios y sugerencias.

Con el fin de garantizar la entrega de este importante documento le solicitamos responder el siguiente cuestionario:

1. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Derechos y Deberes del Afiliado y del Paciente? ☒ **NO**
2. ¿Previo al diligenciamiento del formulario de afiliación, la EPS le hizo entrega de la Carta de Desempeño donde se presenta de manera clara su puesto en el ranking? ☒ **NO**
3. ¿Leyó el contenido de la Carta de Derechos y deberes del afiliado y del paciente? ☒ **NO**
4. ¿Leyó el contenido de la Carta de Desempeño de la EPS? ☒ **NO**
5. ¿Si tuvo alguna duda sobre el contenido de la información fue asesorado adecuadamente por la EPS? ☒ **NO**

Con su aprobación para el envío de información por medios electrónicos, usted recibirá nuestras comunicaciones relacionadas con novedades de su afiliación y/o de alguno de sus beneficiarios, recordatorio de citas médicas, adicionalmente le remitiremos información de campañas, planes de promoción y prevención diseñados para su bienestar y el de su grupo familiar y en general todo lo que impacte en el cuidado de la salud.

"Yo: DAVID YESID PEÑA SOCHA identificado con el documento de identidad número: 1013645972, ☒ **SI** ☒ **NO** autorizo a Salud Total EPS a enviarme información vía email y/o medios electrónicos.

Firma Cotizante:

David Peña
www.saludtotal.com.co


Línea local en Bogotá 4854555

Línea gratuita de atención al cliente 018000114524

Síguenos en  Salud Total EPS. Oficial

Tu salud no
es a medias
debe ser **total**

Salud Total_{EPS}



Huella digital
(en caso de no saber firmar)
F309-RVA V1.0-2013



POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

CERTIFICADO DE RADICACIÓN DE AFILIACIÓN DEL DIA 16/01/2020

DATOS DE LA EMPRESA

Tipo documento:	NI	Número de documento:	900678572	Cédula Usuario:	C 79984303
Nombre:	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S				
Dirección:	CL 147 13 67AP340				
Departamento:	BOGOTA D.C.		Municipio:	BOGOTA D.C.	
Correo electrónico:	fcardonacorre@gmail.com				
Teléfono:	3208230046		Tarifa:	6.960	
Actividad Económica:	5742101 EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION, DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AGRIMESURA, EXPLOTACION Y PROSPECCION GEOLOGICAS, ASESORAMIENTO TECNICO CONEXO INCLUYE SOLAMENTE A EMPRESAS DEDICADAS A DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMAQUINAS CON INTERVENCION DIRECTA EN LA OBRA				

DATOS DEL USUARIO QUE REALIZA LA RADICACIÓN

Cédula Usuario	Nombres y Apellidos del Usuario
C 79984303	FELIPE ALBERTO CARDONA CORREA

DATOS AFILIADOS RADICADOS

	Radicado	Cobertura	Documento	Nombre Trabajador	Riesgo	Tarifa	Tipo
1	129	17/01/2020	C 1028023929	RAMOS TORO TEOBLADO	5	6.96000	Dependiente

OBSERVACIONES

Si tiene alguna duda con respecto a la tarifa o actividad económica de sus afiliados por favor diríjase a la oficina de POSITIVA más cercana o comuníquese con nuestra línea gratuita de atención a nivel nacional 01-8000-111-170 y en Bogotá al 3307000.

Cordial saludo,

Gerencia de Afiliaciones y Novedades
Positiva Compañía de Seguros S.A.

52DF979137AA06C616A58BF79DCC6FBB

Certificado impreso el día 1/16/2020 7:23:01 PM por el portal de empresas Edesk

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

POSITIVA

En caso de Accidente de Trabajo comuníquese sin costo adicional
LÍNEA ORO

En Bogotá	Línea Nacional	Desde el celular
6 000 811	01 8000 941 541	#533

Para solicitar asistencia internacional desde USA / Puerto Rico / Canadá. 786 838 07 55

Llamada por cobrar desde cualquier otro país. 4(571) 743 01 06

www.positiva.gov.co

POSITIVA
CORPORACIÓN

TEOBLADO SAMIR

RAMOS TORO

1028023928

SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S

800678572

Este correo es personal e Intransferible.

LO BUENO DEBE SER PARA TODOS

INNOVACIÓN



56. Anexo copia del documento de identidad:

CN	RC	TI	CC	PA	CE	CO	SC	PE
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Cantidad: Total:



LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de Afiliados, el Documento Cédula de Ciudadanía número 1028023929, *no está Registrado* en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 17 de enero de 2020.

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Rosa Mercedes Niño Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTY. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 07. EXÁMENES MÉDICOS



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 15-ene-2020 HORA 09:58:14
 EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 TIPO DE EXAMEN: INGRESO
 INFORMACIÓN GENERAL:
 Nombre del Trabajador: Frank Esteban Martínez Hernandez
 Edad 20 años 2 meses 20 días
 Documento de Identificación: CC Número: 1023979387
 Cargo BOAL



APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

EXAMEN OSTEOMUSCULAR: OSTEOMUSCULAR: NORMAL / FUERZA: NORMAL / REFLEJOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1/ Manejo de estrés con actividades que mejoren la carga laboral. 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna. 5/ Cuidados con la alimentación. 6/ Uso de bloqueador solar 2 veces al día. 7/ Control con odontología anual y con medicina general anual por EPS. 8/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable. 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorias y diarreicas. 11/ Mejorar posturas con el fin de evitar alteraciones osteomusculares, uso de EPP acorde a la actividad laboral. 12/ Hidratación constante. 13/ Hábitos saludables. 14/ Uso de lentes permanentes en jornada laboral.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
 LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma

Nombre: LAURA MERCEDES TORRES MANGONES

RM. 24643 Lic. SO:

Trabajador

Firma

Nombre: Frank Esteban Martínez Hernandez

CC N° 1023979387



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 11-ene-2020 HORA 08:14:47
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Elver Ernesto Rodríguez Garzon
Edad 43 años 10 meses 22 días
Documento de identificación: CC Número: 79829391
Cargo OFICIAL

**APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO**

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**Optometría**

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna. 4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos. 7/ Hábitos saludable, alimentación baja en grasa y carbohidratos, realizar ejercicio por lo menos tres veces por semana 30 minutos.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico
Laura Mercedes Torres Mangones
Responsable Clínica en el Trabajo
C.C. 24643 - Lic. S.O. No. 266

Firma

Nombre: LAURA MERCEDES TORRES MANGONES

RM. 24643

Lic.SO:

Trabajador

Firma

Nombre: Elver Ernesto Rodríguez Garzon

CC N° 79829391



Huella

CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 13-ene-2020 HORA 12:12:11
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Jeison Fernando Gomez Beltran
Edad 22 años 3 meses 12 días
Documento de Identificación: CC Número: 1105616200
Cargo AYUDANTE DE OBRA



APTO PARA EJERCER CARGO ASIGNADO.

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO

Optometría

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna. 4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos.


AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: Normal OPTOMETRIA: NORMAL REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma



Dr. Jorge Enrique Betancourt Plaza
Especialista
Salud Ocupacional
C.C. 15344

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Lic.SO:


Trabajador

Firma



Nombre: Jeison Fernando Gomez Beltran

CC N° 1105616200



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 8-ene.-2020 HORA 12:02:40

EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Jhon Fredy Gomez Ruiz

Edad 41 años 1 mes 3 días

Documento de Identificación: CC Número: 93412459

Cargo MAESTRO



APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA

EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL


REMISION A EPS, NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma




Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Lic.SO:


Trabajador

Firma



Nombre: Jhon-Fredy Gomez Ruiz

CC N° 93412459





CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 17-ene-2020 HORA 08:04:24
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Luis Miguel Herrera Collante
Edad 53 años 5 meses 4 días
Documento de Identificación: CC Número: 18969178
Cargo OFICIOS VARIOS



APTO PARA EL CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: HABITOS DE VIDA SALUDABLES, NO FUMAR NI BEBER, DIETA BALANCEADA, CONTROL MEDICO ANUAL EN SU EPS, USAR EPP, Y DE PROTECCION AUDITIVA

EXAMEN OSTEOMUSCULAR NORMAL

REMISION A EPS, L NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma

Dr. Jorge E. Betancourt Plaza
Especialista
Salud Ocupacional
EPS - ASISTENTE TECNICO

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM.

15344

Lic.SO:

Trabajador


Firma

Luis Miguel Herrera Collante

Nombre: Luis Miguel Herrera Collante

CC N°

18969178



DATOS PACIENTE

Nombres:	ANGEL JESUS ESPITIA QUINTERO		
Tipo de Documento:	CC Documento	1010010098	
Sexo	M	F. Nacimiento:	06/03/1995
Edad:	24 Años		
Entidad:	EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ARABA SAS		
Centro de Costo:	N/A		
Cargo:	OPERARIO DE MAQUINARIA		
Fecha de Atencion:	2020-01-10		
Fecha y Hora entrega resultados:	10/01/2020 8.46 AM		

CERTIFICADO MEDICO DE CONDICIONES GENERALES DE SALUD
Resolución No. 2346 de 2007 y Resolución No. 1918 de 2009

Realizado la valoración Médico Ocupacional de PRE INGRESO, el suscrito médico certifica que el aspirante al cargo es:

SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO

Tipo de Restricciones ó Limitaciones:

NÓ TIENE

Recomendaciones:

VALORACION OPTOMETRICA. USO DE CORRECCION VISUAL Y CONTROL ANUAL

Se Sugiere Control en Programas de Vigilancia Epidemiológica

Exámenes Realizados:

AUDIOMETRIA TAMIZ	E OSTEOMUSCULAR	ESPIROMETRIA
EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE PRE INGRESO	VISIOMETRIA	

Acepto las anteriores valoraciones Médicas, hago constar que la información suministrada sobre mi condición de salud, es verdadera, y me comprometo a cumplir las recomendaciones y las restricciones a que haya lugar. Cualquier omisión o falsedad será causa justa de finalización de contrato. Artículo 62 CST.

ANALISIS Y CONCEPTO: DR. (A): LUZ MERY DIAZ RODRIGUEZ **RM:** 52009824

Luiz Mery Diaz Rodriguez
LUZ MERY DIAZ RODRIGUEZ
 MEDICO SO LIC 7840 2010
 TP.57 009 824

Firma y sello del Médico Evaluador

ANGEL JESUS ESPITIA QUINTERO
 C.C 1010010098
 Firma del trabajador Evaluado

* BOGOTA SEDE PRINCIPAL
 Calle 19 No. 3-50 Edificio Bancaria
 Tel: (+1) 281 4505 - 285 5893 - 285 5382

SEDE SUR
 Autopista Sur (Transversal 35) No. 42 Sur.
 Villamayor Tel: (+1) 458 5519 - 263 9064

SEDE CENTRO
 Cra 5 No. 19-06
 Tel: (+1) 282 8429 - 342 4034

SEDE OCCIDENTE
 Av. Cra. 88 No. 17-82
 Tel: (+1) 447 0058 - 447 1401 - 414 8387

SEDE OCCIDENTE
 Av. Cra. 88 No. 17-85
 Tel: (+1) 414 6397 - 280 84

SEDE NORTE
 Autopista Norte No. 83-29
 Tel: 805 1875 - 810 57 71

SEDE NORTE 2
 Autopista Norte No. 83-88
 Tel: (+1) 257 9325 - 258 2362

SEDE ZONA FRANCA
 Carrera 108 No. 15 A - 25 Edificio Bussines Center
 Interior 141 - Oficina 408

BUCARAMANGA
 Calle 55 No 31 - 113, Barrio Antiguo Campestre.
 Tel: (+7) 887 37 34 - 301 737 26 37

VILLAVICENCIO
 Calle 54 No. 41 - 74 Barrio Barzal Alto
 Tel: (+6) 874 0818 - 874 0815

CARTAGENA DE INDIAS
 Avenida Pedro de Heredia, Sector Lo Amador,
 Calle 32 No 20B - 21 Piso 2 Tel: (+5) 844 89 71

SEDE BARRANQUILLA
 Carrera 51B No. 94 - 334 Oficina 504 Centro Medico Vial

SANTA MARTA
 Calle 22 No 14 - 70, Centro Medico
 Perlas del Caribe Tel: (+5) 421 46 44 - 421 85

BUENAVENTURA
 Calle 7 No. 3-11 Oficina 2001 Edificio Pacific
 Trader Center Tel: (+2) 240 4734 - 240 2065

MEDELLIN
 Carrera 50 No. 44 B-91 Barrio la Arrencia
 Tel: (+4) 412 1145 - 418 7011

CALI
 Calle 18 Norte No. 4 N - 47 Barrio Versalles
 Tel: (+2) 380 9856 - 382 7337



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 8-ene-2020

HORA 10:02:25

EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: Harold Dayan Ortiz Quijano

Edad 18 años 10 meses 3 días

Documento de Identificación: CC Número: 1005870912

Cargo AYUDANTE



APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO CON RECOMENDACIONES

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna. 4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos. 7/ Control en EPS para manejo con medicina general. 8/ Se recomienda toma de ecografía de tejidos blandos o pared abdominal. 9/ No cargas mayores a 15 kg

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: NORMAL. OSTEOMUSCULAR: HALLAZGOS REMISION A EPS?: MEDICINA GENERAL.

Tipo de Restricciones:

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Trabajador

Firma

Laura Mercedes Torres Mangones
Especialista en Medicina Ocupacional
R.M. 24643 - U.E. S.O. No. 056

Firma

Nombre:

LAURA MERCEDES TORRES MANGONES

Nombre:

Harold Dayan Ortiz Quijano


RM.

24643

Lic.SO:

CC N°

1005870912



CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 14-ene-2020

HORA 13:48:43

EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC

TIPO DE EXAMEN: INGRESO

INFORMACIÓN GENERAL:

Nombre del Trabajador: David Yezid Peña Socha

Edad 26 años 19 días

Documento de Identificación: CC Número: 1013645972

Cargo AYUDANTE DE OBRA

**APTO PARA LABORAR EN EL CARGO ASIGNADO**

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO**Optometría**

Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

Otras Recomendaciones: 1/ Continuar proceso de selección. 2/ Autocuidado en el sitio de trabajo. 3/ Pausas de vida saludable o pausa activas 15 minutos cada 4 horas (de estiramiento). 4/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna, 5/ Cuidados con la alimentación. 6/ Ejercicio 3 veces a la semana como mínimo 30 minutos. 9/ Consumo de frutas y verduras y alimentación saludable, 10/ Técnica de lavados de manos con el fin de evitar enfermedades respiratorias y diarreicas.

AYUDAS DIAGNOSTICAS PRACTICADAS:

MEDICO: Normal / OSTEOMUSCULAR: Normal / REMISION A EPS?: NO

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"

LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Firma



Dr. Jorge E. Betancourt Plaza
Médico Especialista
Salud Ocupacional
C.C. 1002100011, C.C. 10000007

Nombre: JORGE ENRIQUE BETANCOURT PLAZA

RM. 15344 Llc.SO:


Trabajador

Firma



Nombre: David Yezid Peña Socha

CC N° 1013645972





CONCEPTO DE APTITUD MÉDICA OCUPACIONAL

FECHA 15-ene-2020 HORA 07:55:10
EMPRESA CONSORCIO MALLA VIAL BBC
TIPO DE EXAMEN: INGRESO
INFORMACIÓN GENERAL:
Nombre del Trabajador: Teobaldo Samir Ramos Toro
Edad 24 años 3 meses 20 días
Documento de Identificación: CC Número: 1028023929
Cargo OFICIAL



APTO PARA LABORAR EN CARGO ASIGNADO

Diagnóstico 1: Z100 Examen de salud ocupacional

EXAMENES AUXILIARES DE DIAGNOSTICO

Optometría
Vision Lejana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.
Vision Cercana: CUMPLE CON LAS CONDICIONES VISUALES PARA EL CARGO, USAR MONOGAFAS, USAR FILTROS AR, CONTROL EN UN AÑO.

EXAMEN OSTEOMUSCULAR: OSTEOMUSCULAR: NORMAL / FUERZA: NORMAL / REFLEJOS: NORMAL

Otras Recomendaciones: 1/ Uso de EPPs adecuados a actividad laboral. 2/ Programa de cargas (capacitar) manejo cargas si llega a realizar esta actividad. 3/ Adecuados hábitos posturales para conservar un buen estado de columna. 4/ Uso de bloqueador solar si está expuesto a sol. 5/ Ropa de trabajo acorde a actividad laboral. 6/ Control en IPS con exámenes periódicos.

"El examinado certifica que no omitió ningún dato relevante sobre sus antecedentes ocupacionales, personales y familiares que pudiesen influir sobre su estado de salud, y que toda la información expresada en este documento es cierta"
LOS RESULTADOS FUERON CONSIGNADOS EN UNA HISTORIA CLINICA OCUPACIONAL QUE REPOSA EN NUESTRA IPS

Médico

Laura Mercedes Torres Mangones
Médica
Especialidad y Control en el Trabajo
R.L. 24643 - Lic. S.O. No. 288

Firma

Nombre: LAURA MERCEDES TORRES MANGONES

RM. 24643 Lic. SO: _____

Trabajador

Firma

Nombre: Teobaldo Samir Ramos Toro

CC N° 1028023929





UNIVINO NIÑO JESUS

Unidad Médica de Especialistas

UMED LTDA. I.P.S.

Salud Ocupacional Licencia No. 9511 de 23/08/2013

Lic. Anterior No. 9706 de 05/10/2009

NIT: 830.015.894-4

Código de prestador de servicios de la salud No.110010565901
Aprobado por la Secretaría de Salud de Bogotá según
Resolución No. 1701 de Mayo 26 de 1997
Dra. María Luisa Molina M. CPTP No. 13956-T
Especialista en Gerencia en Salud Ocupacional
Res. 5594 01/08/2005 de la Secretaría de Salud



Nro. 38861

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA LABORAL

FECHA : 21/10/2019 HORA:7:58	EXAMEN: PREOCUPACIONAL O INGRESO
NOMBRES: ROQUE RUFINO HERNANDEZ GOMEZ	DOCUMENTO: 943935711081976
EMPRESA: INDEPENDIENTE	EDAD: 43 GENERO: M
	CARGO: OFICIAL DE CONSTRUCCION
	TELEFONO: 3208236065

EXAMENES LABORALES REALIZADOS

Valoración Médica Laboral	Si	Respiratorio	Si
Espirometría	Si	Dermatología	Si
Audiometría	Si	Osteomuscular	Si
Visiometría	Si	Cardiovascular	Si
Optometría	--	Prueba de equilibrio	Si
Electrocardiograma	Si	Radiología Tórax/corpo	--
Psicología Laboral	--	Radiología Columna	--
Vacunas	--	Radiología Torax	--

LABORATORIO CLÍNICO ESPECIALIZADO

Cuadro Hemático IVG	--	Parcial de Orina	--
Glicemia	Si	RH-Grupo Sanguíneo	--
Colesterol	Si	KOH Uñas	--
Triglicéridos	Si	Frotis Faringeo	--
Serología	--	Coprologico	--

CONCEPTO MÉDICO LABORAL: SE CERTIFICA QUE EL TRABAJADOR ES:

APTO PARA TRABAJOS EN ALTURA Y ESPACIOS CONFINADOS (CURSO SENA)	Si	Segun Res.1409 de julio 23 de 2012
Apto Para el cargo sin Restricciones	Si	Aplazado
Apto Para el Cargo con Restricciones que intervienen con su Trabajo	--	No Apto Para Este Cargo
Apto Para Trabajos en Superficies sin Infradesnível	--	--
Examen PERIODICO Satisfactorio	--	Examen de EGRESO Satisfactorio

RECOMENDACION: 1. USO DE DOBLE PROTECCION AUDITIVA EN AREAS CON RUIDO EN NIVELES SUPERIORES A LOS PERMISIBLES.

RECOMENDACIONES - RESTRICCIONES

Higiene Postural	Si	Uso de Doble Protección Auditiva	Si	Evitar Posturas Prolongadas	Si
Pausas Activas	Si	Control Optométrico Periodico	Si	Uso de Medias de Compresión Graduado	--
Ergonomía del Puesto de trabajo	Si	Uso de Lentes Permanentes	--	Valoración y Manejo en IPS	--
Uso de Elementos de Protección Personal	Si	Uso de Lentes Visión Cercana	Si	Dieta - Ejercicio Físico	Si
Valoración por IPS de Medicina Laboral	--	Control de Tension Arterial	--	Control Espirometría	--
Control Audiométrico	Si	Estilos de Vida Saludable	Si	Control Médico Ocupacional Anual	Si

CONSENTIMIENTO INFORMADO (De lectura Obligatoria)

He comprendido el propósito, los beneficios, la información y los riesgos del examen médico, paraclínico(a) y/o ocupacionales que me van a practicar. Garantizo que las respuestas administradas por mí en estos exámenes y presentes en este documento son veraces y completas. Entendiendo que este consentimiento es voluntario y libre de toda coacción y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento antes de que se realizaran los exámenes, fui informado de las medidas que el profesional de salud ocupacional de UMED LTDA. tomará para proteger la confidencialidad de la información allí expuesta. Los autorizo para que den a conocer por cualquier medio electrónico o físico la información registrada de esta persona o entidad contemplada en la legislación actual vigente, para el buen cumplimiento del programa de salud ocupacional de la empresa y de los cuales recibirá los resultados y aseguro estar de acuerdo con el proceso. Hago constar con mis firmas que he leído y comprendido a la perfección lo anterior y que estoy en la capacidad de manifestar mi libre consentimiento.

NESTOR RAUL GARZON ROBRIGUEZ
LICENCIA No. 5660 DE 30/07/2019
Médico Especialista en Salud Ocupacional

Firma Trabajador

C.C. No

801

Realice sus exámenes en Instituciones médicas
aprobadas por la Secretaría Distrital de Salud:
UMED LTDA. I.P.S. Salud Ocupacional

Carrera 21 No. 26-00/06 Sur
Tels: 278 5555 - 366 5291 - 239 1657 - 272 9937
Fax: 239 0086
umedltda@gmail.com
www.umedips.com

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 08. REGISTRO DE INDUCCIONES Y NOTIFICACION DE RIESGOS

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la inducción: 16-01-2020	Lugar: PUNTO CREA
--------------------------------------	----------------------

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Frank martinez	1023979387	BUAL		COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de inducción en SG-SST:

☒

Reinducción en SG-SST:

☐

Otros:

☐

Otros temas tratados en la inducción:

Política ASE
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

OTROS DATOS DEL PERSONAL QUE REALIZÓ LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
SIACON EDUARDO SERRANO	Residente SST	

FECHA: 16-01-2010 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Frank Nardini IDENTIFICACIÓN: 1023979387
CARGO: BOAL

Físico	Ruido		✓
	Vibración		✓
	Radiaciones ionizantes	Computador	✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓
	Material particulado		✓
Químicos	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓
	Líquidos		✓
	Vapores		✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓
	Hongos		✓
Mecánicos	Herramientas manuales		✓
	Equipos o elementos a presión		✓
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía	✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓
	Carga estática	Computador	✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓
Locativos	Orden y aseo		✓
	Caidas a nivel		✓
	Caidas a diferente nivel		✓
	Iluminación		✓
	Ventilación		✓
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas	✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓
Sociales	Atentados		✓
Transito	Robos, atracos, inseguridad		✓
	Atropellamientos		✓

Fuí notificado,


Firma

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción: 10-01-2020 Lugar: PUERTO CREA

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
<u>Rogelio Hernandez</u>	<u>94393571</u> <u>1081976</u>	<u>Oficial</u>	<u>Rogelio Hernandez</u>	<u>COP-340-2019</u>

TEMAS TRATADOS EN LA INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Inducción en SG-SST:

☒

Inducción en SG-SST:

☐

Otros:

☐

Los temas tratados en la inducción:

<u>Políticas HSE - Reglamento SST</u>
<u>Trabajo Seguro</u>
<u>Cuidado EPP</u>

Observaciones:

DATOS DE LOS RESPONSABLES DE LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
<u>Alfonso Edmundo Serrano</u>	<u>Residente SST</u>	<u>[Firma]</u>



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA:

16-01-2020

CONTRATO:

COP-340-2019

NOMBRE:

Rogelio Hernandez

IDENTIFICACIÓN: 943935711081926

CARGO:

Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energia		✓
	Baja tensión	Redes de energia	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
Psicolaborales	Ventilación		✓	
	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
Naturales	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

Firma

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la inducción:

10-01-2020

Lugar:

PUNTO CREC

PERSONAS QUE RECIBEN LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Shirley Fanny Gomez	93412459	Oficial	<i>[Firma]</i>	COP-340-2019

TEMAS DE LA INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST:

☒

Inducción en SG-SST:

☐

Otros:

☐

Temas tratados en la inducción:

Políticas HSC
Tecnicas Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

PERSONAS QUE REALIZAN LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Mon Edmundo Serrano	Residente SST	<i>[Firma]</i>

FECHA: 10-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Jha Ardy Gomez IDENTIFICACIÓN: 93412459
CARGO: oficial.

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión			✓
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerarquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fué notificado,


Firma



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la Inducción:

13-01-2020

Lugar:

Punto CRA

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Elmer Ernesto Rodríguez	79 829 391	Oficial	X <i>[Firma]</i>	COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST:



Inducción en SG-SST:

☐

Otros:

☐

Los temas tratados en la Inducción:

Política HSE - Reglamento
Trabajo Seguro
Cultura EPR

Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
Elmer EDWIN SERRANO	Residente SST	<i>[Firma]</i>

FECHA: 13-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Elmer Ernesto Rodríguez IDENTIFICACIÓN: 79829571
CARGO: Oficial

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos			✓
	Vapores			✓
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado,

x 
Firma



INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la inducción: 16-01-2020	Lugar: Punto CREA
--------------------------------------	----------------------

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Jessy Ferraz Gomez	1105616200	Asistente	X Jessy F. Gomez	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST:	☒
Reinducción en SG-SST:	☐
Otros:	☐

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE
Trabajo Seguro.
Cuidado BPP.

Observaciones:

/
/
/

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
JHON EDWIN SANCHEZ	Residente SST	[Firma]
/	/	/
/	/	/



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 16-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Jelson Fernando Gomez IDENTIFICACIÓN: 1105616 200
CARGO: Oficial Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado, X Jelson Fernando Gomez
Firma



INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

FECHAS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción: 20-01-2020	Lugar: Puerto CREA
--------------------------------------	-----------------------

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Luis Miguel HERRERA GILLES	18969178	Ayudante	Luis Miguel H	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☒

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSC
Tecno Seguro
Código ERP

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZAN LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Juan Edwin Serrano	Residente SST	[Firma]



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 20-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Luis Miguel Herrera C IDENTIFICACIÓN: 18969178
CARGO: Ayudante

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
	Ventilación		✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fuí notificado, Luis Miguel Herrera
Firma



INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la Inducción: 15-01-2020	Lugar: PUNTO CREA
--------------------------------------	----------------------

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Angel Jesus Espitia Guinda	1010010098	operario	Angel Espitia	COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☒

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐

Otros temas tratados en la inducción:

Políticas HSE - Reglamento SST
Tre Sego Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
JHEN EDWIN SEPANZO	Residente SST	[Firma]

FECHA: 15-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Angel Jesus Espino IDENTIFICACIÓN: 1010010098
CARGO: Operador

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
Psicolaborales	Ventilación		✓	
	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas	✓	
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado,

Angel Jesus Espino
Firma



INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la Inducción: 09-01-2020	Lugar: PUERTO CREA
--------------------------------------	-----------------------

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Harold Oyarza Ortiz	1005870912	Asistente	Harold Ortiz O.	COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST:	☒
Reinducción en SG-SST:	☐
Otros:	☐

Otros temas tratados en la inducción:

política HSC
Trabajo Seguro
Cuidado EPP

Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
JHOR EDUARDO SERRATO	Presidente SST	



CONSORCIO
MALLA VIAL BDC
CO-340-2019 - FDLSC

FECHA: 07.01.2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Harold Dejen Ortiz IDENTIFICACIÓN: 1005870912
CARGO: Asistente

Clase de Riesgo		Aplica	
		SI	NO
Físico	Ruido	✓	
	Vibración	✓	
	Radiaciones ionizantes		✓
	Radiaciones no ionizantes		
	Material particulado	✓	
	Temperaturas extremas	✓	
Químicos	Líquidos	✓	
	Vapores	✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	✓	
	Hongos	✓	
Mecánicos	Herramientas manuales	✓	
	Equipos o elementos a presión	✓	
	Mecanismos en movimiento	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión		✓
	Baja tensión	✓	
	Carga estática		✓
Ergonómicos	Carga estática	✓	
	Carga dinámica	✓	
	Orden y aseo	✓	
Locativos	Caidas a nivel	✓	
	Caidas a diferente nivel	✓	
	Iluminación	✓	
	Ventilación	✓	
Psicolaborales	Contenido de la tarea		✓
	Relaciones Humanas		✓
Naturales	Terremotos o sismos	✓	
Sociales	Atentados	✓	
	Robos, atracos, inseguridad	✓	
Transito	Atropellamientos	✓	

Fuí notificado, x Harold Ortiz O.
Firma



INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

Fecha de la inducción: 14-01-2020	Lugar: PUERTO CACA
--------------------------------------	-----------------------

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
David Yezid Risco	1013645 992	A. gerente		COP-340-2019

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST:	☒
Reinducción en SG-SST:	☐
Otros:	☐

Otros temas tratados en la inducción:

Política ASE, Reglamento SST
Trabajo Seguro
Cuidado EPP


Observaciones:

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Sennar	Presidente SST	

FECHA: 14-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: David Yezid Rincón IDENTIFICACIÓN: 1013645722
CARGO: Ayudante

Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
Psicolaborales	Ventilación		✓	
	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento		✓
	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas		✓
Naturales	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
	Robos, atracos, inseguridad		✓	
Transito	Atropellamientos		✓	

Fui notificado,


Firma



INDUCCIÓN DEL SG-SST

Código	FT-SST-IND
Página	1 de 1
Revisión	0
Fecha	sep-19

DATOS DE LA INDUCCIÓN

Fecha de la Inducción: 17-01-2020	Lugar: Puerto CREA
--------------------------------------	-----------------------

DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE LA INDUCCIÓN

NOMBRE	CEDULA	CARGO	FIRMA	PROYECTO
Trebolado Serrano Romos	1028 023 929	Oficial.	X [Firma]	COP-340-2019

TEMAS DE INDUCCIÓN

Los temas que se trataron en la presente inducción han sido desarrollados en busca del conocimiento y el entendimiento de la política de la empresa.

Marque con una "X" el tema el tipo de inducción realizada.

Programa de Inducción en SG-SST: ☒

Reinducción en SG-SST: ☐

Otros: ☐

Otros temas tratados en la Inducción:

Políticas HSE
Trecho Seguro
Cuidado EPP.

Observaciones:

DATOS DE LAS PERSONAS QUE REALIZA LA INDUCCIÓN

Nombre	Cargo	Firma
Jhon Edwin Serrano	Presidente SST	[Firma]

NOTIFICACIÓN AL RIESGO

FECHA: 17-01-2020 CONTRATO: COP-340-2019
NOMBRE: Reinaldo Sanz Rojas IDENTIFICACIÓN: 1028023929
CARGO: Oficial

Clase de riesgo	Riesgo	Fuente	Aplica	
			SI	NO
Físico	Ruido		✓	
	Vibración		✓	
	Radiaciones ionizantes	Computador		✓
	Radiaciones no ionizantes	Sol	✓	
	Material particulado		✓	
	Temperaturas extremas	Trabajos nocturnos	✓	
Químicos	Líquidos		✓	
	Vapores		✓	
Físico-Químico	Incendio y/o explosión	Manipulación de redes	✓	
Biológicos	Bacterias- Virus	Mordedura de animales, gripas	✓	
	Hongos		✓	
Mecánicos	Herramientas manuales		✓	
	Equipos o elementos a presión		✓	
	Mecanismos en movimiento	Maquinaria de obra	✓	
Eléctricos	Alta y media tensión	Redes de energía		✓
	Baja tensión	Redes de energía	✓	
	Carga estática	Computador		✓
Ergonómicos	Carga estática	Posición de sentado o de pie	✓	
	Carga dinámica	Largos desplazamientos con o sin carga	✓	
Locativos	Orden y aseo		✓	
	Caidas a nivel		✓	
	Caidas a diferente nivel		✓	
	Iluminación		✓	
Psicolaborales	Ventilación		✓	
	Contenido de la tarea	Alta responsabilidad y cumplimiento	✓	
Naturales	Relaciones Humanas	Relaciones jerárquicas	✓	
	Terremotos o sismos		✓	
Sociales	Atentados		✓	
Transito	Robos, atracos, inseguridad		✓	
	Atropellamientos		✓	

Fui notificado,


Firma



2506 2657

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 09. ACTA REUNION MENSUAL COPASST

292

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTT 901 310 904-1	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE ACTA DE REUNIÓN COPASST	Contrato de Obra No. 340-2019- FDLSC
---	---	---

OBJETIVO * Evaluar la Gestión Desarrollada en SST * Elegir el representante de los trabajadores		
FECHA: 28-01-2020	HORA INICIO: 2:30 pm	LUGAR: PUNTO CREA
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Robert Steven Bolaños	Representante Empresa	Robert B.
Graciela Molina	Representante trabajadores	
Johan Edwin Serrano	profesional SST	
		
ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN		
Se inicia la reunión siendo las <u>2:30 pm</u> , el (la) presidente(a) del COPASST <u>Graciela Molina</u> indica el siguiente orden: 1. Lectura del acta anterior 2. Revisión de cumplimiento de las tareas 3. Debate sobre los aspectos positivos y/o negativos en temas de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente identificados durante la ejecución de las actividades de obra.		
DESARROLLO DE LA REUNION		
* El profesional SST del consorcio malla vial BBC, evalúa el comportamiento de los trabajadores en la aplicación de trabajo seguro. Como particular el accidente ocurrido el día 27-01-2020 donde un trabajador sufrió una laceración en el dedo pulgar mano derecha por la no utilización de guantes		



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
NIT 901.310.904.1

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD
EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

ACTA DE REUNIÓN COPASST

Contrato de Obra
No. 340-2019-
FDLSC

- * Debido al retiro del trabajador Higinio Contreras, quien se desempeña como representante de los trabajadores; el suplente toma su lugar, quedando como nuevo representante de los trabajadores a Graciela Molina.
- * Debido al retiro del representante de los trabajadores y que a su vez era el presidente del copasst, se elige a Graciela Molina como nueva presidenta.
- * Se efectúa una inspección planeada a los frentes de obra, evidenciándose el cumplimiento del mismo.
- * En la parte Ambiental se destacan las actividades a la protección y mitigación de los aspectos ambientales generados por la obra.

PLAN DE ACCIÓN		
TAREA	RESPONSABLE	FECHA
Reinducción uso obligatorio EPP	Profesional SST	3-08 de febrero/2020
Seguimiento uso EPP	Profesional SST Residente - inspector	Próximamente.
HORA DE FINALIZACIÓN:	3:30 pm	
ACTA ELABORADA POR:	Jhon Edwin Separete.	

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 001.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 10. PLANILLA ENTREGA EPP

2660
2559
295

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
09-2020	Sosa Antonio G. V. ANY A.	1.033.780.763	X	X		X	X	X	X			G. V. ANY A.
09-2020	Havol Dathan ortiz G.	1.005.070.912	X	X		X	X	X	X			Havol ortiz
10-1-20	Jhon Fredy GOMEZ	93412452	X	X		X	X	X	X			Jhon Fredy GOMEZ
10-1-20	Roger Hernandez	91393571 1081976	X	X		X	X	X	X			Roger Hernandez
10-1-20	Yelson Rodriguez	85.813.952		X								Yelson Rodriguez
13-1-20	Elmer Ernesto Rodriguez	79.829.321				X	X	X	X			Elmer Ernesto Rodriguez
13-1-20	Cesar Castro	5.888.112				X						Cesar Castro
13-1-20	Jairo Perez	95233141804199		X								Jairo Perez
13-1-20	Manuel Villa	84.049.769				X						Manuel Villa
14-1-20	YIMIS	73166.160	X			X		X	X			YIMIS
15-1-20	David Yeta	1013.645.972	X			X	X	X	X			David Yeta
15-1-20	Angel Espino	1.610.010.090		X		X		X				Angel Espino
16-1-20	Cristian Poveda	1.023.918.120					X					Cristian Poveda

RESPONSABLE DE ENTREGA: EDUARDO SERRANO

FIRMA:

[Signature]

48 F.
OPI. A
38 F.
OPI. B

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FOLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
01-1-2020	Jelson Fernando Gomez	715616200	+	+	+	+		+	+			Jelson Fernando Gomez
16-1-20	Cristobal Sosa	19181-504				X						X Cristobal Sosa
16-1-20	Roque Hernandez	943935711081936	X			X						X Roque Hernandez
16-1-20	Frank Martinez	1023979387	X			X	X	X	X			X Frank Martinez
17-1-20	Samir Rojas	1028023929	X	X		X	X	X	X			X Samir Rojas
18-1-20	Jorge Pardo	79944.601				X						X Jorge Pardo
18-1-20	Yelson Rodriguez	80813952				X						X Yelson Rodriguez
18-1-20	Jorge Pardo	79944.601					X					X Jorge Pardo
20-1-20	Luis Miguel Herrera	18969178	X	X			X	X	X			X Luis Miguel Herrera
21-1-20	Jhon Fredy Gomez	93412459					X		X			X Jhon Fredy Gomez
22-1-20	Graciela Molina	51607391		X								X Graciela Molina
22-1-20	Cristian Pavaon	1023936170		X								X Cristian Pavaon
23-1-20	Angel Orjuela	1023941712	X		X							X Angel Orjuela

RESPONSABLE DE ENTREGA: EDUARDO SERRANO

FIRMA:

[Handwritten signature]

2560266T 296

CONTROL DE DOTACIÓN PARA EL PERSONAL DE OBRA



CONSORCIO
MALLA VIAL BBC
CO-340-2019 - FDLSC

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3

CONTRATO: COP-340-2019

FECHA	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	DOTACIÓN									FIRMA
			OVEROL	BOTAS DE SEGURIDAD	CASCO	GUANTES	PROTECCION RESPIRATORIA	PROTECTOR AUDITIVO	GAFAS	ARNES	OTRO	
22-1-20	Groculu	51.607.391				X						
22-1-20	Cristian Pabon	1.023.936.170				X						x
23-1-20	Dayron Andra Escobar	1.012.401.548		X								x
25-1-20	Orlando Medina	1039094.149	X	X		X	X	X	X			x
25-1-20	Frank Mendinet	1023.979.387		X								x
27-1-20	Cristian Pabon	1.023.936.170									X	x
27-1-20	Julio Cesar Lopez	1.047.238.59				X						x
27-1-20	Jorge Prada	79944.601				X						x
28-1-20	JAVIER JIMENEZ	1107814.649				X						x
28-1-20	EASTIAN LOVEDA	1.023.918.170		X								x
28-1-20	Manuel Villa	84049.759				X						x
28-1-20	Julio Cesar Lopez	1.047.238.59		X								x

F. A. Lopez
Cesar
OPINION
MANOS
POCITO

RESPONSABLE DE ENTREGA:

Jhon Edwin SANCHEZ

FIRMA:

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTI. 901.810 904-1
<i>Contrato de Obra No.</i> 340 – 2019 - FDLSC	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de</i> 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 11. REGISTRÓ INSPECCION PLANEADA Y CAPACITACIONES

 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC		VERIFICACIÓN DE USO DE EPP										FT-SST-VER-EPP	
												Versión 0	
FECHA	NOMBRE	CARGO	GU	GA	TP	PA	CS	AR	BT	OV	CH	OBSERVACIONES	
28-01-2020	Eder Yate	Ayudante	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Alvaro Cernaacho	Ayudante	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Yerson Yair Rodriguez	Ayudante.	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Luis Alberto Ros.	Ayudante.	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Pablo Funitro Wungo 2	Oficial	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Roque Rufino Hernandez	Oficial	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Yhon Freddy Gomez	Oficial	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Gluer Ernesto Rodriguez	Oficial.	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Geisson Fernando Gomez	Ayudante	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		
28-01-2020	Luis Miguel Herrera C	Ayudante.	/	/	/	/	/	NA	/	/	NA		

V - Cumple

GU: GUANTES

GA: GAFAS

X- No cumple

PA: PROTECTORES AUDITIVOS

CS: CASCO

OV: OVEROL


CH: CHALECO

TP: TABAOCAS

BT: BOTAS


AR: ARNÉS

Responsable Contratista:



 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC			VERIFICACIÓN DE USO DE EPP										FT-SST-VER-EPP	
													Versión 0	
FECHA	NOMBRE	CARGO	GU	GA	TP	PA	CS	AR	BT	OV	CH	OBSERVACIONES		
28-01-2020	Constobal Sosa Sosa	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	N.A	✓	✓	N.A			
28-01-2020	Eugenio Garcia Euan	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Cesar Augusto Castro	Maestro	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Julio Cesar Vargas	Maestro	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Jairo Bariera Uelandia	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Manuel de Jesús Villa	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Victor Manuel Delgado	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Javier Jimenez Bohorquez	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Yorney Escobar	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Bayron Andres Gutierrez	Ayudante	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Julio Cesar López C	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
28-01-2020	Jorge Alvaro Pardo	Oficial	✓	✓	✓	✓	✓	NA	✓	✓	NA			
✓ - Cumple			X- No cumple											
GU: GUANTES			PA: PROTECTORES AUDITIVOS			OV: OVEROL			TP: TABAOCAS			AR: ARNÉS		
GA: GAFAS			CS: CASCO			CH: CHALECO			BT: BOTAS					

Responsable Contratista:



 CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO	FT-SST-INSPECCION
		Versión 0

FECHA: 28-06-2020
 UBICACIÓN: Componentes y Ciu Interunidos
 INSPECCIÓN REALIZADA POR: EDWIN SANCHEZ
 2 Cumple Totalmente 1 Cumple Parcialmente 0 No Cumple

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS LOCATIVAS	ORDEN	1. Los pisos, pasillos y/o vías de acceso o evacuación están libres de materiales innecesarios que puedan obstruir o dificultar el paso de personas, equipos o materiales. Se encuentran libres de agua.	2	2
		2. Las paredes, puertas, ventanas están libres de objetos (colgantes, armados, etc.), sin riesgos de agrietamiento.	2	2
		3. El área donde se encuentra trabajando se encuentra organizada libre de obstáculos y líquidos vertidos en el piso.	2	2
	LIMPIEZA	4. Los pisos y paredes se encuentran limpios, secos y señalizados.	2	1
		5. El área donde se encuentra trabajando está limpia.	2	2
		TOTAL		9
		Porcentaje de	90%	
OBSERVACIONES				

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
MATERIAS PRIMAS	CLASIFICAR	1. La cantidad de materias primas, productos no exceden la cantidad necesaria para el proceso (máx. Días jornadas de trabajo).	2	2
	ORDEN	2. Los apilamientos de materia prima no exceden los 2.00 mt de altura.	2	2
		3. La materia prima almacenada se encuentra apilada sobre estibas y está señalizada.	2	1
	LIMPIEZA	4. La materia prima o productos se encuentran limpios y están protegidos contra polvos o contaminantes.	2	2
TOTAL				7
			Porcentaje de	90%
OBSERVACIONES: Algunos materiales no están sobre estibas.				

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
PERSONAS	LIMPIEZA	1. Los colaboradores tienen su uniforme limpio, de acuerdo a su trabajo.	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2. Tiene los elementos de protección personal necesarios y los utilizan correctamente.	2	2
TOTAL				4
			Porcentaje de	100%
OBSERVACIONES				

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
MAQUINARIA Y EQUIPOS	LIMPIEZA	1. Las máquinas y sus dispositivos están limpios, libres de polvo, aceite, grasa.	2	2
	BIENESTAR PERSONAL	2. La parte eléctrica se encuentra en buenas condiciones brindando seguridad al operario.	2	2
TOTAL				4
			Porcentaje de	100%
OBSERVACIONES				



CONSORCIO
MALLA VIAL 88C
CO-340-2019 - FDLSC

INSPECCIÓN PLANEADA DE SEGURIDAD PUESTOS DE TRABAJO

FT-SST-INSPECCION

Versión 0

FECHA: 28-01-2020

UBICACIÓN: Compañía y CIV 12 km. Unidos

INSPECCIÓN REALIZADA POR: Edna Serrano

2 Cumple Totalmente 1 Cumple Parcialmente 0 No Cumple

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
HERRAMIENTA	ORDEN	1. Las herramientas están ubicadas en gavetas, tableros u otros dispositivos que permitan dejarlas organizadas y listas para usarse nuevamente	2	2
	LIMPIEZA	2. Las herramientas se mantienen y guardan limpias	2	2
TOTAL				4
Porcentaje de				100%
OBSERVACIONES				

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
ÁREAS SANITARIAS	ORDEN	1. Los servicios sanitarios están libres de elementos innecesarios y los objetos con los que cuenta permanecen en su lugar	2	2
		2. Los guarderope se encuentran libres de elementos innecesarios	2	2
	LIMPIEZA	3. Los servicios sanitarios y guarderope permanecen limpios, libres de plagas y basura	2	2
		4. Las fuentes de consumo de agua son aptas para el consumo	2	2
				TOTAL
		Porcentaje de	100%	
OBSERVACIONES				

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
MANEJO DE RESIDUOS	CLASIFICAR	1. Los residuos y basuras se clasifican según con lo establecido en el programa de manejo de residuos (código de colores), se disponen en canecas debidamente señalizadas	2	2
	ORDEN	2. Las canecas de disposición de residuos se encuentran ubicadas cerca a las fuentes de generación de estos y no obstruyen las vías de circulación	2	2
	LIMPIEZA	3. La zona alrededor de los recipientes está limpia y se evita el reboso de las canecas y no se generan malos olores	2	2
TOTAL				6
Porcentaje de				100%
OBSERVACIONES				

ESTANDAR ORDEN Y ASEO			CALIFICACIÓN	
			VALOR ESPERADO	VALOR OBTENIDO
SEÑALIZACIÓN Y EXTINTORES	CLASIFICAR	1. El tipo y número de señalización de los extintores existentes son necesarios para el trabajo que se realiza y cumple con los estándares de seguridad	2	2
		2. La señalización en el área de trabajo es la adecuada de acuerdo a la actividad desarrollada	2	2
	ORDEN	3. La ubicación de los extintores permite su fácil visualización y acceso	2	2
		4. La señalización no se encuentra obstruida y permite su fácil visualización	2	2
	LIMPIEZA	5. Los extintores y la señalización se encuentran limpios y libres de polvo grasa, etc.	2	2
TOTAL				10
Porcentaje de				100%
OBSERVACIONES				

2564 2565

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT. 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 12. FORMATO MENSUAL DE AT.

300

FORMATO CONSOLIDADO INDICADORES DE SST



CONTRATO N°: COP-340 DE 2019

OBJETO

OBJETO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

PERIODO DEL INFORME: 30 DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020

PERIODO	No. DE TRABAJADORES	HHT	No. DE ACCIDENTES LABORALES			DÍAS PERDIDOS Y/O CARGADOS	FAL	SAL	MAL	PEL	IEL	AL
			Con Tiempo perdido	sin tiempo perdido	Total							
30 AGOSTO AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019	5	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 SEPTIEMBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2019	6	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019	23	4416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2019	47	9024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020	56	10752	1	0	1	8	22	179	0	0	0	3,3

HHT: Horas hombre trabajadas (No.trabajadores*días trabajados*horas trabajadas-incapacidades-permisos)

Frecuencia de Accidente Laborales: FAL: (No. de accidentes/HHT)*K

Severidad de Accidentes Laborales: SAL: (No. días de perdidos + Días cargados/HHT)*K

K : 240.000

Mortalidad de Accidentes Laborales: MAL: (No. de accidentes mortales/No. total de accidentes)*100

Prevalencia de Enfermedad Laboral: PEL: (No. de casos nuevos + antiguos de EL / Promedio de trabajadores)*100

Incidencia de Enfermedad Laboral: IEL: (No. de casos nuevos de EL / Promedio de trabajadores)*100

Ausentismo Laboral: AL: (No. de días de ausencia por incapacidad laboral y común / No. días trabajados)*100

(Firma)

Profesional SST Contratista

(Firma)

Profesional SST Interventoría

FORMATO DE INFORME PARA ACCIDENTE DE TRABAJO DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE

Diligenciado Por Formulario Web - AGUIRRE CIFUEN EPS NUEVA E.P.S S.A.

AFP PORVENIR S.A.

ARL POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A./ARL

I IDENTIFICACION GENERAL DEL EMPLEADOR CONTRATANTE O COOPERATIVA

No documento	Tipo de Doc	Nombre o razon social	Tipo de vinculación	
900678572	N	SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y DISEÑO S.A.S	Empleador	
Dirección sede principal		Dirección reportada		
CL 147 13 67AP340				
Actividad económica (Sede principal)				Código
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION				5742101
Teléfono	Fax	E-mail	Departamento	Municipio
3208230046		fcardonacorrea@gmail.com	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.
			Zona	
			Urbana	

Son los datos del C.T. los mismos de la sede principal? Dirección del centro de trabajo
SI CL 147 13 67AP340

Actividad económica del centro de trabajo		Código
EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ACTIVIDADES CONEXAS DE ASESORAMIENTO TECNICO INCLUYE SOLAMENTE EMPRESAS DEDICADAS A ACTIVIDADES DE OBRA DE CONSTRUCCION		5742101
Teléfono	Fax	E-mail
3208230046		
Departamento		Municipio
BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.
Zona		
Urbana		

II INFORMACION DE LA PERSONA QUE SE ACCIDENTO

No documento	Tipo de Doc	Fecha de nacimiento	Sexo	Tipo de vinculación
1012401547	C	05/08/1993	M	(1) Planta
Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	
GUTIERREZ	ESCOBAR	BAYRON	ANDRES	
Dirección		Teléfono		
CRA 81 NO 73A-37		3208280862		
Departamento		Municipio	Zona	Fecha de ingreso a la empresa
BOGOTA D.C.		BOGOTA D.C.	Urbana	11/10/2018
Ocupación	Salario mensual		Jornada habitual	
OBREROS DE LA CONSTRUCCION	828.116		(1) Diurna	
			Código	
			1962	

III INFORMACION SOBRE EL ACCIDENTE DE TRABAJO (AT)

Fecha del accidente	Hora del accidente	Día de la semana	Jornada en que sucede	Realiza su labor
27/01/2020	11:10	Lunes	(1) Normal	(1) SI
Ocupación no habitual	Tiempo laborado		Lugar donde ocurre el AT	
	04:10		(1) Dentro de la empresa	
Mecanismo o forma del AT	Tipo de lesión	Sitio	Tipo de accidente	
(3) Pisadas, choques o golpes	(55) Golpe o Contusión	(2) Areas de produccion	(5) Propios del trabajo	
Parte del cuerpo afectada	Agente del accidente			
(446) Manos	(336) Herramientas, implementos o utensilios			
Departamento	Municipio	Zona AT	Mortal	Fecha mortal
BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	Urbana	(2)No	

IV DESCRIPCION DEL ACCIDENTE

EL TRABAJADOR SE ENCONTRABA TRANSPORTANDO UNA MEZCLA DE CONCRETO EN UN BALDE PARA COLOCAR UN MURO, EN ESE MOMENTO SE SUELTA EL GANCHO QUE SOSTIENE LA CANECA OCASIONÁNDOSE UNA LACERACIÓN EN EL DEDO 1 DE LA MANO DERECHA, PRESENTA INFLAMACIÓN Y DOLOR.

CARGO: AYUDANTE DE OBRA

DIRECCIÓN: TRANSVERSAL 16C ESTE #43A-05 SUR BARRIO ALTOS DEL VIRREY BOGOTÁ

Datos del jefe inmediato

Nombres	Apellidos	Correo electrónico	Teléfono
---------	-----------	--------------------	----------

Hubo personas que presenciaron el accidente? SI

Testigos 1 JHON EDWIN SERRATO VALENCIA

Tipo Doc C N° Doc 3135316

Testigos 2

Tipo Doc N° Doc

Responsable ADRIANA EDITH PENAGOS SIERRA Firma

Tipo Doc C N° Doc 52537070

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MT. 901.310 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 13. FORMATO REGISTRO MEDEVAC.

Alcaldía de Bogotá	INFORME AMBIENTAL Y SG-SST No. 05	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MTT, 901.110.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 – FDLSC</i>	<i>Del 30 de diciembre/2019 al 29 de enero de 2020</i>	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 14. REPORTE RCD – DICIEMBRE 2019

258
262

ARCHIVO LINEAL - SDA

MES	AÑO	CANTIDAD RESIDUOS PETREOS	UNIDADES RESIDUOS PETREOS	TIPO DE RESIDUOS PETREOS	CANTIDAD DE RESIDUOS FINOS NO EXPANSIVOS	UNIDAD DE RESIDUOS FINOS NO EXPANSIVO	TIPO DE RESIDUOS FINO NO EXPANSIVO	CANTIDAD DE RESIDUOS FINOS EXPANSIVOS	UNIDAD DE RESIDUOS FINOS EXPANSIVO	TIPO DE RESIDUOS FINO EXPANSIVO	CANTIDAD DE RESIDUOS NO PETREOS	UNIDAD DE RESIDUOS NO PETREOS	TIPO DE RESIDUOS NO PETREOS	CANTIDAD DE RESIDUOS METALES	UNIDAD DE RESIDUOS METALES	TIPO RESIDUOS METALES	CANTIDAD DE RESIDUOS PISCINAS	UNIDAD DE RESIDUOS PISCINAS	TIPO RESIDUOS PISCINAS
SEPTIEMBRE	2019	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA
OCTUBRE	2019	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA
NOVIEMBRE	2019	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA
DICIEMBRE	2019	0	TONELADAS	NO APLICA	765	TONELADAS	NO APROVECHABLET	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA

305

ARCHIVO LINEAL - SDA

CANTIDAD DE RESIDUOS RESPIDONES	UNIDAD DE RESIDUOS RESPIDONES	TIPO DE RESIDUOS RESPIDONES	CANTIDAD DE RESIDUOS ESPECIALES	UNIDAD RESIDUOS ESPECIALES	TIPO DE RESIDUOS ESPECIALES	CANTIDAD TOTAL DE RESIDUOS	GASTOS MENSUALES DE LA IMPLEMENTACIÓN RCD	PRESUPUESTO PLANEADO PARA EL RCD	EFICIENCIA	CANTIDAD DE RESIDUOS APROVECHADOS EN LA OBRA POR MES (Ton)	CANTIDAD DE MATERIAL USADO PARA LA REDUCCIÓN DE LA OBRA (Ton)	EFICACIA	CANTIDAD DE RCD DESPUÉS EN SITIOS AUTORIZADOS DURANTE EL MES (Ton)	CANTIDAD ESTIMADA DE RCD A GENERAR EN EL MES (Ton)	EFFECTIVIDAD	CERTIFICADO SITIO DE DISPOSICIÓN
0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	\$ -	\$ 256.915.196	0,00	0	0	0,00%	0	1829	0,0	NO APLICA
0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	\$ -	\$ 256.915.196	0,00	0	0	0,00%	0	1829	0,0	NO APLICA
0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	\$ 1.900.000	\$ 256.915.196	0,58%	0	0	0,00%	0	1829	0,0	NO APLICA
0	TONELADAS	NO APLICA	0	TONELADAS	NO APLICA	0	\$ 26.083.440	\$ 256.915.196	10,15%	0	\$ 77.0975	0%	765	1829	41,83%	APLICA



ANEXO. 3 INFORME DE APROVECHAMIENTO IN SITU

PERIODO: DICIEMBRE DE 2019


Nombre del Proyecto: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRSITOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3".

PIN: 17853

1. Registro fotográfico del "antes" del sitio que va a ser usado para la reutilización, con referencia de la zona:



2. Esquema del área a usar para la reutilización de los RCD's:



Altura: H



Ancho: A

Largo: L



3. Tipo de material a emplear en la reutilización:

4. Descripción del proceso a realizar: Definir el origen del residuo y el coeficiente de compactación del material.

5. Registro fotográfico durante la reutilización:



6. Registro fotográfico de la finalización del proceso de reutilización:



7. Volumen total reutilizado: 0 (m³)

8. Duración del proceso: 1 (meses)

9. Área final recuperada: 0 (m²)

10. Valor del % de la reutilización, respecto al total del material utilizado para la construcción de la obra: 0,0 (%)

11. Comentarios, Conclusiones y/o Justificación por no hacer reutilización:

Durante el mes de diciembre de 2019, no se reutilizo material, debido a que el material excavado no cumple con las especificaciones técnicas para su aprovechamiento, por lo anterior todo el material se dispuso en escombrera autorizada.

Firma del Representante Legal o Director de obra

Nota: El registro fotográfico debe tener la fecha y hora de toma.

fecha_transp	placa_transp	pin_transport	clasif_sitio	di_etapa	RCD	responsable	nombre_sitio	dir_sitio	recep
9/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
11/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
12/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
13/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
13/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
13/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
14/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
16/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
16/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
17/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
17/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
20/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
23/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
26/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
26/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
26/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
26/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
27/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
27/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
27/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
27/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
28/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
28/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
23/12/2019	SWL435	4041	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
23/12/2019	SWL435	4041	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
23/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
7/12/2019	TKF279	9306	3	2	CONSORCIO	REX_INGENIE	Av_Boyacá_N_73_00_Sur		
16/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	CEMEX	Av_Llano_Sur_72_04		
20/12/2019	SVB886	11632	3	2	CONSORCIO	CEMEX	Av_Llano_Sur_72_04		
23/12/2019	XIJ350	14138	3	2	CONSORCIO	CEMEX	Av_Llano_Sur_72_04		


CONSORCIO MALLA VIAL BBC

CERTIFICA QUE:

Dentro del contrato de obra N° 340 -2019 CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACION Y/O ACTUALIZACION Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL, EN BOGOTA D.C GRUPO 3", durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, se realizaron actividades que generaron RCD, por lo anterior el reporte de este mes para los RCD del contrato es de **450 m³** de material dispuesto en escombrera autorizada.

En constancia de lo anterior se firma a los veintinueve (29) días del mes de enero de 2020.

Cordialmente,



OLIVERIO BONILLA HOYOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO MALLA VIAL BBC

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

ALCALDÍA LOCAL DE SAN CRISTÓBAL
INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5



“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”.

CONSORCIO MALLA VIAL BBC

COP-340-2019

Bogotá, D.C. Período (30 de Diciembre de 2019 al 29 Enero de 2020)

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-2
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5



CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTÓBAL

COP-340-2019

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC

INTERVENTORÍA: UNIÓN TEMPORAL ROAD DESIGN

CI-344 DE 2019

DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 29 DE ENERO DE 2020




2574

2575

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

REVISIÓN Y APROBACIÓN

ELABORÓ	Residente Social Contratista	 T.S. Nini Johanna Baquero Torres
REVISÓ	Representante legal	 Ing. Oliverio Bonilla Hoyos
REVISÓ Y APROBÓ	UT ROAD DESIGN Dirección de Interventoría	 Ing. Andrés Peña Supelano

CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
00	VERSIÓN ORIGINAL	03/02/2020

310

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	8
4. OBJETIVOS	9
4.1 OBJETIVO GENERAL	9
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
4.3 MARCO TEÓRICO	10
4.4 METODOLOGÍA	10
4.5 INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	11
4.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	11
4.5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA	11
4.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	12
4.7 GESTIÓN SOCIAL	13
4.7.1 PERSONAL SOCIAL	13
4.8 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD.....	13
4.8.1 SOCIALIZACIÓN DEL PMT.....	13
4.8.2 DIRECTORIO LÍDERES DE LA COMUNIDAD	15
4.8.3 VOLANTES.....	16
4.8.4 PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN.....	19
4.8.5 ACTAS DE VECINDAD INICIO.....	20
4.8.6 ACTAS DE COMPROMISO	21
4.8.7 REUNIÓN INICIO	22
4.8.8 REUNIÓN EXTRAORDINARIA.....	24
4.8.9 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN	24
4.9 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	24
4.9.1 MANIFESTACIONES CIUDADANA PQR.....	25
4.10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO	25
4.11 PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES.....	27
4.12 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NO CALIFICADO PARA LA OBRA	27
4.13 PROGRAMA DE GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	28
4.14 CONCLUSIONES	29

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Descripción del Contrato de Interventoría	11
Tabla 2 Descripción del Contrato de Interventoría	11
Tabla 3 Personal Social Dispuesto para el Contrato	13
Tabla 4 Socialización PMT	14
Tabla 5 Directorio Comunitario	15
Tabla 6 Relación de Piezas de Divulgación Entregados Predio a Predio	16
Tabla 7 Actualización y Mantenimiento de los siguientes Puntos Satélites:	19
Tabla 8 Relación de Actas de Vecindad de Inicio	21
Tabla 9 Actas de Compromiso	21
Tabla 10 Relación Reunión de Inicio	23
Tabla 11 Relación Reunión Extraordinaria	24
Tabla 12 Capacitaciones Sociales	25
Tabla 13 Relación Personal M.O.N.C y M.O.C	27

2576

2677

 BOGOTÁ	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

LISTA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL.....11

312

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

LISTADO DE ANEXOS

ANEXO 1 FORMATO SOCIALIZACIÓN PMT	15
ANEXO 2 PIEZAS DE DIVULGACIÓN - PLANILLAS CONTROL ENTREGA DE VOLANTES	16
ANEXO 3 ACTAS DE COMPROMISO	21
ANEXO 4 ACTA REUNIÓN INICIO – PLANILLA DE ASISTENCIA	23
ANEXO 5 ACTA REUNIÓN EXTRAORDINARIA	24
ANEXO 6 PLEGABLE SOBRE EL BUEN USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – PLANILLA DE ASISTENCIA	27
ANEXO 7 REGISTRO VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN A EMPLEADOS	27
ANEXO 8 REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO – CERTIFICADOS DE RESIDENCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL Y / O FOTOCOPIAS DE LAS CÉDULAS CON SUS RESPECTIVOS RECIBOS DE SERVICIOS PÚBLICOS	27
ANEXO 9 REGISTRO FOTOGRÁFICO SOCIAL	39

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

INTRODUCCIÓN

El presente documento describe las actividades sociales ejecutadas por parte del Contratista durante el período comprendido del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020, en el marco del COP-340-2019: **“EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3”**.

Las actividades enunciadas a continuación responden al anexo técnico que fue entregado por el FDLSC y a la normatividad vigente que compete a la gestión social.

Los programas que se encontrarán contenidos en el Plan de Gestión Social para este contrato son: Programa de Divulgación e Información a la Comunidad, Programa de Atención al Ciudadano, Programa de Sostenibilidad, Programa de Capacitación a los Empleados del Proyecto, Programa de Control y Seguimiento a Dotaciones, Programa de Contratación del personal No Calificado para la Obra, Programa de Control de Aseguramiento a la calidad, implementados en la ejecución de las diferentes etapas del proyecto.

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC HTT, 901.319 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Describir las actividades que se han realizado durante el período correspondiente del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero del año en curso, para dar cumplimiento a los programas que se desarrollarán dentro del Plan de Gestión Social propuesto para el Contrato No. 340 de 2019, con el fin de mitigar el impacto social que puede llegar a ocasionar la ejecución de las obras en la comunidad.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Llevar a cabo recorridos de obra, con el fin de hacer el reconocimiento del área de influencia directa (como aquella que será afectada directamente por las actividades propias del desarrollo del proyecto).
- Contactar líderes de cada uno de los barrios, a fin de brindarles información clara, veraz y oportuna a la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
- Identificar las actividades requeridas para dar cumplimiento a los Programas de Gestión Social.
- Anexar los formatos que soporten las gestiones adelantadas debidamente diligenciadas.
- Brindar información de manera clara, veraz y oportuna a la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
- Atender de manera oportuna y eficaz las solicitudes, inquietudes, sugerencias, quejas y/o reclamos – PQR - que puedan surgir durante la ejecución de los trabajos.
- Crear escenarios de participación ciudadana entre la Comunidad, el Fondo de Desarrollo Local de San Cristóbal y la Interventoría.

2578
2679

 BOGOTÁ	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-3
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

4.3 MARCO TEÓRICO

El Plan de Gestión Social que regirá para el presente contrato, se elaboró con base al anexo técnico que fue entregado por el FDLSC y a la normatividad vigente que compete a la gestión social en obras.

4.4 METODOLOGÍA

Se elaboró el presente informe, teniendo en cuenta lo siguiente:

- Verificación de los predios para el levantamiento de las Actas de Vecindad de Inicio
- Contacto directo con miembros de las Juntas de Acción Comunal, de cada barrio al ser estos los actores sobresalientes para la ejecución de las obras.
- Acercamiento con la comunidad del área de influencia directa del proyecto, con el fin de brindar información veraz sobre el contrato en mención.
- Ubicación del Punto de Atención Ciudadana con el fin de recepcionar las inquietudes o quejas de la comunidad.

314

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.819.900-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

4.5 INFORMACIÓN Y DESCRICIÓN DEL PROYECTO

4.5.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 1 Descripción del Contrato de Interventoría

Nombre de la Interventoría:	Unión Temporal Design
Contrato No.	CI-344 de 2019
Objeto:	"REALIZAR LA INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL AMBIENTAL Y SISO A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA POR OBJETO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1, 2 y 3"
Plazo de Ejecución:	(9) NUEVE MESES

Fuente: Unión Temporal Road Design – Interventoría

4.5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Tabla 2 Descripción del Contrato de Interventoría

Nombre del Contratista:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC
Contrato No:	340 – 2019 -FDLSC
Objeto:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 3".
Plazo de Ejecución:	(9) NUEVE MESES
Fecha de Iniciación:	30 de Agosto de 2019
Fecha de Terminación:	29 de Mayo de 2020

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-2
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

Valor del Contrato:	\$ 4.804.882.633,62
Valor Gestión Ambiental:	\$ 66.388.706,51
Valor Gestión Social:	\$ 66.388.706,51
Valor Manejo de Tránsito	\$ 116.180.236,39


Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

4.6 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

La Localidad de San Cristóbal; limita al norte con la localidad de Santa Fe, con la Avenida de la Hortúa o Avenida Calle 1, la Calle 3 Sur y las Transversales 10 Este y 13 Este de por medio; al oriente con el municipio de Ubaque; al sur con el municipio de Chipaque y la localidad de Usme, teniendo en cuenta la delimitación del perímetro urbano y del Parque Entre nubes; y al occidente con las localidades Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe, con la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera 10 y la Calle 39B Sur de por medio.

La topografía de San Cristóbal combina una parte plana a ligeramente ondulada ubicada al occidente de la localidad, en proximidad a la Avenida Darío Echandía o Avenida Carrera 10, y otra parte inclinada a muy inclinada localizada en los Cerros Orientales (Reserva Forestal Nacional Protectora Bosque Oriental de Bogotá) y su piedemonte.

Ilustración 1 Localidad San Cristóbal

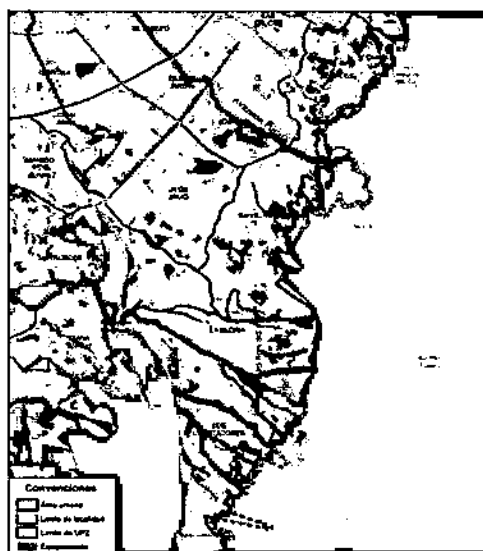

Fuente: sancristobal.gov.co

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC RDT. 901.819 988-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

4.7 GESTIÓN SOCIAL

Las actividades que se describen en el presente Informe Mensual de Gestión Social del COP-340-2019 del Consorcio Malla VIAL BBC, corresponden al período comprendido del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020, el cual se encuentra dirigido a la comunidad del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

A continuación, se relaciona el personal requerido para el desarrollo de las actividades que hacen parte del componente social.

4.7.1 PERSONAL SOCIAL

Tabla 3 Personal Social Dispuesto para el Contrato

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CARGO	DEDICACIÓN
Trabajador (a) Social	1	Nini Johanna Baquero Torres Residente Social	50%
Auxiliar Social	1	Manuel Guillermo Falla	100%

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

4.8 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD

Este programa busca generar mecanismos de divulgación e información dirigidos a la comunidad antes, durante y al finalizar la ejecución del proyecto, a través de la entrega de diferentes herramientas como: Volantes, Afiches, Actas de Vecindad de Inicio - Cierre, Actas de Compromiso, los cuales serán implementados en los diferentes frentes de obra y en la realización de reuniones con los ciudadanos residentes de la zona de influencia directa, Juntas de Acción Comunal o líderes de la comunidad, para la ejecución de las mismas se deberá contar con la respectiva aprobación de la Interventoría y bajo los lineamientos del Supervisor del Contrato.

4.8.1 SOCIALIZACIÓN DEL PMT

Este ítem se desarrolla a través de la Socialización de los PMT, con la comunidad del área de influencia directa al proyecto:

2580
2681

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

Tabla 4 Socialización PMT

CONSECUTIVO No.	TEMAS	FECHA	LUGAR DE LA REUNIÓN	No. DE ASISTENTES
11	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	15 de Enero de 2020	CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Carrera 17 A Este y Transversal 16 C Este (Barrio Altos del Virrey)	13 personas aledañas al área de influencia del Proyecto.
12	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	15 de Enero de 2020	CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 46 Sur y Calle 44 B Sur (Barrio Altos del Virrey)	17 personas aledañas al área de influencia del Proyecto.
13	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	20 de Enero de 2020	Civ's: 4002378, 4002411, 4002441, 4002490, 4002572, 4002689, 4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M (Barrio Guacamayas)	48 personas aledañas al área de influencia del Proyecto.
14	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la vía, para solicitud de prórroga.	22 de Enero de 2020	CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur (Barrio Altos del Virrey)	12 personas aledañas al área de influencia del Proyecto.

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.810.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

CONSECUTIVO No.	TEMAS	FECHA	LUGAR DE LA REUNIÓN	No. DE ASISTENTES
15	Socialización de PMT con la comunidad, sobre la intervención de la Vía.	25 de Enero de 2020	CIV 4005040 – 50007951 Carrera 17A este entre Calle 42C Bis Sur y Calle 42D Bis Sur (Barrio Altos del Virrey)	30 personas aledañas al área de influencia del Proyecto.

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

Anexo 1 Formato Socializaciones PMT

4.8.2 Directorio líderes de la comunidad

El presente Directorio Institucional servirá de apoyo al área social, para tener una permanente interacción con líderes de la comunidad, durante el desarrollo de las actividades que se generen para la ejecución de las obras, lo cual se relaciona en el presente cuadro:

Tabla 5 Directorio Comunitario

BARRIO	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	TELEFONO
Altos del Virrey	MARIA DEL SOCORRO HERNANDEZ	Presidenta J.A.C	3625104 - 3144650139
Puente Colorado	LEONOR BENAVIDEZ	Presidenta J.A.C	3186314518
Moralba	JORGE RAUL BERMUDEZ ROMERO	Presidente J.A.C	3213368139

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

Quindío	CLEOTILDE AZA MACIAS	Presidenta J.A.C	3142002556
Altos del Poblado	PEDRO MATEUS PINEDA	Presidente J.A.C	3143220033

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

Nota: Actualmente no se cuenta con datos del Presidente o Presidenta de la Junta de Acción Comunal de los Barrios Altamira y Guacamayas II – Sector, debido a que se encuentran en proceso de elección.

4.8.3 VOLANTES

Así mismo en el presente programa se realizó la entrega de algunas piezas divulgativas, que permitieron que la comunidad y líderes de la JAC, se informarán acerca del proyecto. A continuación, se relacionan las piezas divulgativas que se entregaron a la comunidad, por parte del área social:

Tabla 6 Relación de Piezas de Divulgación Entregados Predio a Predio

CIV - TRAMO	BARRIO	FECHA QUE SE ENTREGÓ	TIPO DE PIEZA	CANTIDAD	ANEXO
CIV 4005040 Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur CIV 50007951 Carrera 17 A Este entre Calle 42 D Sur y Calle 42 D Bis Sur	Altos del Virrey	03 de Enero de 2020	Volante No. 28 Invitación a Reunión de Inicio	20	
CIV 4005040 Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur CIV 50007951 Carrera 17 A Este entre Calle 42 D Sur y Calle 42 D Bis Sur	Altos del Virrey	11 de Enero de 2020	Volante No. 29 Rampas de Acceso	5	

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	Altos del Virrey	13 de Enero de 2020		11	
CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Calle 46 B Bis Sur y Diagonal 46 C	Quindío	13 de Enero de 2020		6	
CIV 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	Quindío	13 de Enero de 2020		13	
CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	Altos del Virrey	13 de Enero de 2020		10	
CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44B Sur y Calle 46 Sur	Altos del Virrey	13 de Enero de 2020		15	
CIV 4005040 – 50007951 Carrera 17A este entre Calle 42C Bis Sur y Calle 42D Bis Sur	Altos del Virrey	09 de Enero de 2020	Volante No. 30 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	4	
Civ's: 4002378, 4002411,4002441, 4002490,4002572, 4002689,4002814,	Guacamayas	08 de Enero de 2020	Volante No. 31 Invitación a Reunión Extraordinaria	12	Anexo 2 Piezas de Divulgación - Planillas Control Entrega de Volantes

2582
2583

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M					
CIV 4005040 – 50007951 Carrera 17A este entre Calle 42C Bis Sur y Calle 42D Bis Sur	Altos del Virrey	10 de Enero de 2020	Volante No. 32 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	2	
Civ's: 4002378, 4002411,4002441, 4002490,4002572, 4002689,4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	Guacamayas	16 de Enero de 2020	Volante No. 33 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Primera Visita	47	Anexo 2 Piezas de Divulgación - Planillas Control Entrega de Volantes
Civ's: 4002378, 4002411,4002441, 4002490,4002572, 4002689,4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	Guacamayas	23 y 24 de Enero de 2020	Volante No. 34 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Segunda Visita	6	
Civ's: 4002378, 4002411,4002441, 4002490,4002572, 4002689,4002814,		23 y 24 de Enero de 2020	Volante No. 37 Invitación a Reunión de	87	

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	Guacamayas		Inicio		
Civ's: 4002378, 4002411,4002441, 4002490,4002572, 4002689,4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	Guacamayas	30 y 31 de Enero de 2020	Volante No. 38 Notificación de Levantamiento Actas de Vecindad Tercera y Última Visita	5	Anexo 2 Piezas de Divulgación - Planillas Control Entrega de Volantes
TOTAL DE VOLANTES ENTREGADOS					243

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

4.8.4 PUNTOS SATÉLITES DE INFORMACIÓN

Durante el período del presente informe no se instalaron Puntos Satélites en ningún CIV de intervención, aclarando que a la fecha se han mantenido los mismos frentes de obra de cuando se inició el contrato.

Tabla 7 Actualización y Mantenimiento de los siguientes Puntos Satélites

CIV	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	PERSONA CONTACTO	DIRECCIÓN Y TELÉFONO
4005352	Tienda Mis Dos Angelitos	María Helena Bermúdez	Carrera 16 Bis Este No. 44 B – 04 Sur 3143259984
4005480	Predio	Clara Inés Valencia	Diagonal 46 Bis Sur No. 16 C – 33 3212624262

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

4005079	Pedio	Ana Floralba Vargas	Transversal 15 Este No. 42C-64 Sur 3212083091
4005073	Pedio	Rafael Gómez	Calle 42D Bis Sur No. 16C-25 3644361
4007971 4007972	Pedio	Karen Nova	Carrera 16C Este No. 46B-70 2109010

- Cabe resaltar que cada semana se realiza una verificación, de los Puntos Satélites de Información antes mencionados, con el fin de revisar que las piezas divulgativas se encuentren en buen estado, para el uso de la información por parte de la comunidad.
- De acuerdo al Comité Social que se llevó a cabo el día 20 de Enero de 2020, la Interventoría solicito instalar nuevamente los Puntos Satélites de los Civ's: 4005480 (Barrio Altos del Virrey), 4007971, 4007972 (Barrio Quindío) y el 4005079 (Barrio Moralba), los cuales en el momento de verificación por parte de la misma, no se evidenciaron. Actividad que se reportará con registro fotográfico para el siguiente Informe Mensual de Gestión Social No. 06.
- Por solicitud de la Interventoría Social, se actualizarán las piezas divulgativas de cada Punto Satélite, en las cuales se ajustara el logo institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá; actividad que será reportada para el corte del siguiente informe mensual de Gestión Social.

4.8.5 ACTAS DE VECINDAD INICIO

Durante el presente informe se dio inicio con el levantamiento de Actas de Vecindad en el Barrio Guacamayas:

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.994-3
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

Tabla 8 Relación de Actas de Vecindad de Inicio

TRAMO	CIV	No. DE PREDIOS	No. DE ACTAS LEVANTADAS INTERNAS	FECHA QUE SE LEVANTARON
Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	4002378, 4002411, 4002441, 4002490, 4002572, 4002689, 4002814, 4002785, 4002849	49	42	17, 20, 21, 22, 23,24,27,28,29 de Enero de 2020

- Posterior a la entrega del presente informe, se continuarán realizando las Actas de Vecindad de Inicio faltantes en el Barrio Guacamayas.
- A la fecha del presente informe la Firma Contratista se encuentra al día con el radicado de las Actas de Vecindad de Inicio a la Interventoría, para lo cual se relaciona los últimos oficios enviados y aprobados por la misma:

Civ's: 4005352 (Altos del Virrey) y 4007971 (Barrio Quindío), con oficio de radicado No. CMVBBC-2019-093 y avalado por parte de la Interventoría con el oficio INTEROADESIGN-2019-168, 4005079 (Moralba) y 4007972 (Barrio Quindío), con oficio de radicado No. CMVBBC-2019-089 y avalado por parte de la Interventoría con el oficio INTEROADESIGN-2019-167.

4.8.6 ACTAS DE COMPROMISO

A la fecha del presente Informe se reportan las siguientes Actas de Compromiso:

Tabla 9 Actas de Compromiso

No. DE ACTA	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	FECHA	TEMA	ANEXO
01	María Vicenta Calderón Rivera	Calle 39 D No. 2N - 69			
02	Javier Bociga	Calle 39 No. 2 N - 63			

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NET. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-02/01/2020

03	David Martínez	Calle 39 D No. 2 N – 55 Sur	14, 21, 22 y 28 de Enero de 2020	Los propietarios de los predios en mención se comprometen voluntariamente a correr el cerramiento del lote en láminas de zinc, lo correspondiente al Espacio Público hasta el lindero.	Anexo 3 Actas de Compromiso
04	Alba Alcira Triana de Olaya	Calle 39 D Sur No. 2 N – 45			
05	Ricardo Sarmiento	Calle 39 D Sur No. 2 N – 33			
06	Luz Marina Blanco	Calle 39 D Sur No. 2 N – 27			
07	Martha Espinosa	Calle 39 D No. 2 N – 21 Sur			
08	Erika Johanna Segura Mendoza	Calle 39 D Sur No. 2 N – 15			
09	Luis Enrique Rodríguez	Calle 39 D No. 2 N – 09			
10	Sergio Efraín Barcenás Córdoba	Calle 39 D Sur No. 3 - 95			
11	Daniel Andrés Medina Benavidez	Calle 39 D No. 2 N – 03 Sur			
12	Jenny Sánchez	Calle 39 D No. 2 N – 51			
13	Lidy Barrero Garzón	Calle 39 D Sur No. 2N - 39			

4.8.7 REUNIÓN INICIO

Durante este periodo se realizaron dos (2) Reuniones de Inicio, con la Comunidad, la cual contó con el acompañamiento de la Interventoría, a quien se le notificó por medio de correo electrónico.

Las presentes reuniones de inicio, se llevaron a cabo en los tramos de obra a intervenir:

CIV 4005040 Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur y del CIV 50007951 (Barrio Altos del Virrey) y de la Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M, correspondiente a los Civ's: 4002378, 4002411, 4002441, 4002490, 4002572, 4002689, 4002814, 4002785, 4002849 (Barrio Guacamayas), para las cuales la Firma Contratista llevó a cabo un plegable informativo, describiendo cada componente de la siguiente manera:

1. **Área Técnica:** el Ingeniero Oliverio Bonilla Representante Legal del CMVBBC, informó sobre el No. y objeto del Contrato, el tipo de intervención que se realizara

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NET. 901.514 904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-02/01/2020

de acuerdo a lo planteado en los Estudios y Diseños que suministro el FDLSC para el desarrollo del presente contrato.

2. **Área Ambiental y SST:** el Ingeniero Residente informó sobre el impacto ambiental que se puede generar por las obras, el cuidado que se le debe dar a los individuos arbóreos y el buen uso de los senderos peatonales, entre otros.
3. **Área Gestión Social:** la Residente Social Johanna Baquero, quien informó sobre la implementación de siete (7) programas concernientes al manejo adecuado con la comunidad y personal de obra.

De este modo se reporta la siguiente información en el cuadro:

Tabla 10 Relación Reunión de Inicio

Civ's TRAMO	BARRIO	FECHA QUE SE REALIZÓ	LUGAR DONDE SE REALIZÓ	No. DE PERSONAS ASISTENTES	No. DE PERSONAS CONVOCADAS
CIV 4005040 Carrera 17 A Este entre Calle 42 C Bis Sur y Calle 42 D Sur CIV 50007951 Carrera 17 A Este entre Calle 42 D Sur y Calle 42 D Bis Sur	Altos del Virrey	08 de Enero de 2020	Tramo de Obra a intervenir	9	20
4002376, 4002411, 4002441, 4002490, 4002572, 4002689, 4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	Guacamayas	27 de Enero de 2020	Tramo de Obra a intervenir	35	87

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

Anexo 4 Acta Reunión Inicio – Planilla de Asistencia

2585
~~2586~~

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

4.8.8 REUNIÓN EXTRAORDINARIA

Durante este período se llevó a cabo una (1) Reunión Extraordinaria.

Tabla 11 Relación Reunión Extraordinaria

Civ s: TRAMO	BARRIO	FECHA QUE SE REALIZÓ	LUGAR DONDE SE REALIZÓ	No. DE PERSONAS ASISTENTES	No. DE PERSONAS CONVOCADAS
4002378, 4002411,4002441, 4002490,4002572, 4002689,4002814, 4002785, 4002849 Carrera 4C entre calle 39C Sur y Calle 39F Sur – Calle 39F entre Carrera 3B y Carrera 2M	Guacamayas	14 de Enero de 2020	Tramo de Obra a intervenir	12	12

Fuente: Consorcio Malla Vial BBC

Anexo 5 Acta Reunión Extraordinaria – Planilla de Asistencia

4.8.9 REUNIÓN DE FINALIZACIÓN

Durante este período no se realizaron reuniones de finalización con la comunidad.

4.9 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

A la fecha se cuenta con un Punto **CREA** Virtual, el cual se ubicó en la Localidad de San Cristóbal, plenamente identificado, en dónde la comunidad encontrará el personal idóneo que atenderá todas aquellas peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias referentes a las obras que se ejecuten.

La oficina destinada como Punto **CREA** Virtual para el proyecto en todas sus etapas es:
PUNTO CREA

Dirección: Transversal 16C Este No. 46 A – 05 Sur

Teléfono: 3903696 ó 3156346906

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

Residente Social: Johanna Baquero Torres

Horario de Atención: Lunes a Jueves de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Auxiliar Social: Manuel Falla

Correo Electrónico: socialmallavialbbc@gmail.com



4.9.1 MANIFESTACIONES CIUDADANA PQR

A la fecha del corte del presente informe, no se reportan Atepciones al Ciudadano.

4.10 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL PROYECTO

Este programa busca socializar el proyecto con los trabajadores, durante la inducción del personal que hará parte del mismo, además de una capacitación grupal a los trabajadores mensualmente.

Para el presente corte del informe de Obra, se llevó a cabo la Capacitación mensual correspondiente: Buen Uso de los Elementos de Protección Personal, la cual estuvo dirigida al Personal del Proyecto.

Tabla 12 Capacitaciones Sociales

TRAMO CIV	BARRIO -	FECHA QUE SE REALIZÓ	No. DE ASISTENTES	TEMA
CIV 4005352 Carrera 16 Bis Este entre Calle 44B Sur y Calle 46 Sur	Altos del Virrey		4	

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

CIV 4005079 Transversal 15 A Este entre Calle 43 Sur y Carrera 16 A Este	Moralba	28 de Enero de 2020	5	Buen Uso de los Elementos de Protección Personal
CIV 4005480 Diagonal 46 Bis Sur entre la Transversal 16 C Este y Calle 46 A Bis Sur	Altos del Virrey		4	
CIV 4007971 Carrera 16 D Este entre Diagonal 46C y Calle 46 B Bis Sur CIV 4007972 Calle 46 C Sur entre Carrera 16 D Este y Carrera 17 B Este	Quindío	28 de Enero de 2020	4	
CIV 4005073 Calle 42 D Bis Sur entre la Transversal 16 C Este y Carrera 17 A Este	Altos del Virrey		4	

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC REG. 901.819 VPM-1
Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	Versión CMVBBC-01/2019

Anexo 6 Plegable sobre el Buen Uso de los Elementos de Protección Personal – Planilla de Asistencia.

4.11 PROGRAMA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A DOTACIONES

Este programa se desarrollará en los recorridos sociales que se realicen a los diferentes tramos de obra.

Anexo 7 Registro Verificación de Dotación a Empleados.

4.12 PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL NO CALIFICADO PARA LA OBRA

Durante este período el Contratista realizó la Contratación de Personal de Mano de Obra No Calificada de la localidad de San Cristóbal.

Tabla 13 Relación Personal M.O.N.C y M.O.C

M.O. C Contratada	M.O.N.C Contratada	M.O. N.C. de la Localidad	Porcentaje solicitado de M.O.N.C, de la Localidad, para el Contrato No. 340-2019	Porcentaje M.O.N.C, contratada durante el período del presente informe
13	27	12	30%	44,4%

Cabe mencionar que algunos de los certificados de residencia del personal de M.O.N.C, se encuentran actualmente en trámite en la página www.secretariadegobierno.gov.co, los cuales se irán presentado en los posteriores informes mensuales de Gestión Social.

Para el corte del presente informe se anexan ocho (8), certificados de residencia de la Localidad, quedando cuatro (4) pendientes por entregar; razón por la cual se anexarán las fotocopias de las cédulas con sus respectivos recibos de servicios públicos.

Anexo 8 Registro Generación de Empleo – Certificados de Residencia de la Localidad de San Cristóbal y 10 Fotocopias de las cédulas con sus respectivos recibos de servicios públicos.

 BOGOTÁ	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

4.13 PROGRAMA DE GESTIÓN ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Este programa busca describir las labores del área de gestión social realizadas por el Contratista y evaluadas por la Interventoría, para la fecha de corte del presente informe se reporta lo siguiente:

- Se entregó oficio con No. de radicado CMVBBC-2019-095, en el cual se le informó al señor Pompilio Torres propietario del predio ubicado en la Calle 44B Sur No. 16-15 Este (Barrio Altos del Virrey), sobre el proceso constructivo que a la fecha se ha realizado en la Carrera 16 Bis Este entre Calle 44 B Sur y Calle 46 Sur del CIV 4005352; el cual fue radicado a la Supervisión del FDLSC y a la Interventoría para su respectivo conocimiento.
- Participación en el Comité Social, que se realizó el pasado 20 de Enero de 2020, en las instalaciones de la Interventoría, en el cual se evaluó el avance por parte del Contratista en el área social, revisando las actividades ejecutadas en cada programa, para así mismo fijar nuevos compromisos, que propendan por el buen desarrollo de las obras en lo concerniente al manejo de la comunidad.
- Acercamientos con la comunidad para brindarles información del proyecto próximo a ejecutar.
- Entrega permanente de piezas divulgativas a la comunidad del área de influencia directa del proyecto.
- Participación en los Comités de Obra que se llevan a cabo con el FDLSC, la Interventoría y el Contratista, para abordar temas de cada área en cuanto al desarrollo del COP – 340 – 2019.

	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NIT. 901.310.904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

4.14 CONCLUSIONES

- A medida que avance el proyecto, se van desarrollando los programas de gestión social que permitirán dar cumplimiento a lo establecido dentro de este componente.
- Se evidencia a la fecha que la comunidad se encuentra receptiva a las obras que se realizarán en cada segmento vial, por parte del Consorcio Malla Vial BBC.
- Se observa que la comunidad asume con buena aptitud, las actividades que se desarrollan de manera preliminar para dar inicio a las obras, a través de su participación e interés.
- En cada actividad que realiza la firma contratista, se le informa a la comunidad sobre la necesidad de cumplir con el porcentaje de M.O.N.C. de la localidad san Cristóbal, invitándoles a hacer parte de este proceso, a lo cual la comunidad se muestra bastante receptiva e interesada.
- El Contratista mantiene buenos canales de comunicación con la comunidad, a quien le suministra permanentemente los datos del Punto **CREA** de Atención Ciudadana.

 BOGOTÁ	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC MDT, 801.910 904.1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO GESTIÓN SOCIAL

 BOGOTÁ	INFORME MENSUAL DE GESTIÓN SOCIAL No. 5	 CONSORCIO MALLA VIAL BBC NTT, 901.310 904-1
<i>Contrato de Obra No. 340 – 2019 - FDLSC</i>	Del 30 de Diciembre de 2019 al 29 de Enero de 2020	<i>Versión CMVBBC-01/2019</i>

ANEXO 1

FORMATO SOCIALIZACIÓN PMT

2590
2591

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2020/01/15
CONTRATO No. FDLSC 340-2019
HORA: 10:30 a.m.
LUGAR: Ctv 4005073
OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y3".
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para la siguiente vía:

CL 42 D BIS SUR ENTRE KR 17 A ESTE Y TV 16 C ESTE

- Para el caso de los biciusuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

- Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 24 de Enero de 2020 al 23 de Abril de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.


La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01	Maria del Socorro Hernández	51882726	CL 43 ASx No. 16C-37E	3144650139	marisadel30@hotmail.com	
02	Vicente Vargas	19245178	CL 42 DBis Sur N. 16C-07E	31238916307		
03	Aurora Jiménez	21657090	CL 42 DBis Sur N. 16C-12E	No Reporta		
04			CL 42 DBis Sur N. 16C-15E			
05			CL 42 DBis Sur N. 16C-28E			
06			CL 42 DBis Sur N. 16C-28E			
07			CL 42 DBis Sur N. 16C-28E			
08			CL 42 DBis Sur N. 16C-28E			
09	Daniel Alagona	79960853	CL 42 DBis Sur N. 16C-46E	3042049353		
10	Felida Rodríguez	41709717	CL 42 DBis Sur N. 16C-46E	3203550447		
11			CL 42 DBis Sur N. 16C-15			
12			CL 42 DBis Sur N. 16C-05			
13	Daniela Ríos	1023950223	CL 42 DBis Sur N. 16C-55	3502195622		

Se realiza socialización del PMT en conjunto con la Señora Maria del Socorro Hernández (Presidenta Junta de Acción Comunal), a quien se le informó sobre las actividades de obra en el segmento vial en mención. Cabe resaltar que al día de la visita no se encontraron algunos propietarios de los predios, razón por la cual la Presidenta JAC les socializará la actividad que se realizó para que toda la comunidad tenga conocimiento de las Actividades de obra que se adelantan.

326

1592
2692

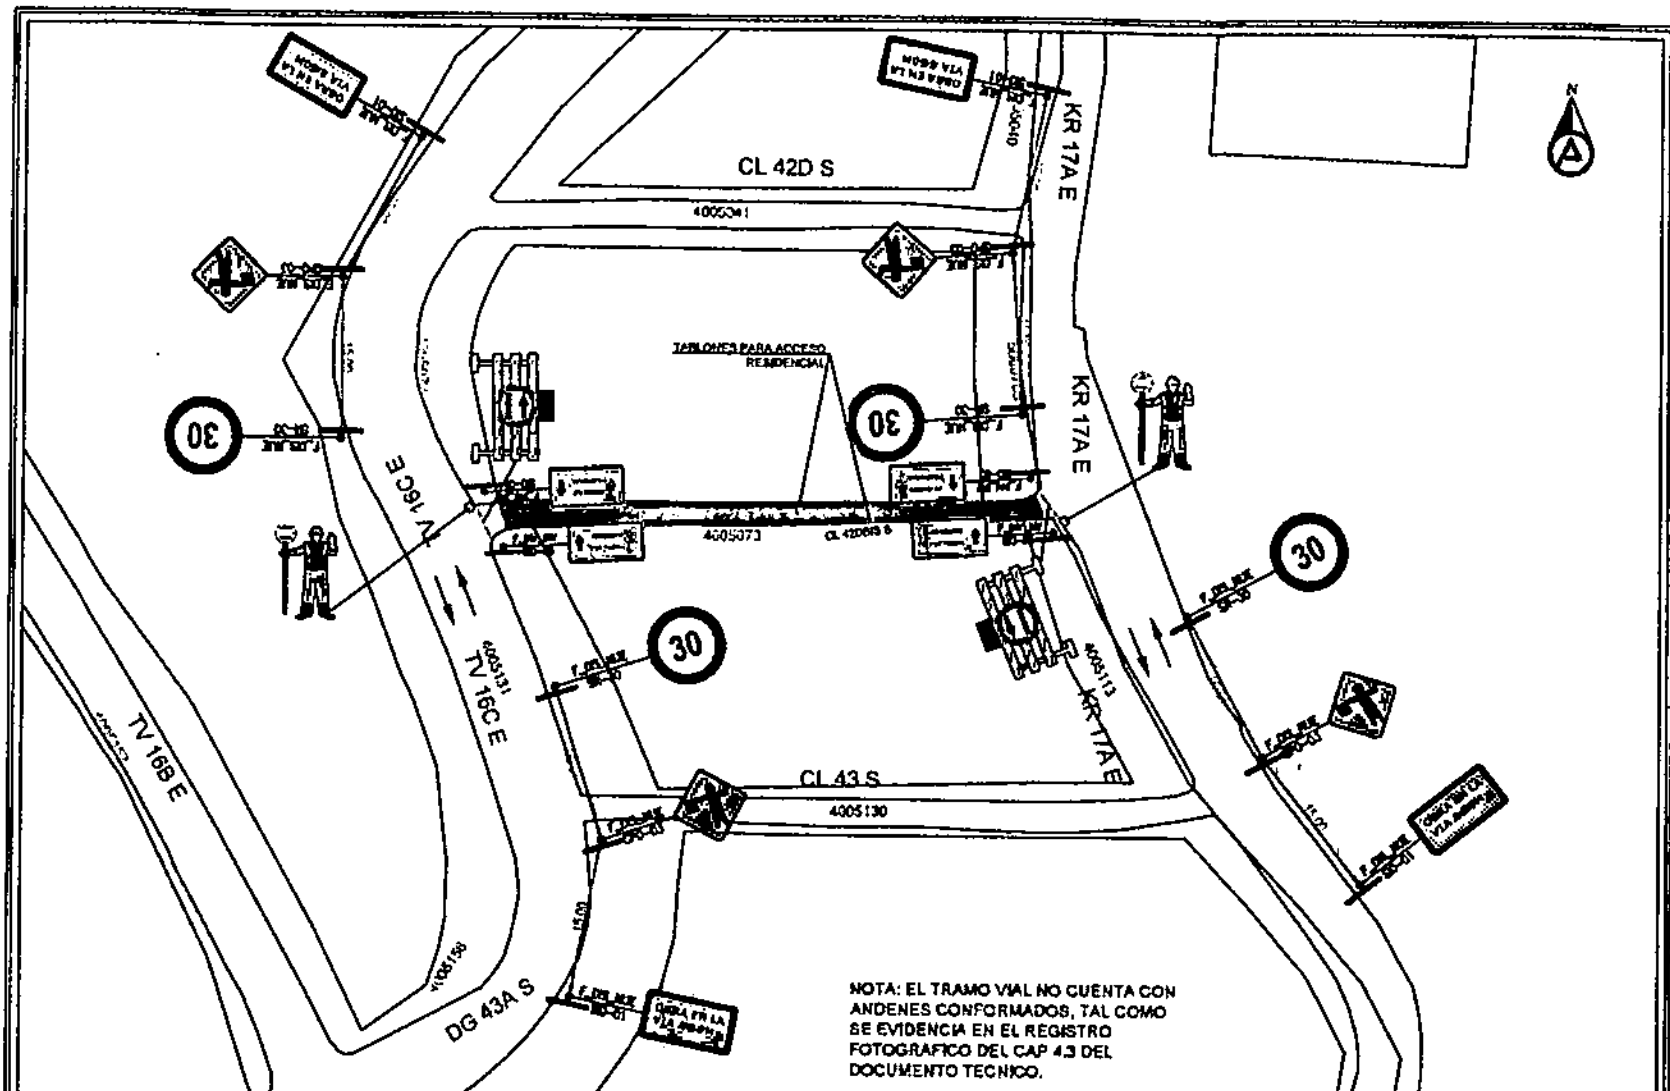

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBG CO-340-2019 - FDLSC ELABORÓ: PLANING CONSULTORA	FECHA CALIFICACION: 22/10/2019 CONTENIDO: PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL	CONVENCIONES: CIERRE A SOLICITAR CIERRE ACTUAL	DESVÍOS A IMPLEMENTAR DESVÍOS ACTUALES	SEÑAL BARRICADA VIA CERRADA BARRICADA DESVÍO	CANT 1 SEÑAL ALUXILAR DE TRÁFICO	CANT 2 SEÑAL 30	CANT 1 SEÑAL 30	CANT 0 SEÑAL Gráfico
---	---	---	--	---	--	---	---	--

277

ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2020/01/15 HORA: 11:00 a.m. LUGAR: CTV 4005352
 CONTRATO No.: FDLSC 340-2019 KR 16 BIS ESTE ENTRE CL 46 SUR Y CL 44 SUR
 OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y3.
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y3 contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para la siguiente vía:

• KR 16 BIS ESTE ENTRE CL 46 SUR Y CL 44 B SUR

• Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

• El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes, ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

• Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.


• Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en rebozo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutaran actividades desde el 24 de Enero de 2020 al 23 de Abril de 2020, tiempo que comprende etapa preliminar y de obra. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.


La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01	Maria del Socorro Hernández	51882726	CL 43A Sur No. 16C-7E	344650139	mardspdz@hotmai.com	
02	_____	_____	Gr16B3 E.N. 41B-05	_____	_____	_____
03	_____	_____	Gr16B3 E.N. 41B-07	_____	_____	_____
04	_____	_____	Gr16B3 E.N. 41B-13E	_____	_____	_____
05	Dora Bonitez	24091205	Gr16B3 E.N. 41B-17E	3213413071	_____	
06	Maria Elena Bermudez	109578734	Gr16B3 E.N. 41B-04E	3143159984	_____	
07	Marco Rodriguez	4193522	Gr16B3 E.N. 41B-14E	3138418246	_____	
08	Yenny Paola Huarefo	102392104	Gr16B3 E.N. 41B-10E	3727656804	_____	
09	Jose Prieto rios	2954740	Gr16B3 E.N. 41B-23E	3644192	_____	
10	Claudia Yareth Roncancio	53003342	Gr16B3 E.N. 41B-22E	3125753128	_____	
11	Leonardo Tellez	14250947	Gr16B3 E.N. 41B-20E	3133182045	_____	
12	_____	_____	Gr16B3 E.N. 41B-27E	_____	_____	_____
13	_____	_____	Gr16B3 E.N. 41B-33E	_____	_____	_____
14	Clara Gil	21060450	Gr16B3 E.N. 41B-32E	3133768977	_____	
15	Angie Aldana	119279322	Gr16B3 E.N. 41B-42E	3130711080	_____	
16	Maria Mora	1047216635	Gr16B3 E.N. 41B-12	305952282	_____	
17	_____	_____	Gr16B3 E.N. 41B-15	_____	_____	_____

Se realiza socialización del PMT en conjunto con la señora Maria del Socorro Hernández (Presidenta Junta de Acción Comunal), a quien se le informó sobre las actividades de obra en el segmento vial en mención. Cabe resaltar que el día de la visita, no se encontraron algunos propietarios de los predios razón por la cual la Presidenta JAC, le socializará la actividad que se realizó para que toda la comunidad tenga conocimiento de las Actividades de obra que se adelantan.

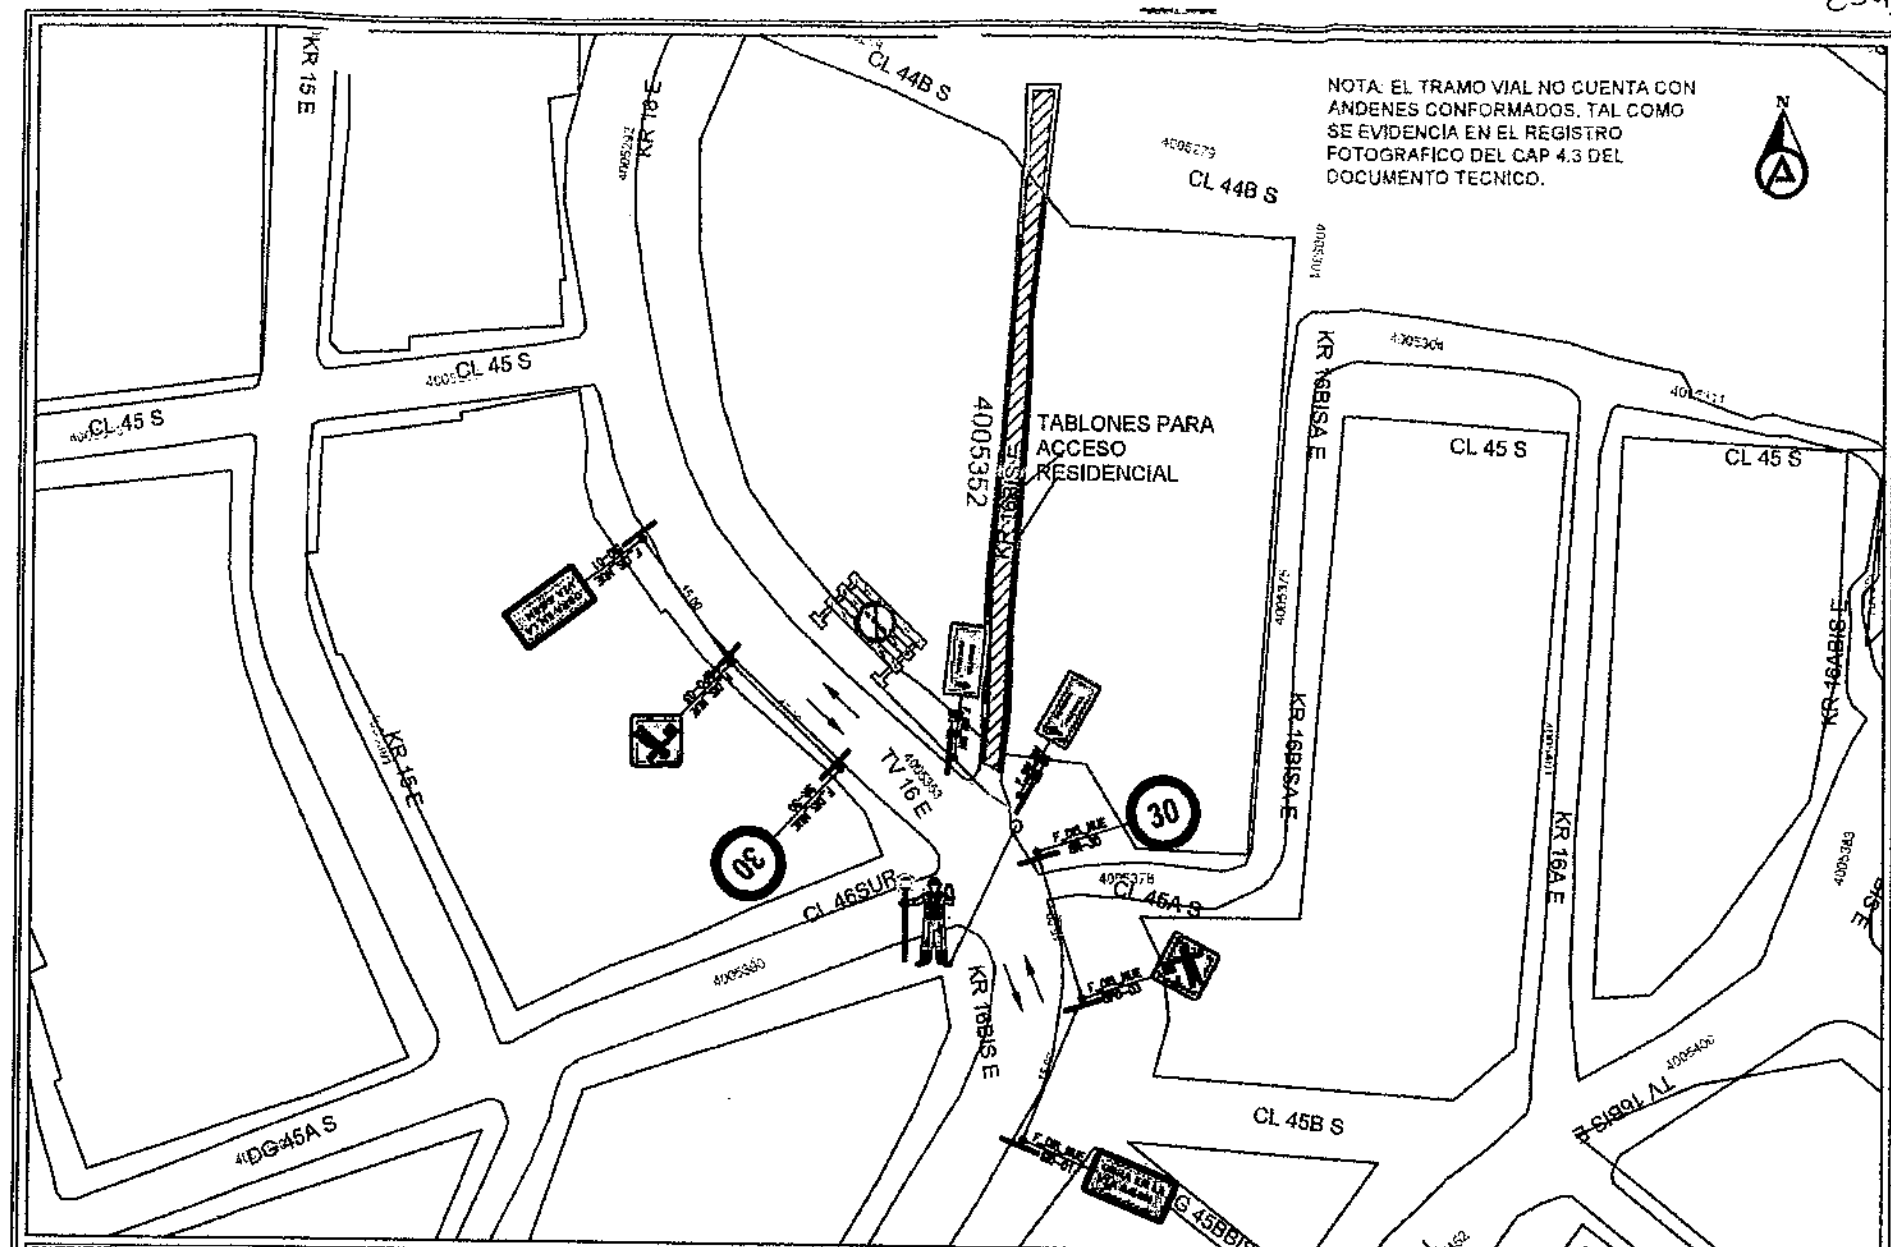

NOTA: EL TRAMO VIAL NO CUENTA CON ANDENES CONFORMADOS, TAL COMO SE EVIDENCIA EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO DEL CAP 4.3 DEL DOCUMENTO TECNICO.

CONTRATISTA:  CONSORCIO MALLA VIAL BBC CO-340-2019 - FDLSC	FECHA ELABORACION 22/10/2019	CONVENCIONES:  CIERRE A SOLICITAR  CIERRE ACTUAL	DESVIOS A IMPLEMENTAR  DESVIOS ACTUALES	SEÑAL  BARRICADA VIA CERRADA  BARRICADA DESVIO	CANT. - 1	SEÑAL AUXILIAR DE TRAFICO	CANT. 2	SEÑAL  30  	CANT. 1 1 0	ESCALA 0 Gráfico
ELABORÓ: PLANING CONSULTORA	CONTIENE PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL							SEÑAL  PROHIBIDO AVANZAR  PROHIBIDO PONERSE A LA DERECHA	CANT. 0 2	PLANCHAS No. 2

274

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 20/01/2020 HORA: 9:00 a.m. LUGAR: KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CONTRATO No. FDLSC 340-2019
OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3.
CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3, contemplado en el Contrato No. FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para las siguientes vías:

KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CL 39F SUR ENTRE KR 3B Y KR 2M

- Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con ciclorutas y/o biciverías.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en relleno existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del _____, El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes:

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Alejandro Hernández	1013662675	CL 39D N. 2N-55C	2064473	alejandromh95@gmail.com	[Firma]
2	Oscar Javier Bosciga R.	90230331	CL 39D N. 2N-15R	3220001057	oscarbosca@gmail.com	[Firma]
3	Alexander Rivera	799594961	CL 39D N. 2E-26S	383190450	arivera116@hotmail.com	[Firma]
4	Maria Calderon	41721870	CL 39D N. 2N-69	3632630	calderonmaria@gmail.com	[Firma]
5	Glenn Pineda	52065245	CL 39D SUR N. 2N-51			
6	Marta Espinoza	51911440	CL 39D SUR N. 2N-21	3115421304	glennpineda@gmail.com	[Firma]
7			CL 39D SUR N. 2N-21	7319393		[Firma]
8			CL 39D SUR N. 2N-45			
9			CL 39D SUR N. 2N-34			
10			CL 39D SUR N. 2N-16			
11			CL 39D SUR N. 2N-04			
12			CL 39D SUR N. 2N-03			
13			CL 4C N. 39D-10S			
14	Maria Elsa Baquero	39631353	CL 39B N. 39D-12S	3107659280		[Firma]
15			CL 39B N. 39D-47S			[Firma]
16	Pablo Betancour	43162709	CL 39B N. 39A-92S	3263107		[Firma]
17	Ema Gomez	41325605	CL 39A N. 39D-13S	3675716		[Firma]
18	Sergio Edwin Barrantes	12969180	CL 39D SUR N. 4A-49	3142043365		[Firma]
19	Yadira Suarez	1121042907	CL 39D SUR N. 3-57	3126804335		[Firma]
20	Humberto Bermudez	19115859	CL 39B N. 39D-00S	3105814092		[Firma]
21	Ruth Franco Rosales	37181816	CL 39D SUR N. 3-51	3209880737		[Firma]
22	Carlos Julio Vivas	304775	CL 39D SUR N. 3-63	7227374		[Firma]
23			CL 39D SUR N. 3-64			
24	José Felix Casablanco		CL 39D SUR N. 3-75	3143429466		[Firma]
25			CL 39D SUR N. 3-81			[Firma]
26	Johan Gaitan	1075672995	CL 39D SUR N. 3-87	3047123070		[Firma]
27			CL 39D SUR N. 3-17			
28	Alfonso Ramirez	79347503	CL 39D SUR N. 3-11	3045455265		[Firma]
29	Bongamin Hernandez	17193815	CL 39D SUR N. 3-05	3125187849		[Firma]
30			CL 39D SUR N. 2E-77			

FECHA:	20/01/2020	HORA:	9:00 a.m.	LUGAR:	KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CONTRATO No.	FDLSC 340-2019				CL 39F SUR ENTRE KR 3B Y KR 2M
OBJETO DEL CONTRATO:	"EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".				
CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLA VIAL BBC				
INTERVENTORÍA:	UNION TEMPORAL ROAD DESIGN				
TEMA:	SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA				

KR 4C ENTRE CL 39C SUR Y CL 39F SUR
CL 39F SUR ENTRE KR 3B Y KR 2M

- Para el caso de los bicisuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular no se verá afectado toda vez que los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada, razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.
- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el período de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, con zonas verdes o en recibo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del _____. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

[illegible]

~~331~~



ANEXO No. 9

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 2020/01/22 HORA: 11:00 a.m. LUGAR: CIN 4005480
 CONTRATO No. FDLSC 340-2019 DIAGONAL 46 BIS SUR ENTRE TV 16C ESTE Y CL 46A BIS SUR
 OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y 3".
 CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BBC
 INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN
 TEMA: SOCIALIZACIÓN CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 y 3 contemplado en el Contrato No.FDLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BBC y supervisado por la Interventoría "UNION TEMPORAL ROAD DESIGN". Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT, descrito a continuación para la siguiente vía:

• DIAGONAL 46 BIS SUR ENTRE TV 16C ESTE Y CL 46A BIS SUR

• Para el caso de los usuarios, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.

• El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención, los tramos viales no cuentan con conexiones existentes ni infraestructura consolidada razón por la cual no se generaran desvíos producto de la intervención.

• Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.

• Los cierres contarán senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en recebo existentes en el corredor, mediante broches controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 24 de Enero del 2020 al 23 de Abril de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 06:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.


La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
01	Maria del Socorro Hernandez	51882726	C1143A Sur No. 16C-37E	3144650139	maria.socorro@hotmail.com	[Firma]
02	Rosa Aurora	27123260	Dg 46 Bis Sur No. 16C-91	3132680706		[Firma]
03			Dg 46 Bis Sur No. 16C-91			
04			Dg 46 Bis Sur No. 16C-15			
05	Jhon Frei Flores	79706932	Dg 46 Bis Sur No. 16C-21	7351674		[Firma]
06			Dg 46 Bis Sur No. 16C-27			
07	Jorge Darro Susa	79185122	Dg 46 Bis Sur No. 16C-23	3123706312		[Firma]
08			Dg 46 Bis Sur No. 16C-34			
09			Dg 46 Bis Sur No. 16C-28			
10			Dg 46 Bis Sur No. 16C-22			
11			Dg 46 Bis Sur No. 16C-16			
12	Lorena Caceres	52359241	Dg 46 Bis Sur No. 16C-04	3124312999		[Firma]

Se realiza socialización del PMT en conjunto con la Señora Maria del Socorro Hernandez (Presidenta Junta de Acción Comunal), a quien se le informó sobre las actividades de obra en el segmento vial en mención. Cabe resaltar que el día de la visita, no se encontraron algunos propietarios de los predios, razón por la cual la Presidenta JAC, les socializará la actividad que se realizó para que toda la comunidad tenga conocimiento de las Actividades de obra que se adelantan.

 ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA MEJOR TRABAJA CON SEGURIDAD	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ		ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ	ALCANTARA DE BOMBAS S.A. - SUCURSAL S.A. Rua da Liberdade, 100 Rio de Janeiro, RJ
--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CINCOVENA	ZONA DE OBRA	COLONIAS Y CANTAS	VOLUNTARIOS	MANEJO DE POTENCIAL	NARRACION YA LEYENDA	COORDINAR BANCOS
						

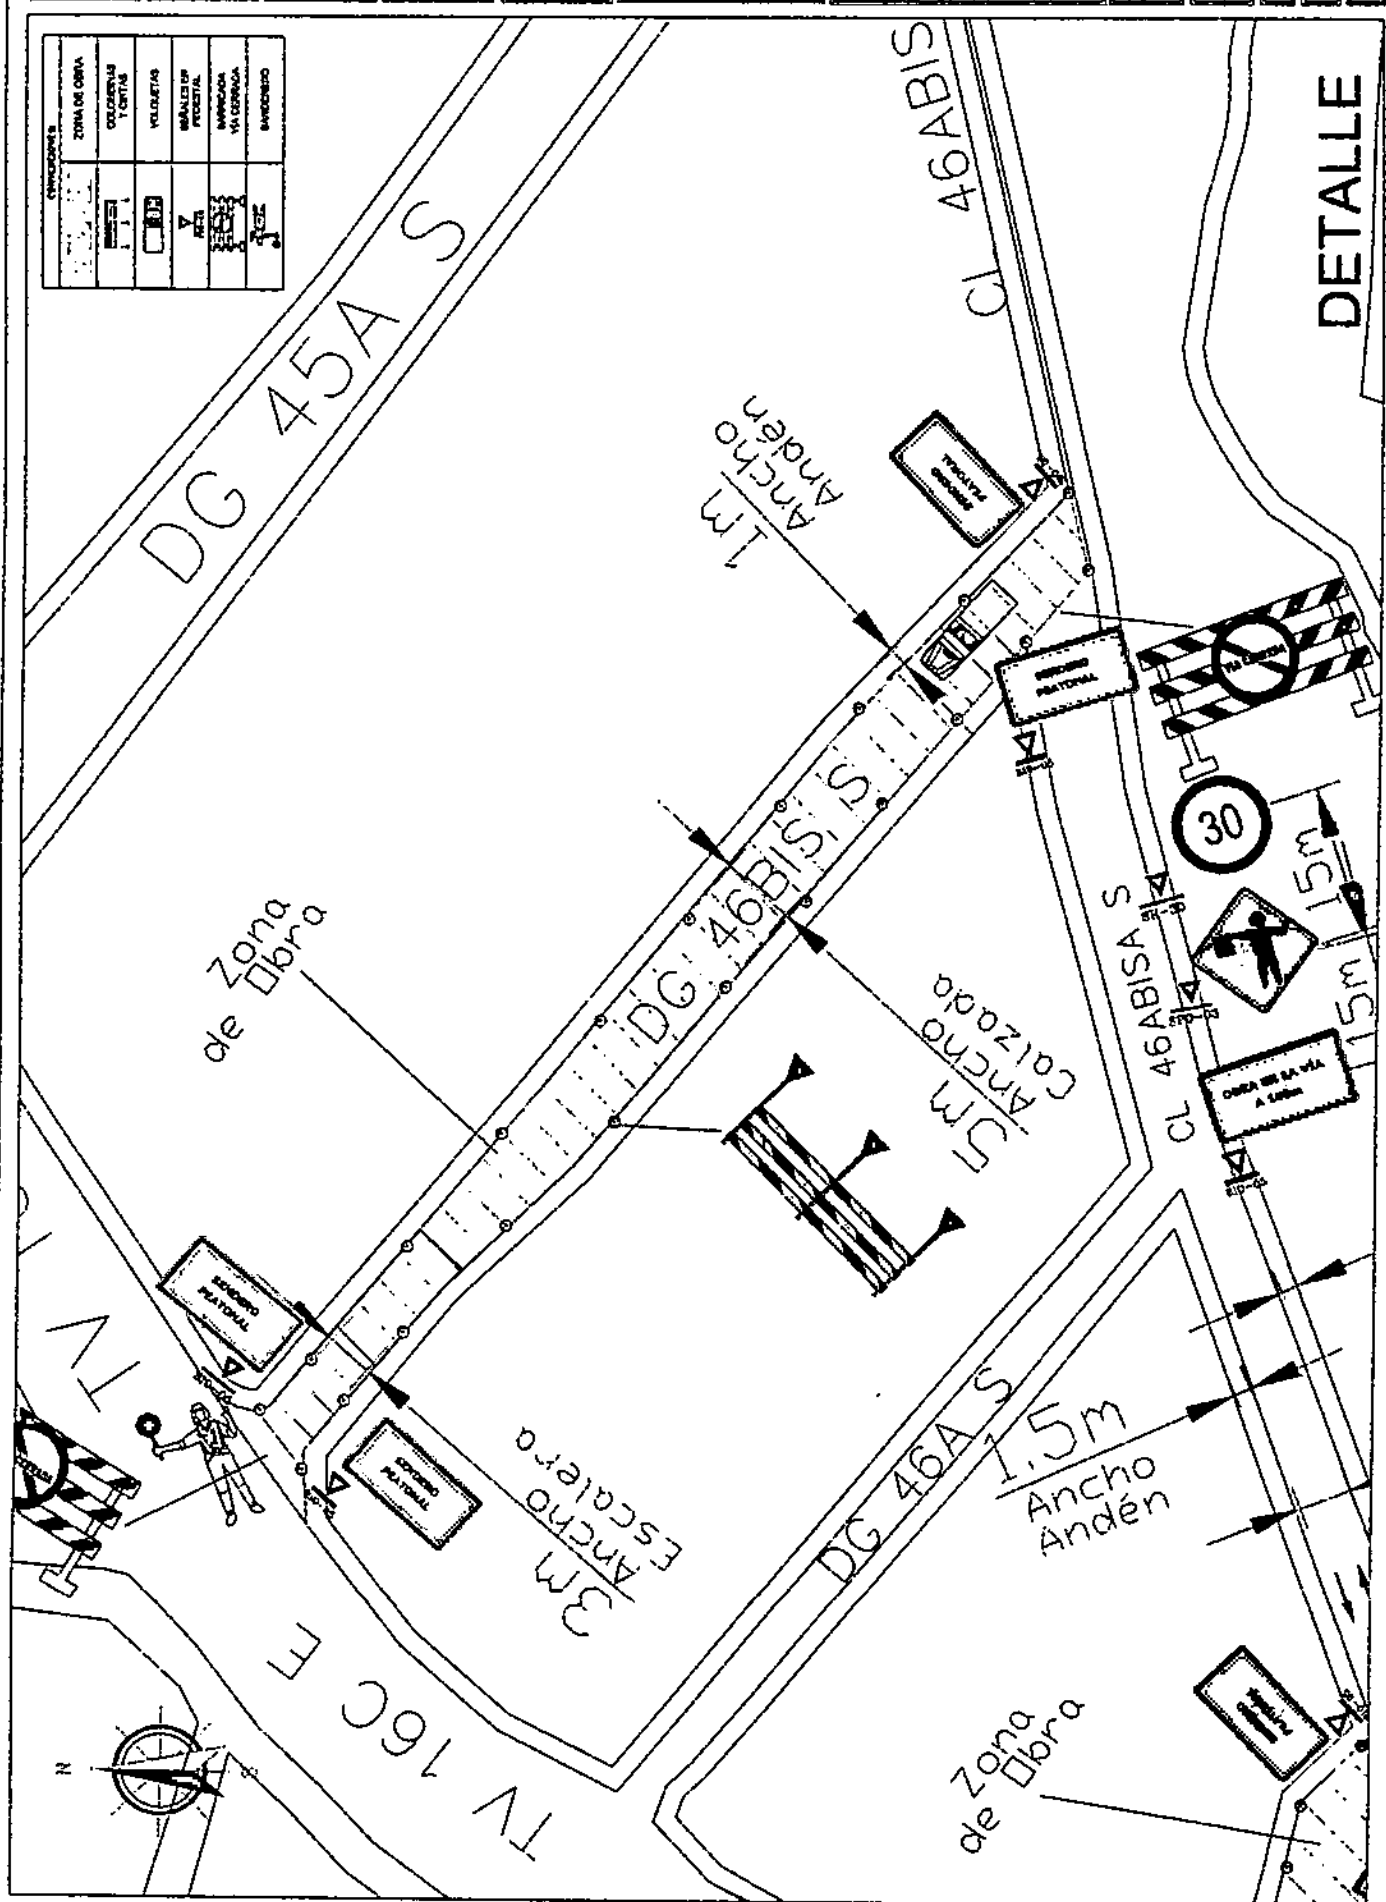

2549 2700

ANEXO No. 8

FORMATO DE ACTA DE SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)

FECHA: 04/02/20

CONTRATO No. FOLSC 340-2019

HORA: 10:00 a.m.

LUGAR:

CIVS 4005040
50003951
KR 17A ESTE ENTRE CL
42CB8 SUR Y CL 42DBIS
SUR

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y3

CONTRATISTA: CONSORCIO MALLA VIAL BSC

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL ROAD DESIGN

TEMA: SOCIALIZACION CIERRE TOTAL CALZADA

Se realiza socialización del proyecto EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN BOGOTÁ D.C. GRUPOS 1,2 Y3 contemplado en el Contrato No.FOLSC 340-2019, el cual será ejecutado por el Contratista CONSORCIO MALLA VIAL BSC y supervisado por la Interventoria UNION TEMPORAL ROAD DESIGN. Se especifica a los miembros de la comunidad que se realizará CIERRE TOTAL DE CALZADA, para lo cual se plantea la alternativa de mitigación el Plan de Manejo de Tránsito PMT descrito a continuación para las siguientes vías:

KR 17A ESTE ENTRE CL 42CB8 SUR Y CL 42DBIS SUR


- Para el caso de los biciclistas, no aplica toda vez que la calzada a intervenir no cuenta con cicloruta y/o bicicarril.
- El tránsito vehicular se verá afectado con ocasión de la intervención para lo cual se propone que los vehículos continúen su recorrido por la TV 15C ESTE al Sur, la CL 43ABIS 8 al Oriente hasta la KR 17A ESTE, donde retomen su trayecto habitual.

- Los habitantes de los tramos intervenidos, una vez autorizado el PMT por parte de la SDM se dará inicio a la intervención, por lo cual durante el periodo de actividades constructivas se requiere la colaboración de cada uno de los residentes en la búsqueda temporal de parqueo de sus vehículos.
- Los cierres contarán con senderos peatonales transversales iguales o mayores a 1,5 metros, en zonas verdes o en rebozo existentes en el corredor, mediante brochas controlados para el acceso a residentes sin tener contacto con la zona de obra.

Las actividades anteriormente mencionadas tendrán una duración aproximada de tres (3) MESES y se ejecutarán en el periodo del 14 de febrero de 2020 hasta el 14 de Mayo de 2020. El horario de trabajo establecido es DESDE LAS 07:00 AM HASTA LAS 05:00 PM y el cierre efectivo será DURANTE LAS 24 HORAS.

La presente socialización, se realiza a los abajo firmantes.

No.	Nombre	Identificación	Dirección Predio	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Unio del Suelo	318822276	2121102	3144650139	marisol@unio.com	[Firma]
2	Pacho Reyes	4024204	421235	3144774399		[Firma]
3	Jorge Vasquez	7579903	4212095	3214526462		[Firma]
4	Luz Marina C.	51648812	421242643	3107120008		[Firma]
5	David Sanchez	79584892	Calle 73a 28	3165144662		[Firma]
6	Lina Garcia	52466083	Tp 1666472	3158077347		[Firma]
7	José Alberto Gamali	79492304	164211412	314423502		[Firma]
8	Luz Angela Yane	51903074	164211412	314476244		[Firma]
9	Ella Zamora		11422022			[Firma]
10	Rafael Gomez	190844		3702260729		[Firma]
11	Milena Benito	45740644	164211412	3731328735		[Firma]
12	Luz Ortiz	41690567	164211412	3219260240		[Firma]
13	José Luis Amador	164211412	164211412	3219260240		[Firma]
14	Enrique Rojas	51282122	114211412			[Firma]
15	Andrés Morales Lora	59256760	1141811412	370641173		[Firma]
16	José Antonio	462416				[Firma]
17	Rocio Zuluaga	113576540	Calle 123 Sur 11412	3102367703		[Firma]
18	Fabio Quiroga	5366163	CL 123 Sur 11412	3102367703		[Firma]
19	Laura Patricia	7710773672	CL 123 Sur 11412	3138075807		[Firma]
20	Laura Carrasquilla	7710773672	CL 123 Sur 11412	3106688224		[Firma]
21	Edilio Rodriguez	71709717	CL 123 Sur 11412	3203505345		[Firma]
22	Edilio Barrios	7023943057	CL 123 Sur 11412	3204102099		[Firma]
23	Leidy Burbano	52849119	CL 123 Sur 11412	3144536326		[Firma]
24	ANGEL TINA ESPINOSA	1022441396	CL 123 Sur 11412	3222701305		[Firma]
25	Diana A Ramirez	52744251	CL 123 Sur 11412	3108867714		[Firma]
26	Laura Zamora	21708476	Tp 1666472	3203828076		[Firma]
27	Josi PATAJO	15468405	Calle 47D 16605	3133227144		[Firma]
28	Luz Patricia Calderon	705429282	CL 123 Sur 11412	3203828076		[Firma]
29	Ronald Gómez Rojas	1026255986	CL 123 Sur 11412	3022727172		[Firma]
30	Usimu Carrera	1110173572	KR 17A ESTE 4209	324490615		[Firma]
31						
32	Se realiza socialización del PMT en conjunto con la Señora Maria del Socorro					
33	Hernandez (Presidenta Junta de Acción Comunal Barrio Alto del Uruguay) a quien se					
34	le informó sobre las actividades de obra en el Segmento vial en mercados.					
35						
36						

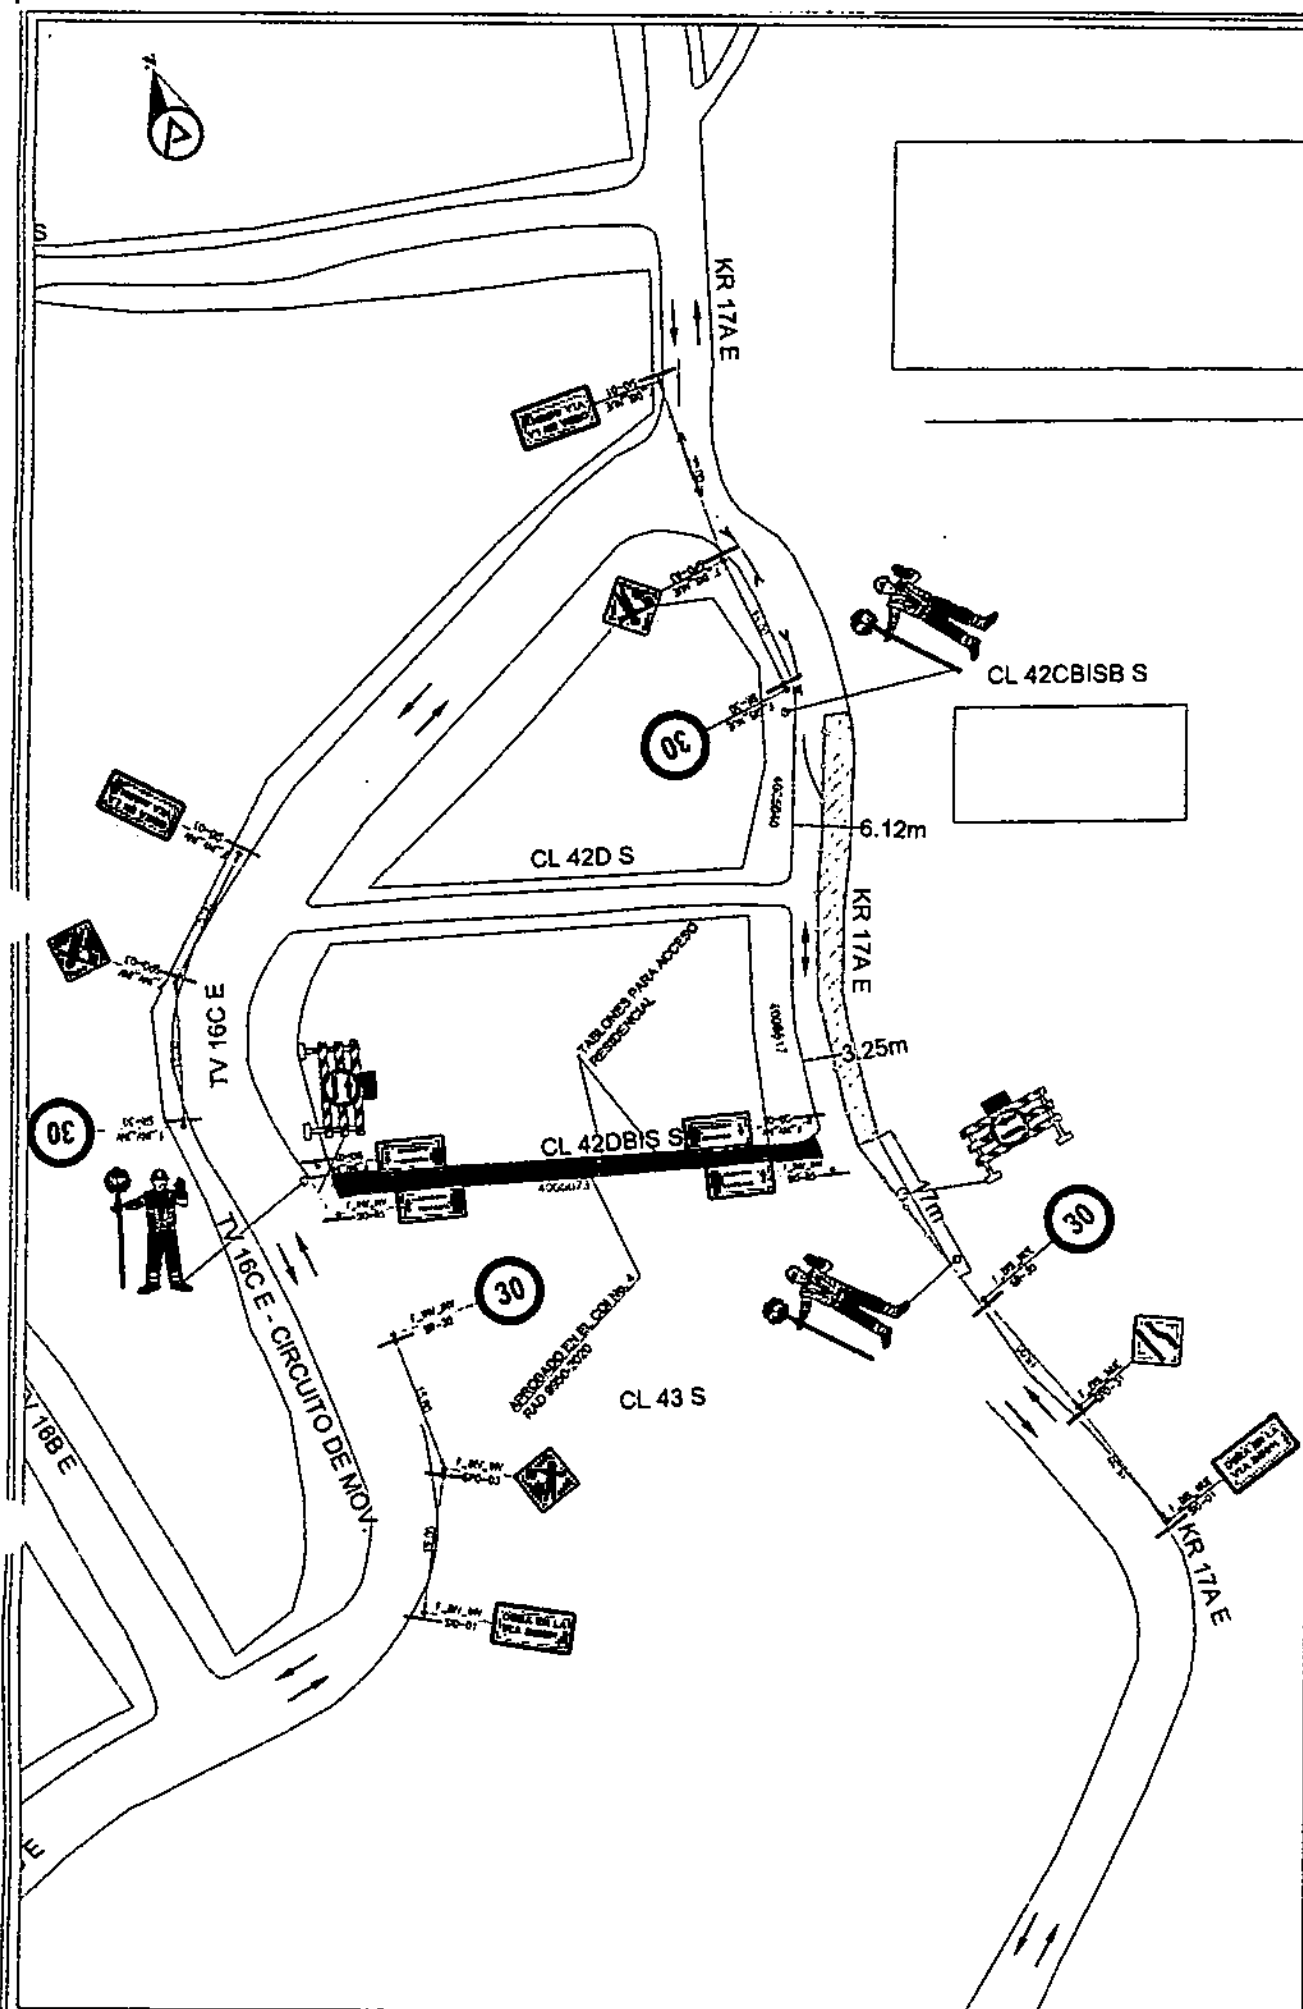

	CONSORCIO VIAL BSC DE MEDIANE	PLANNING CONSULTING	FECHA ELABORACIÓN 03/02/2020	CONTENIDO PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO PARA ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL	ESCALA Gráfico Altimétrico 2
					PROYECTO Construcción de Malla Vial Medellín - Bogotá
