



STEST

202534600766101

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 17 de 2025

Señora

PAULA JOYS

NO REGISTRA

NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC

Referencia: Contrato de Interventoría IDU-599-2020. "Interventoría integral a la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarística (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur y obras complementarias en Bogotá D.D. " Grupo 1."
Contrato de Obra IDU-345-2020. "Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 hasta la autopista sur y obras complementarias en bogotá, d.c". grupo 1"

Asunto: Envío Respuesta Al Radicado Número 202518500937202 345 2020

Respetada Señora,

En atención a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con relación a la ejecución del Contrato de Obra IDU 345 de 2020, a través del radicado de la referencia, en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 "Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", obrando dentro del término legal concedido, a continuación, se procede a dar respuesta a las inquietudes que usted realiza en los siguientes términos:

(...) "y el Puente Venecia cuando lo van a intervenir? No creen que ya tres años en una obra que a la fecha no va por el 50% de avance es suficiente razón para declararle la caducidad a ese contrato? Hasta cuando debemos seguir soportando la inmovilidad de la zona, ¿el incremento de la contaminación ambiental y el daño en nuestros predios? (...)"

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202534600766101

Información Pública

Al responder cite este número

Rta: De acuerdo con lo solicitado el apoyo a la supervisión del IDU requirió un pronunciamiento por parte del contratista. En respuesta, este allegó el comunicado D-000022948, radicado bajo el número IDU 202552600968232 del 08 de julio de 2025, en el cual manifestó lo siguiente:

(...) “el Consorcio Eucarístico Carrera 68 – Grupo 1 se permite informar que, desde la estructuración del contrato, la construcción del puente de Venecia fue concebida en dos etapas, cada una de las cuales comprende la ejecución de cimentaciones, apoyos, estructura metálica y superestructura.

Como se puede evidenciar en la siguiente tabla la cual contiene los porcentajes de avance de la obra con corte del mes de junio de 2025.

Descripción	Programado	Ejecutado
Puente completo	46,22%	50,93%
Construcción etapa 1	56,80%	63,93%
Construcción etapa 2	0,00%	5,86%

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

Este Plan Detallado de Trabajo – PDT, corresponde al porcentaje de avance que se debería tener en el proyecto a la fecha, por tal motivo al estar el valor del avance ejecutado por encima del avance programado se da a entender que la obra no tiene retrasos y se ha realizado la obra como se programó.

Sin embargo, se aclara que la primera etapa se ha visto interrumpida por interferencias con la red matriz de Acueducto El Carmen y General Santander, las cuales a su vez se encontraban condicionadas por la reubicación de una cámara de vigilancia ubicada en la Carrera 53A con Autopista Sur. No obstante, estas interferencias presentan un avance del 90 % en su solución y se encuentran próximas a finalizar, lo que permitirá retomar las actividades de pilotaje y la construcción de los apoyos restantes.

Adicionalmente, es importante resaltar que las actividades del Consorcio no se han detenido. Actualmente se adelantan labores de prefabricación en taller y preensamble en campo de la viga metálica principal del puente. De igual manera, se ejecutan actividades relacionadas con estructuras del sistema BRT en el eje 5, como parte de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>


Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202534600766101
Información Pública
Al responder cite este número

las labores preliminares al pilotaje, así como obras civiles asociadas a la reubicación de las redes matrices El Carmen y General Santander, tal como se evidencia en el siguiente registro fotográfico:

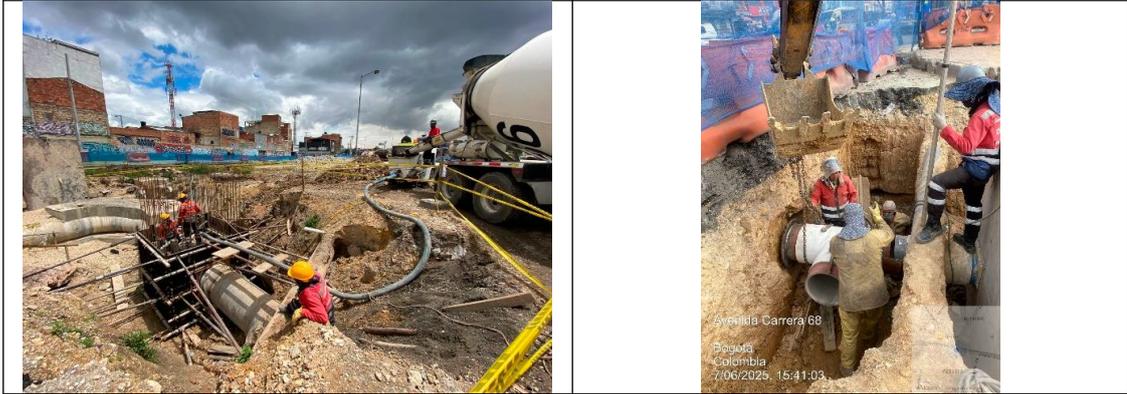

Intervención Red Matriz



Intervención Red Matriz

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202534600766101
Información Pública
Al responder cite este número



construcción de estructura de vía en el eje 5



Construcción Vigas - Taller



Construcción de anclajes para red matriz

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202534600766101
 Información Pública
 Al responder cite este número



Vigas que se encuentran en zona de obra

Cabe anotar que, una vez finalice la intervención de la red matriz, se retomarán y continuarán las actividades correspondientes a la construcción del puente vehicular de Venecia, cuya terminación se tiene proyectada en un plazo aproximado de 18 meses.” (...)

Pronunciamiento IDU: De acuerdo con la respuesta emitida por el contratista, el Instituto de Desarrollo Urbano, a través del apoyo a la supervisión, realizara el seguimiento correspondiente en coordinación con la interventoría al cumplimiento en la ejecución de las obras, conforme al PDT suscrito.

Es importante resaltar que dicho seguimiento se realiza semanalmente en los comités técnicos conformados por el IDU, la interventoría y el contratista.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202534600766101

Información Pública


Al responder cite este número

Asimismo, respecto a lo indicado por el contratista, el puente cuenta con un proceso constructivo estipulado en el PDT. En este sentido, el contratista debe ejecutar las actividades conforme a lo allí establecido.

Por otra parte, en relación con la insuficiencia de personal en obra, el Instituto ha venido requiriendo de manera diaria al contratista la incorporación de mayor recurso humano en campo. Si bien las actividades constructivas se encuentran en ejecución, es necesario enfatizar que el contratista debe optimizar el rendimiento en la ejecución de las obras, a fin de garantizar el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

Finalmente, se informa que estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra respuesta.

Cordialmente,



LUIS FERNANDO QUESADA SALTARIN

Director Técnico de Construcciones

Firma mecánica generada el 17-07-2025 04:14:49 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: KARLA GABIRELA RAMIREZ TOLOZA-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: ALVARO FRANCISCO ARROYO CAYCEDO-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Elaboró: CLAUDIA FABIOLA GARCIA PINZON-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.
