



STEST

202534600987241

Información Pública

Al responder cite este número

Bogotá D.C., Septiembre 11 de 2025

Señor

FERNANDO ANONIMO

NO REGISTRA

NO REGISTRA

Bogotá - Bogotá DC

Referencia: **Contrato de Interventoría IDU-599-2020.** "Interventoría integral a la construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarística (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur y obras complementarias en Bogotá D.D. " Grupo 1." **Contrato de Obra IDU-345-2020.** "Construcción para la adecuación al sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico (Carrera 68) desde la Carrera 9 hasta la autopista sur y obras complementarias en Bogotá, D.C". Grupo 1"

Asunto: Envío Respuesta Al Radicado Número 202518501248202 345 2020

Respetada Señor Fernando,

En atención a la solicitud radicada al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, con relación a la ejecución del Contrato de Obra IDU 345 de 2020, a través del radicado de la referencia, en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 "Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones", obrando dentro del término legal concedido, a continuación, se procede a dar respuesta a las inquietudes que usted realiza en los siguientes términos.

(...) "Para cuando la obra de la 9a con 170 q está parada hace ya mucho tiempo. ¿Lo mismo el Puente de Venecia y la Autosur que dificulta el ingreso a la ciudad? Solo muestran al alcalde @CarlosFGalan inaugurando obras. (...)"

Rta: De acuerdo con lo solicitado el apoyo a la supervisión del IDU requirió un pronunciamiento por parte del contratista. En respuesta, este allegó el comunicado D-

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202534600987241

Información Pública

Al responder cite este número

000024088, radicado bajo el número IDU 202518501248202 del 28 de agosto de 2025, en el cual manifestó lo siguiente:

“(…)

1. *La actividad de demolición de la intersección Elevada de la Autopista Sur inició el 26 de abril de 2023 y finalizó el 12 de noviembre de 2023. A partir de dicha fecha el Consorcio ha ejecutado actividades de pilotaje, construcción de los dados, pilas, construcción de estribos, fabricación y montaje de estructura metálica de las zonas norte, oriental y occidental sur. Así mismo, se han ejecutado en paralelo actividades de traslado de redes las cuales son necesarias para la construcción del restante del puente que hoy en día no es posible ejecutar.*
2. *Para la ejecución de actividades del puente de Venecia se tiene 5 frentes de obra, los cuales se dividen en las siguientes actividades:*
 - *Empalme de viga metálica en campo.*
 - *Actividades de pilotaje.*
 - *Construcción de apoyos.*
 - *Instalación de red matriz-General Santander.*
 - *Construcción de cámaras red matriz-General Santander*

En estos frentes se cuenta con 57 personas realizando labores, entre las cuales se encuentran, ayudantes, oficiales, maestros, soldadores, SST, operadores y comisión de topografía.

Es importante recordar que por fuera de la obra también se realizan actividades, como los son la construcción de Pilotes Prefabricados, corte y ensamble de estructura metálica en el taller. Se adjunta registro fotográfico de las actividades que se han realizado y se continúan realizando.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202534600987241
Información Pública
Al responder cite este número



Empate Red Matriz-El Carmen



Construcción red matriz – General Santander



Construcción Vigas - Taller

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>


Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202534600987241
Información Pública
Al responder cite este número




Descargue de vigas para posterior empalme en obra

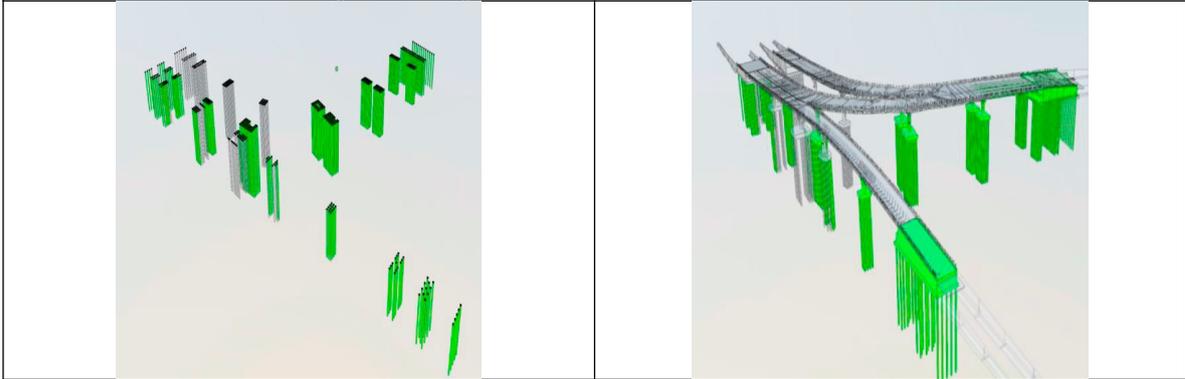

Esquema de pilotaje (el color verde representa lo instalado), recordar que estos elementos no son posible de observar a diferencia de los apoyos y viga metálica

Esquema del puente con apoyos. En la fase 1, se instalaron 375 pilotes de 497 para el puente de Venecia. Con corte al 10/08/2025, se instalaron 399 de 497 pilotes.

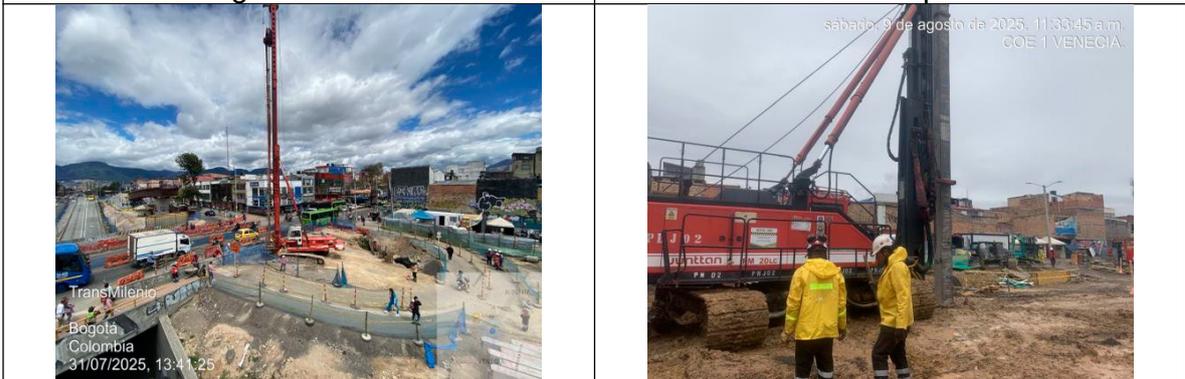

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202534600987241

Información Pública

Al responder cite este número

Actividad de pilotaje en el Eje 3

3. *Se reitera que las actividades del Consorcio no se han detenido. Actualmente se continua con las labores de prefabricación en taller y preensamble en campo de la viga metálica principal del puente. De igual manera, se ejecutan actividades relacionadas con estructuras del sistema BRT en el eje 5, como parte de las labores preliminares al pilotaje, así como obras civiles asociadas a la reubicación de las redes matrices El Carmen y General Santander.*
4. *Se aclara que la primera etapa se ha visto interrumpida por interferencias con la red matriz de Acueducto El Carmen y General Santander, las cuales a su vez se encontraban condicionadas por la reubicación de una cámara de vigilancia ubicada en la Carrera 53A con Autopista Sur. No obstante, una vez reubicada la cámara de vigilancia a cargo de la Secretaría de Seguridad se reanudó actividades de Red matriz y se entregó al EAAB el 24 de julio del 2025, día el cual se realizó el empate y se puso en funcionamiento esta nueva red. Esta red condicionaba el pilotaje; sin embargo, una vez puesta en funcionamiento la nueva red se inició la actividad de pilotaje.*



5. *Con relación a las obras sobre el avance del puente de Venecia, contrato IDU-345-2020, el consorcio reitera que, desde la estructuración del contrato, la construcción del puente de Venecia fue concebida en dos etapas, cada una de las cuales comprende la ejecución de cimentaciones, apoyos, estructura metálica y superestructura. Como se puede evidenciar en la siguiente tabla la cual contiene los porcentajes de avance de la obra.*

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

5



STEST

202534600987241

Información Pública

Al responder cite este número

PDT CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICUL		
DESCRIPCIÓN	PROGRA MADO	EJECUTA DO
PUENTE COMPLETO	48.70%	51.27%
CONSTRUCCIÓN ETAPA 1	60.00%	64.17%
CONSTRUCCIÓN ETAPA 2	1.40%	6.71%

Fuente: Consorcio Eucarístico Cra.68 - 2025

Este Plan Detallado de Trabajo – PDT, corresponde al porcentaje de avance que se debería tener en el proyecto a la fecha, por tal motivo al estar el valor del avance ejecutado por encima del avance programado se da a entender que la obra no tiene retrasos y se ha realizado la obra como se programó.

Respuesta del IDU: De acuerdo con la respuesta emitida por el contratista, el Instituto de Desarrollo Urbano, a través del apoyo a la supervisión, realizará el seguimiento correspondiente en coordinación con la interventoría al cumplimiento en la ejecución de las obras, conforme al PDT suscrito.

Es importante resaltar que dicho seguimiento se realiza semanalmente en los comités técnicos conformados por el IDU, la interventoría y el contratista.

Asimismo, respecto a lo indicado por el contratista, el puente cuenta con un proceso constructivo estipulado en el PDT. En este sentido, el contratista debe ejecutar las actividades conforme a lo allí establecido.

Adicionalmente, el contrato dispone de un punto IDU de atención destinado a recibir quejas y reclamos relacionados con las afectaciones generadas durante la ejecución de la obra. A continuación, se presentan los datos de contacto del Punto IDU para su conocimiento:

Dirección: Calle 30 sur # 52C -24

Correo electrónico: puntoidu345@mhc.com.co

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6



STEST

202534600987241

Información Pública

Al responder cite este número

Cel 3222344219
Fijo 601 8088845
Horario L-v 8:00 am a 4:00 pm jornada continua

Se informa que el presente requerimiento ha sido tramitado en debida forma, emitiéndose respuesta de fondo, integral y oportuna, en estricto cumplimiento de los términos previstos en la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el Título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Finalmente, se informa que estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra respuesta.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 11-09-2025 05:37:53 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: ANGELA PATRICIA MEDINA RODRIGUEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: KARLA GABIRELA RAMIREZ TOLOZA-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Revisó: ALVARO FRANCISCO ARROYO CAYCEDO-Subdirección Técnica De Ejecución Del Subsistema De Transporte
Elaboró: CLAUDIA FABIOLA GARCIA PINZON-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7
