

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Observatorio Ciudadano Local

Localidad de La Candelaria

Informe de Ejecución 2025

Tabla de contenido

1	PRESENTACIÓN	3
2	INVENTARIO DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.....	4
2.1	ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD	4
2.2	ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD.....	7
3	PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025	8
3.1	PROYECTOS DE CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO	8

1 Presentación

En atención a la solicitud del Observatorio Ciudadano, se presenta el siguiente informe, que registra la ejecución de obras y recursos en la Localidad de La Candelaria, durante la vigencia 2025.


El informe presenta inicialmente el inventario de vías y espacio público de la ciudad y luego está organizado de acuerdo con la distribución de las áreas funcionales de la entidad: proyectos, construcciones y conservación.

Es importante destacar que toda la información aquí contenida se puede consultar en la página web del Instituto: <https://www.idu.gov.co> y la información sobre el estado de las vías en el geoportal: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>


2 INVENTARIO DE MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD

2.1 ESTADO DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD.


Malla Vial Arterial

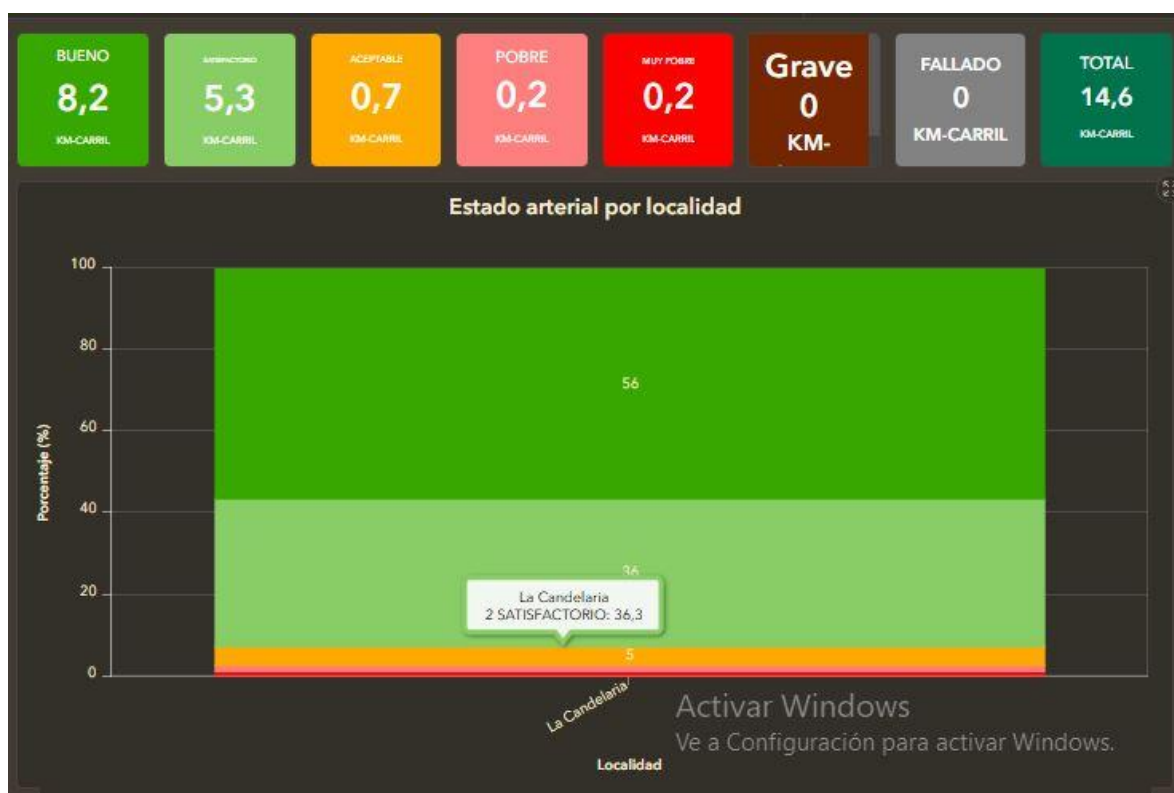

Malla Vial Intermedia

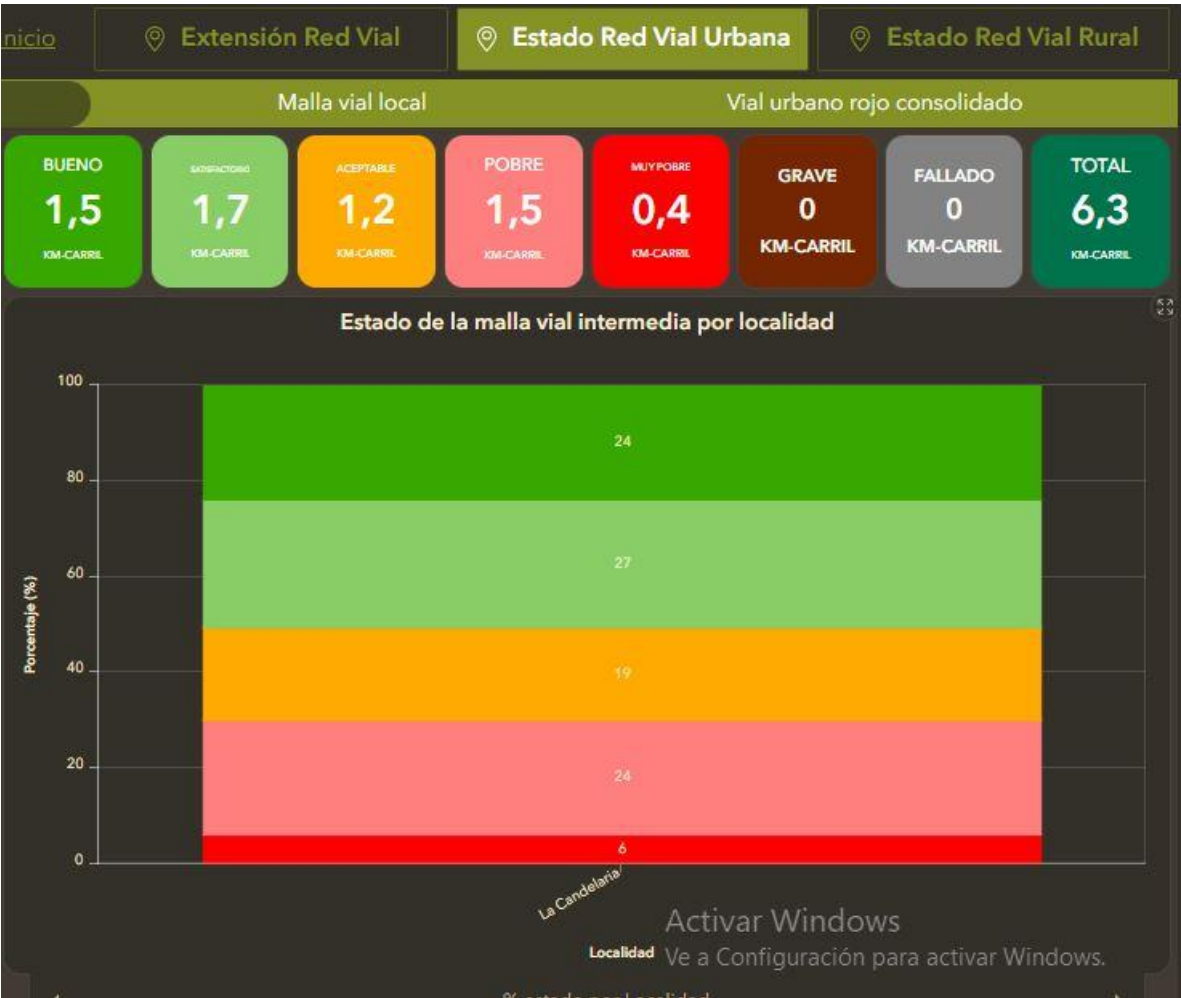

Malla Vial Local

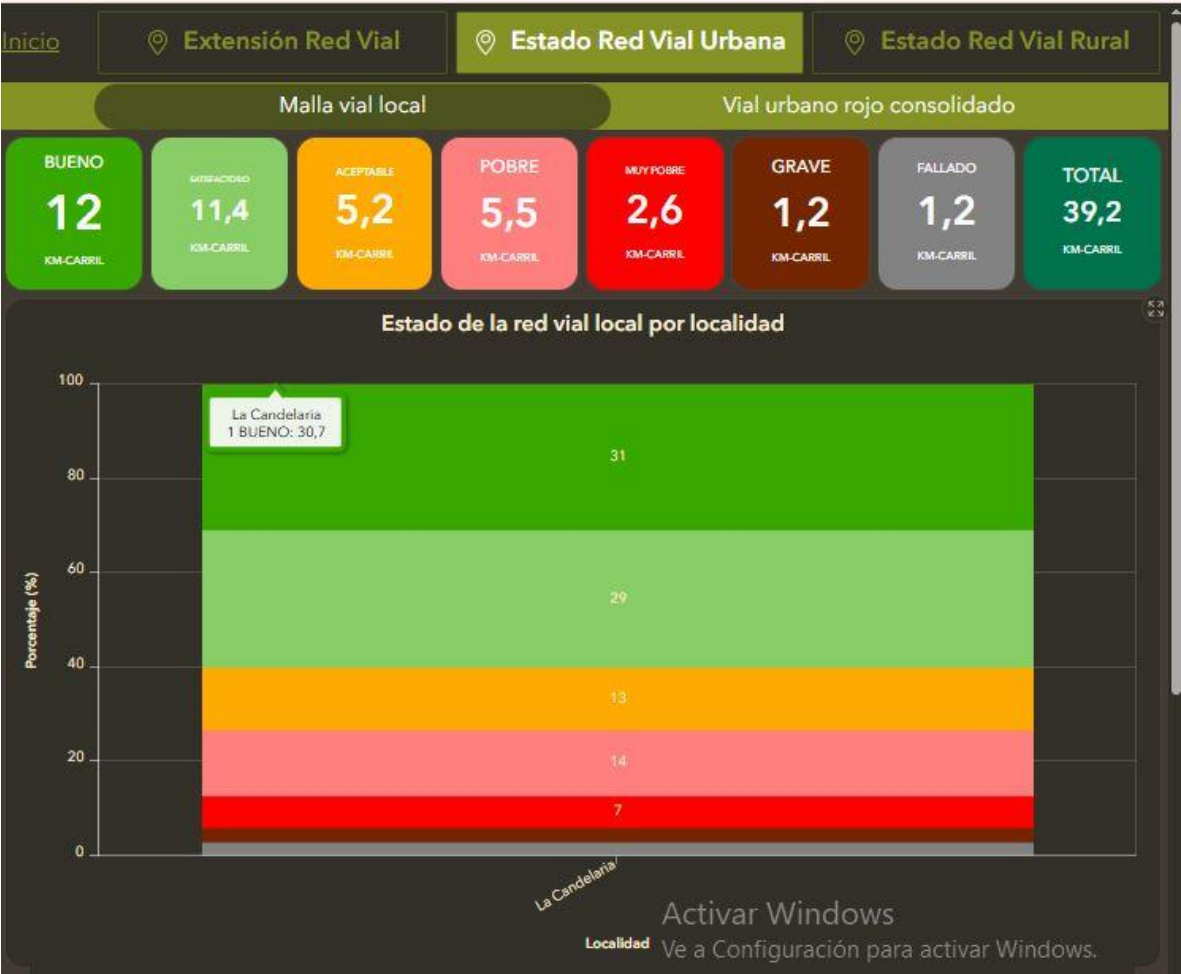

2.2 ESTADO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD



3 PROYECTOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2025

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN - MANTENIMIENTO

Contrato: IDU – 1689 - 2022

Objeto: Conservación puentes peatonales – vigencia 2022


Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1689-2022	Número de contrato:	IDU-1695-2022
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	CONSORCIO PUENTES 8-11	Contratista:	CONSORCIO ECOSADING
Valor total:	\$ 23.834.882.543,00	Valor total:	\$ 3.447.647.990,00
Fecha de inicio:	17/01/2023	Fecha de inicio:	17/01/2023
Fecha de finalización:	24/02/2025	Fecha de finalización:	24/02/2025
Empleos generados:	0	Empleos generados:	0

Ejecución:

Fecha de actualización: 24/02/2025	
Avance programado: 100,0%	
Avance ejecutado: 100,0%	
Estado del contrato: TERMINADO Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	

Registro Fotográfico:

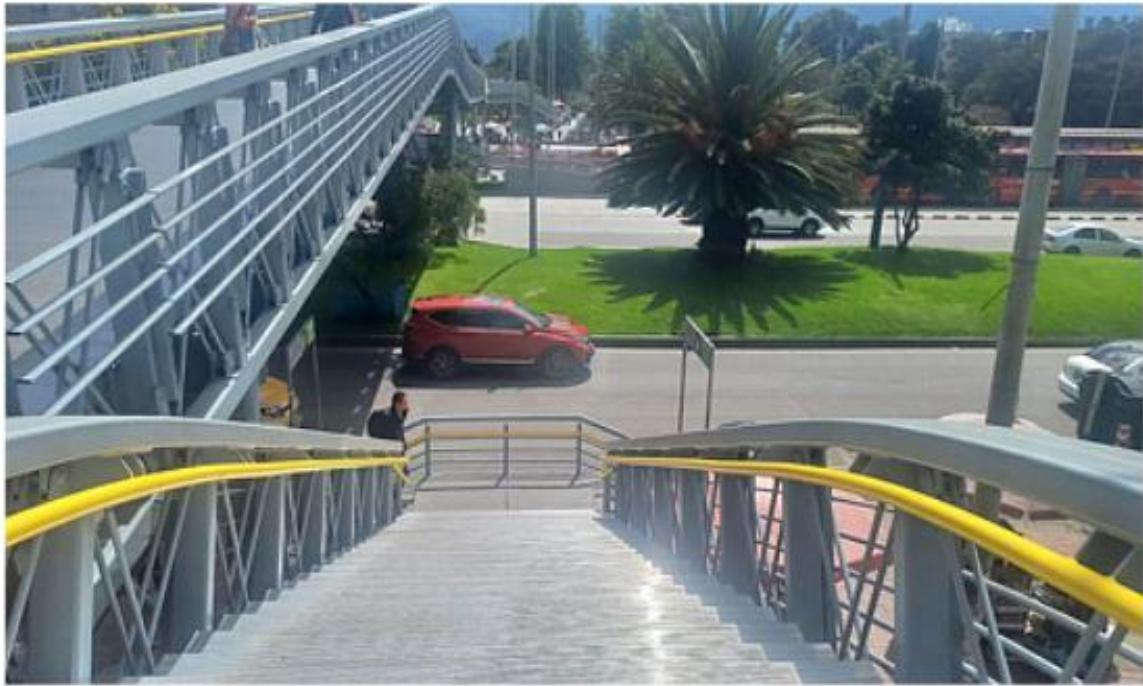

Contrato: IDU – 1746 - 2021

Objeto: Conservación de la malla vial que soporta las rutas del SITP 2021 - Grupo 3

Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1746-2021	Número de contrato:	IDU-1772-2021
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	INFERCAL S.A	Contratista:	CONSORCIO 2021-INCOP
Valor total:	\$ 44.301.221.036,00	Valor total:	\$ 6.893.520.427,00
Fecha de inicio:	23/12/2021	Fecha de inicio:	23/12/2021
Fecha de finalización:	29/08/2025	Fecha de finalización:	29/08/2025
Empleos generados:	44	Empleos generados:	31

Activar Wind

Ejecución:

Avance programado: 100,0%

Avance ejecutado: 49,0%

Estado del contrato: CADUCADO

Registro Fotográfico:



Contrato: IDU – 1405 - 2023

Objeto: Limpieza de las estructuras hidráulicas de drenaje de las vías y lavado de las piletas del eje ambiental.

Información contractual:

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1405-2023	Número de contrato:	NO APLICA
Tipo:	Convenio Interadministrativo	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	AGUAS DE BOGOTA SA SP	Contratista:	No aplica
Valor total:	\$ 15.098.254.092,00	Valor total:	\$ 0,00
Fecha de inicio:	05/06/2023	Fecha de inicio:	
Fecha de finalización:	15/02/2025	Fecha de finalización:	
Empleos generados:	50	Empleos generados:	0

Registro Fotográfico:

