

FORMATO				
ACTA DE REUNIÓN COMITÉ IDU No. 3				
CODIGO	PROCESO		VERSION	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA		2.0	
Contrato No.: 353 DE 2020		HORA INICIO:	8:35:00 a. m.	Hoja 1 de 2
FECHA:	26/05/2021	HORA DE FINALIZACIÓN:	9:20:00 a. m.	Acta N° 3
<b>PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCHARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTA, D.C</b>				
<b>ORDEN DEL DÍA</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Avance general del proyecto, etapas y cronograma de ejecución.</li> <li>2. Componente Técnico</li> <li>3. Componente de Tránsito</li> <li>4. Componente Forestal</li> <li>5. Componente manejo de fauna silvestre</li> <li>6. Componente de Arqueológica</li> <li>7. Componente SST</li> <li>8. Componente social</li> <li>9. Inquietudes de la Comunidad</li> </ol>				
<b>DESARROLLO DE LA REUNIÓN</b>				
<p>Se dio inicio al comité IDU No. 3 con la intervención de la profesional Social de la Interventoría Consorcio IDU 2020, quien dio la bienvenida a la reunión y agradeció la asistencia de la comunidad, seguidamente dio la palabra a la Residente Social del Contratista, quien presentó el objetivo de la reunión, el cual corresponde en presentar a la comunidad el avance del proyecto en sus diferentes componentes acerca de lo desarrollado en el último mes. A su vez la Residente Social del Contratista mencionó que en las reuniones de inicio que se llevaron a cabo durante el mes de enero de 2021, se brindó toda la información general del contrato, por lo tanto, aclaró que esta información ya no será proyectada; así mismo hizo alusión a los 2 comités IDU ya realizados por el Contratista</p>				
<p>Seguidamente, la Residente Social del Contratista informó que el objetivo del Contrato IDU 353 de 2020 es la "Construcción para la adecuación del Sistema Transmilenio de la Avenida Congreso Eucarístico Carrera 68 desde la Carrera 48 hasta la Carrera 9 y obras complementarias en Bogotá". Grupo 9, posteriormente informó que se dará lectura a algunos aspectos a tener en cuenta en el desarrollo de la reunión, tales como:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al ingresar a la reunión silencie su micrófono y apague su cámara, mantenerlas apagadas durante la presentación del proyecto.</li> <li>2. Para el registro de su asistencia por favor diligenciar los enlaces que estarán enviando por el chat.</li> <li>3. Las preguntas que surjan colóquelas en el chat de la reunión para ser aclaradas al finalizar la presentación, y/o en la sección de inquietudes para que la comunidad pueda pedir la palabra alzando la mano ubicada en la parte inferior de la plataforma.</li> <li>4. En primer lugar se contestarán las inquietudes registradas en el chat y posteriormente, se habilitará el micrófono ordenadamente a las personas que pidan la palabra para que formulen su pregunta.</li> </ol>				
<p><b>1. Avance general del proyecto, etapas y cronograma de ejecución.</b> La Residente Social por parte del Contratista dio paso al componente técnico con la intervención del Residente de Obra del Contratista quien realizó su presentación indicando que las actividades realizadas del 27 de abril al 26 de mayo de 2021, fueron actividades de topografía tales como el chequeo de los equipos, levantamiento de redes hidráulicas y replanteos sobre el corredor. A su vez manifestó con apoyo visual en la presentación proyectada, que se ha evidenciado la presencia de redes de aguas lluvias y sanitarias particularmente a la altura de la calle 100 con carrera 48, lugar donde quedará parte del colector pluvial. El Ing. Residente informó que se ha adelantado a su vez la demarcación de ciclo carril y de las redes secas, se ha trabajado en actividades de cimentación del puente peatonal que conectará la estación de la calle 100 con la futura estación de la carrera 19 y, se adelantaron actividades de remoción de tierra para dejar libre el espacio donde se establecerán las estructuras que cimentan el puente de la conexión sur oriental de la autopista norte con calle 100.</p>				

Continuó el Residente de Obra del Contratista mencionando que también se realizó una reunión con el DADEP para tratar el tema del mobiliario urbano perteneciente a esta Entidad, como son bancas, paraderos del SITP, entre otros.

De manera adicional, el Ingeniero Residente de Obra del Contratista hizo referencia que respecto al cuidado y mantenimiento de los monumentos ubicados sobre el corredor entre los que se encuentra el monumento José Antonio Anzoátegui ubicado sobre la oreja sur-oriental de la Autopista norte con Calle 100, Espejo de Luna ubicado en el World Trade Center y Stylos que se ubica en la Carrera 21 con Calle 100, se hizo la socialización con los predios cercanos y se comenzó a armonizar el tema en cuanto a los cuidados que se deben tener para estos, enfatizando que respecto al monumento Anzoátegui se realizó la actividad de topografía para evaluar la afectación del monumento antes del inicio de obra.

Por otra parte, informó a los asistentes que según el PDT de obra, tal y como se comentó en las reuniones de inicio y en reuniones anteriores, se iniciarán las actividades constructivas por el puente peatonal que conectará la actual estación Calle 100 con Autopista Norte y la estación Carrera 19 con Calle 100, para efecto de lo cual se está realizando la ubicación de los pilotes para dar inicio a la actividad requerida en este sector. Mencionó que también se proyectaron las redes de servicios públicos, ya que como se ha mencionado en reuniones con comunidad, se van a realizar renovaciones de las redes secas y húmedas sobre los andenes, razón por la cual manifestó que se está proyectando cómo será la instalación de estas sobre los andenes.

**2. Plan de Manejo de Tránsito:** Dando continuidad a la presentación de los distintos componentes del proyecto, se le otorgó la palabra al Residente de Tránsito del Contratista, quien explicó en qué consisten los planes de manejo de tránsito que se implementarán para el inicio de la etapa constructiva, por lo tanto, inició exponiendo sobre el avance en los PMT de obra requeridos para el desarrollo de las actividades; al respecto mencionó que actualmente está en gestión el PMT siete (7) solicitado ante la Secretaría de Movilidad y que corresponde al cierre de la calzada sur entre la Transversal 21 y la Carrera 19. Al respecto el Residente de Tránsito del Contratista aclaró que el mencionado cierre va a durar aproximadamente seis meses y la jornada de trabajo será por 24 horas, así mismo mencionó, que no se va a presentar afectación para el servicio de SITP, teniendo en cuenta que los paraderos que se encuentran en el lugar, serán trasladados hacia la Carrera 19 costado oriental, resaltó que para esta zona de cierre no hay proyección de desvíos de rutas, ni desvíos para vehículos particulares.

De manera adicional, mencionó que también se encuentra en trámite el PMT ocho (8) el cual comprende la Carrera 11 hasta la Carrera 9, igualmente aclaró que este PMT sigue en gestión ante la Secretaría de Movilidad y el horario de cierre sería de 24 horas, en el cual se va a afectar la calzada lenta del costado sur de la Calle 100 entre la Carrera 9 y Carrera 11; respecto a los desvíos, mencionó que no se presentarán sobre las vías aledañas y tampoco se presentarán afectaciones a las rutas del sistema SITP.

**3. Plan de Manejo Ambiental (Forestal, Fauna, Arqueología y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG – SST).** La Residente Ambiental del Contratista inició afirmando que se han adelantado las actividades plasmadas en el MAO como la renovación de permisos de trabajo nocturnos por las alcaldías locales, también la renovación de la resolución de silvicultural 3108 de 2019 y adecuación de terreno para actividades de pilotaje. Antes de pasar al componente forestal, la Residente Social del Contratista manifestó que, debido a inconvenientes con el chat de la reunión, se solicita a los asistentes que manifiesten sus inquietudes mediante el botón de la mano levantada para habilitarles el uso del micrófono.

**3. Componente Forestal:** Al respecto el Residente Forestal del Contratista, inicia haciendo mención a los recorridos adelantados con la comunidad y fomentados por el IDU donde se dio a conocer a los asistentes, el detalle y las particularidades de los tratamientos silviculturales llevados a cabo en Grupo 9, las diferentes especies arbóreas y las condiciones que permiten determinar qué tipo de tratamiento requiere cada uno, lo cual permitió establecer con base en previas mesas de trabajo con las entidades competentes, las posibles propuestas de cambio de tratamientos para las especies, para que de esta forma el número de talas no fuera tan alto y así permitirle a los árboles que se conserven o trasladen, seguir prestando el servicio de captadores de CO<sub>2</sub> para el disfrute de la comunidad. Dentro de las actividades propias del componente en el último periodo, informó el Ing. Residente Forestal, se continúa con los tratamientos silviculturales, procurando que, mediante los equipos y personal involucrados, los individuos no se vean dañados y/o alterados, los equipos utilizados deben tener la capacidad de mantener la integridad del árbol durante su extracción y transporte hasta su disposición final. También se están llevando jornadas de mantenimiento de los árboles que requieren abundantes cantidades de agua para no alterar mucho su estabilidad durante los traslados, se están evaluando árboles en esta condición que originalmente estarían para tala para cambiar este tratamiento para una posible reubicación y con base en lo inicialmente mencionado, se retomaron las actividades de tala para aquellas especies que no fue posible llevar a cabo un cambio de tratamiento.

**3. Componente C- "Manejo de la vegetación y el paisaje Avifauna":** La Residente Ambiental del Contratista retomó para explicar el componente de fauna, donde mencionó que se continúa con inspección de árboles, con la finalidad de determinar la presencia de nidos tanto activos como inactivos. Los árboles identificados con nidadas activas, son señalizados con el fin de no ser intervenidos en los diferentes tratamientos silviculturales y así mismo los árboles con nidada activa se les está realizando seguimiento, con la finalidad de verificar el tiempo de desarrollo que estos necesitan para abandonar el nido.

**3. Componente de Arqueología:** La exposición del presente componente, inicia con la exposición por parte de la profesional de arqueología del Contratista acerca de los monitoreos en las remociones de suelo que se han adelantado para la adecuación del puente peatonal de la 100, así como de las excavaciones referentes a los traslados de árboles. La profesional mencionó que dentro de las excavaciones realizadas no se ha profundizado hasta los puntos donde podría haber restos arqueológicos, sin embargo aclaró, se ha mantenido un control constante en caso de presentarse un hallazgo fortuito. Antes de pasar al componente SST la Residente Social del Contratista anuncia que en el chat ya se encuentra disponible el registro de asistencia para que los asistentes lo diligencien.

**3. Componente SST:** La Residente Ambiental del Contratista retoma con el componente SST, donde mencionó que se han venido adelantando actividades tales como:

- \* Inducción, capacitación y entrenamiento a trabajadores.
- \* Entrega y reposición de dotación y Equipo de Protección Personal - EPP
- \* Implementación de procedimientos de trabajo seguro.
- \* Inspección del Equipo de Protección Personal-EPP, áreas, herramientas y condiciones de trabajo.
- \* Investigación de accidentes de trabajo.
- \* Señalización de zonas de obra y campamentos.
- \* Implementación de protocolo de bioseguridad.
- \* Inspecciones preoperacionales diarias junto con el mantenimiento preventivo de Maquinaria Equipo y Vehículo - MEV.

**4. Componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica:** El componente social fue presentado por la Residente Social del Contratista, quien inició con lo relacionado al programa de atención a la ciudadanía donde se tienen 40 PQRSD cerradas a satisfacción, también se han realizado 43 recorridos urbanos donde se ha interactuado con la comunidad. La profesional del área social explicó las características y horarios del Punto IDU con sus respectivos canales de comunicación. Informó que se han desarrollado 50 reuniones extraordinarias, algunas en espacios puntuales, 46 reuniones interinstitucionales con entidades.

En cuanto al programa de cultura ciudadana resaltó que se vienen desarrollando actividades de capacitación de civismo con personal de obra y con la ciudadanía en campo, a cargo de la Profesional de Pedagoga del Contratista quien lidera la gestión cultural ciudadana del proyecto con el apoyo del personal del área social. El siguiente programa es el correspondiente a la información del proyecto, a partir del cual manifestó la Residente Social de la firma Contratista, se informa a la comunidad acerca de las actividades generales del proyecto a través de volantes de divulgación y de los puntos satélites de información, es este aspecto la profesional hizo énfasis en la socialización que se ha realizado respecto a la continuidad de los tratamientos silviculturales tales como, bloqueos, traslados y talas. El programa de gobernanza para la movilidad viene adelantando jornadas para la vinculación de mano de obra no calificada, priorizando las personas residentes de las localidades de influencia del proyecto, igualmente priorizando las poblaciones vulnerables avalas para la Secretaría de Desarrollo Económico y la Consejería Distrital de Víctimas.

La Residente Social del Contratista informó a los asistentes que el Comité IDU No 3 cuenta con la presencia de Transmilenio como cumplimiento al compromiso pactado en el Comité IDU No 2 a fin que quienes deseen presenten las inquietudes que tengan respeto a la operación del sistema.

5. Finalmente, la Residente Social por parte del Contratista, dio paso a las inquietudes presentadas por parte de la comunidad procediendo en primer lugar a la lectura de las inquietudes registradas en el chat y posteriormente se dio uso de la palabra a los asistentes que así lo solicitaron.

**INQUIETUDES DE LOS ASISTENTES**

1. Se abre el espacio de inquietudes donde la primera en manifestarse fue la señora Ivonne Messier que representa a la Secretaría de Integración social localidad de Barrios Unidos, quien pregunta sobre el abordaje de las hojas de vida que ella remitió al Contratista en meses pasados. La Profesional Social Sandra Ramírez respondió, confirmando que los perfiles remitidos por la señora Ivonne fueron enviados a talento humano del Compañía y que los procesos de selección que se vienen adelantando han sido recientes para auxiliares de tráfico, por lo que en este momento no se han considerado todas las hojas de vida que se dispusieron para evaluar, se espera que las vinculaciones se vuelvan graduales y progresivas a partir de ahora. La Profesional Social del Contratista le solicitó los datos de contacto a la señora Ivonne para articular el manejo de las bases de datos. La señora Ivonne pregunta si ya se sabe el número de personal no calificada que se necesita, a lo cual se le responde que el número no se ha determinado, e igualmente, la Profesional Social manifiesta que considera importante la articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico que es la entidad que avala la población vulnerable.




2. El Edificio 100 Street en representación de la señora Sandra Mariño pregunta si hay fecha establecida para las intervenciones desde la carrera 11 hasta la carrera 9 en lo que se refiere a andenes. El Residente de Obra del Contratista se permite responder a la pregunta, dice que se espera intervenir ese sector desde el 01 de julio de 2021.



Una vez resueltas todas las inquietudes de la comunidad, la Residente Social del Contratista da por finalizado el comité, agradeciendo a la comunidad por la asistencia y participación al espacio de socialización.

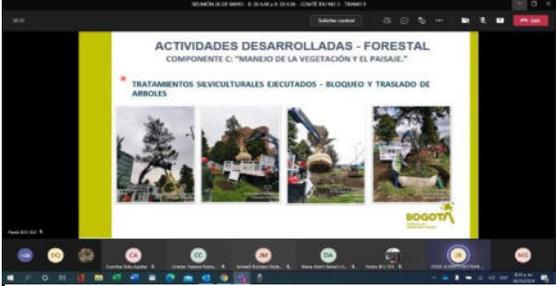
**Reporte de la reunión:** La Reunión de Comité IDU No 3 contó con 40 personas total conectadas, 14 asistentes por parte de la comunidad (conectados), de los cuales 11 registraron su asistencia en la herramienta empleada y 4 de ellos diligenciaron sondeo de opinión. No se obtuvieron nuevas personas para inscripción a Comité IDU.

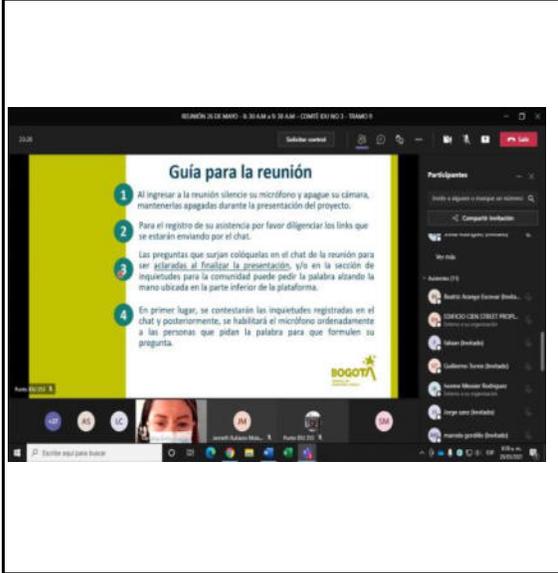
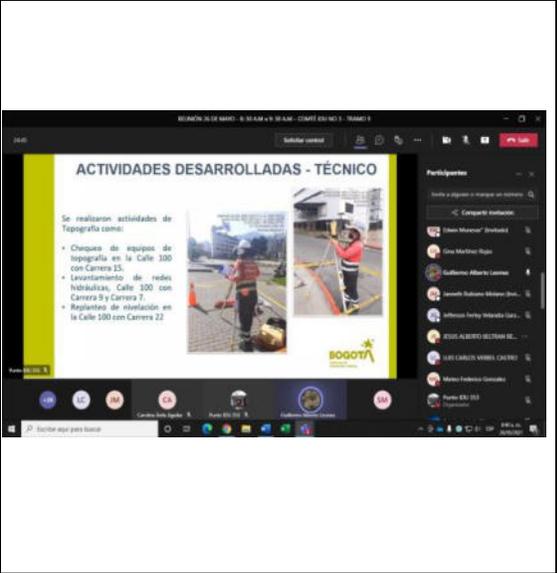
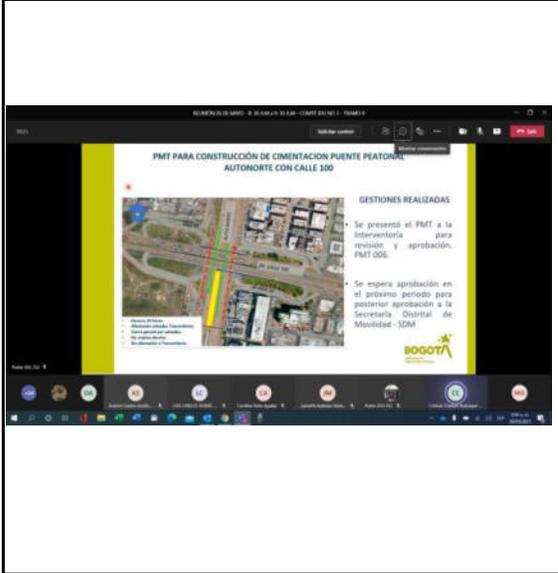
**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se establecieron compromisos.	N/A	N/A

FIRMAS		
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Tulia Andrea Santos	IDU / Coordinadora Técnica	
Víctor Jairo Alarcón	IDU / Coordinador Social	
Talia C. Corrales Ríos	Consortio IDU 2020/ Coordinadora Técnica	Talia C. Corrales R.
Wilson Pacasira González	Consortio IDU 2020/ Residente Técnico	
Fabián Lozano	Consortio IDU 2020/ Residente Forestal	
Jefferson Velandia Garzón	Consortio IDU 2020/ Residente SST	
Cristian Cruz	Consortio IDU 2020/ Residente Ambiental	
Ana Mariany Gutiérrez	Consortio IDU 2020/ Bióloga	
Janneth Rubiano	Consortio IDU 2020/ Profesional Social	Janneth Rubiano
Andrea Sánchez	Consortio IDU 2020/ Residente Social	
Guillermo Lesmes	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Residente Técnico	
Jovanny Vargas	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Especialista en Tránsito	
Cristian Naizaque	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Residente de tránsito	
Milena Palencia	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Residente SG-SST	
Diana Velasco	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Residente ambiental	
Gina Martínez	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional en Arqueología	Gina Martínez Vargas
Jesús Beltrán	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Residente Forestal	
Sandra Ramírez	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional Social	

Carolina Ávila Aguilar		Consortio Eucarístico Carrera 68/ Residente Social		
Luisa Fernanda Pineda		Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional en Comunicaciones		
Deissy Tatiana Sánchez		Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional en Pedagogía		
Mateo Federico González		Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional en Economía		
<b>ELABORÓ</b>		<b>RESPONSABLE</b>		<b>APROBÓ</b>
<b>NOMBRE</b>	Mateo Federico González		Sandra Ramírez	Janneth Rubiano Molano
<b>CARGO</b>	Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional en Economía		Consortio Eucarístico Carrera 68/ Profesional Social	Consortio IDU 2020/ Profesional Social de Interventoría
<b>FIRMA</b>				
<b>ANEXOS:</b>	<b>SI</b>	x	<b>NO</b>	<b>TIPO DE ANEXO:</b> Presentación, reporte de asistencia, reporte de sondeo de opinión, registro fotográfico y cumplimiento de compromisos Comité IDU No 2. <b>CANTIDAD:</b> 6 anexos

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 1.0	
<b>FECHA:</b> 26/05/2021			
<b>LOCALIDAD:</b> Suba		<b>BARRIO:</b> Pasadena	<b>DIRECCIÓN:</b> Calle 101B #45A-13
<b>TEMA:</b> Comité IDU No 3 - Grupo 9.			
			
			

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 1.0	
<b>FECHA:</b> 26/05/2021			
<b>LOCALIDAD:</b> Suba		<b>BARRIO:</b> Pasadena	<b>DIRECCIÓN:</b> Calle 101B #45A-13
<b>TEMA:</b> Comite IDU No 3- Grupo 9.			
			
			
			
			

26-05-2021

## AVENIDA 68

ALIMENTADOR DE LA LÍNEA METRO

"CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 48 HASTA LA CARRERA 9 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. GRUPO 9"

### COMITÉ IDU No. 3

24 de abril al 20 de mayo del 2021



MINISTERIO DE  
DESARROLLO URBANO



## ASPECTOS A TENER EN CUENTA DURANTE LA REUNIÓN



### Guía para la reunión

- 1 Al ingresar a la reunión silencie su micrófono y apague su cámara, mantenerlas apagadas durante la presentación del proyecto.
- 2 Para el registro de su asistencia por favor diligenciar los links que se estarán enviando por el chat.
- 3 Las preguntas que surjan colóquelas en el chat de la reunión para ser aclaradas al finalizar la presentación, y/o en la sección de inquietudes para la comunidad puede pedir la palabra alzando la mano ubicada en la parte inferior de la plataforma.
- 4 En primer lugar, se contestarán las inquietudes registradas en el chat y posteriormente, se habilitará el micrófono ordenadamente a las personas que pidan la palabra para que formulen su pregunta.



## ORDEN DE LA REUNIÓN



- 1 Avance general del proyecto
- 2 Plan de Manejo de Tránsito.
- 3 Plan de Manejo Ambiental – Forestal, Avifauna, Arqueología, SST
- 4 Componente Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.
- 5 Inquietudes de la comunidad.



## COMPONENTE TÉCNICO



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - TÉCNICO

Se realizaron actividades de Topografía como:

- Chequeo de equipos de topografía en la Calle 100 con Carrera 15.
- Levantamiento de redes hidráulicas, Calle 100 con Carrera 9 y Carrera 7.
- Replanteo de nivelación en la Calle 100 con Carrera 22



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - TÉCNICO



- Control asentamiento edificio Albert - Calle 100 con Carrera 48.

- Referenciación de pozos de aguas lluvias y sanitarias proyectados.



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - TÉCNICO



- Demarcación Cicloruta proyectada.



- Demarcación de Redes Secas (Energía, Gas y Telemáticos)



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - TÉCNICO



#### Puente Peatonal # 12

- Se inicia la adecuación de la plataforma para la cimentación del nuevo puente peatonal, donde se instalará el campamento para esta actividad y la ubicación de la piloteadora.



## COMPONENTE DE TRÁNSITO - PMT



### PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO - PRELIMINARES

#### COI 17 – 29/04/21

- PMT para actividades silviculturales, en las zonas verdes de las conectantes de la intersección de la Av. Calle 100 con Carrera 45.



#### COI 17 – 29/04/21

##### Plan de Manejo de Tránsito:

- Actividades de topografía, apiques, mantenimiento preventivo de espacio público y separadores en el corredor de la AV. Calle 100 entre Carrera 48 y Carrera 9





**CIERRE DE LA CALZADA LENTA DEL COSTADO SUR DE LA AV. CL 100 ENTRE CARRERA 19 Y TRANSVERSAL 21**



**GESTIONES REALIZADAS**

- En este periodo se radicó a la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM el PMT de cierre de calzada y espacio público. PMT 007.
- Se espera aprobación en el próximo periodo.
- Transmilenio - TMSA, da viabilidad al traslado de paraderos del SITP.



**CIERRE DE LA CALZADA LENTA DEL COSTADO SUR DE LA AV. CL 100 ENTRE CARRERA 9 Y CARRERA 11 Y CIERRE PEATONAL ENTRE CARRERA 7 Y CARRERA 9**



**GESTIONES REALIZADAS**

- En este periodo se atendieron observaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM al PMT de cierre de calzada y espacio público. PMT 008.
- Se espera aprobación en el próximo periodo.
- Se presentó a Transmilenio - TMSA, la propuesta del traslado de paraderos del SITP.



**PMT PARA CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACION PUENTE PEATONAL AUTONORTE CON CALLE 100**



**GESTIONES REALIZADAS**

- Se presentó el PMT a la Interventoría para revisión y aprobación. PMT 006.
- Se espera aprobación en el próximo periodo para posterior aprobación a la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM



## COMPONENTE AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA, ARQUEOLOGÍA Y SST



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - AMBIENTAL

#### COMPONENTE A

Se cuenta con los siguientes trámites y autorizaciones:

- Permisos de trabajo en horario nocturno emitido por Alcaldías Locales
- Resolución Silvicultural No. 3108 de 2019
- Capacitaciones control de derrames, manejo de RS, control de emisiones atmosféricas

#### COMPONENTE B

- Adecuación área para ejecución actividades de pilotaje.
- Protección de sumideros en las áreas de intervención.
- Puntos ecológicos para el manejo de Residuos Sólidos.
- Unidades sanitarias portátiles.
- Manejo adecuado de maquinaria y vehículos



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - FORESTAL COMPONENTE C: "MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE."

#### • RECORRIDO CON COMUNIDAD Y ENTIDADES DISTRITALES.

Se realiza recorrido con la comunidad, personería, entidades ambientales, para socializar los tratamientos silviculturales autorizados por la resolución 3108 de 2019, y los posibles cambios.



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - FORESTAL COMPONENTE C: "MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE."

#### TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS - BLOQUEO Y TRASLADO DE ARBOLES



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - FORESTAL COMPONENTE C: "MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE."

- MANTENIMIENTO ÁRBOLES TRASLADADOS
- TRABAJO EN CAMPO CON EL FIN DE EVALUAR LOS ÁRBOLES EN EL TRAMO Y VERIFICAR POSIBLES CAMBIOS DE TRATAMIENTO SILVICULTURAL.



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - FAUNA

#### COMPONENTE C: "Manejo de la Vegetación y el Paisaje."

- Se continua con inspección de árboles, con la finalidad de determinar la presencia de nidos tanto activos como inactivos.
- Los árboles identificados con nidadas activas, son señalizados con el fin de no ser intervenidos en los diferentes tratamientos silviculturales.
- Los árboles con nidada activa se les está realizando seguimiento, con la finalidad de verificar el tiempo de desarrollo que estos necesitan para abandonar el nido.



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS - ARQUEOLOGÍA

Aprobación del Plan de Manejo Arqueológico por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) mediante la resolución 225 de 2021.

#### EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

- Monitoreo arqueológico
- Arqueología pública



### ACTIVIDADES DESARROLLADAS – SST & MEV



- Inducción, capacitación y entrenamiento a trabajadores.
- Entrega y reposición de dotación y Equipo de Protección Personal - EPP
- Implementación de procedimientos de trabajo seguro.
- Inspección del Equipo de Protección Personal-EPP, áreas, herramientas y condiciones de trabajo.
- Investigación de accidentes de trabajo.
- Señalización de zonas de obra y campamentos.
- Implementación de protocolo de bioseguridad.
- Inspecciones pre-operacionales diarias junto con el mantenimiento preventivo de Maquinaria Equipo y Vehículo - MEV.



# PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN



## PROGRAMAS DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN

**SERVICIO A LA CIUDADANÍA**

**1. Sistema de Atención a la Ciudadanía.**

- PQRSD 40 CERRADAS EN SU TOTALIDAD.

**2. Recorridos Urbanos**

- 43 RECORRIDOS REALIZADOS A LA FECHA



Más información sobre el Contrato IDU 353 de 2020

**Dirección:** Calle 101B # 45A - 13. BARRIO PASADENA

**Horario:** L a V de 8:00 a.m. a 12:00 m y 1:30 a 5:00 p.m. y Sábados de 8:00 a 11:00 a.m.

**Teléfono:** (1) 8088769 – 3222344233

**Correo:** puntoidu353@mhc.com.co



## ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Tipo de reunión	Cantidad a la fecha	Características
Extraordinarias	50	Espacio participativo, para informar las características y actividades del proyecto, dando respuesta a la comunidad.
Interinstitucionales	46	
Comité IDU	2	




## PROGRAMAS DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN

**PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA**

**Acciones en formación a empleados de obra.**

- Capacitación al personal en comunicación asertiva y atención al ciudadano.
- Formación en espacio público y formación de accidentes.




**PROGRAMAS DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN**

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	
<b>1. Divulgación del proyecto en el área de influencia directa y aferente.</b>	
Volante	Cantidad
Volante No 17. Comité IDU No 2.	68
Boletín IDU 1: Avances en tratamientos silviculturales.	Comité IDU Asistentes a recorridos ambientales
Boletín informativo AV. 68 No 1.	Actores sociales AID. Comunidad en AID. Comité IDU.



**PROGRAMAS DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN**

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	
Boletín IDU 2: Avances en tratamientos silviculturales.	Correo a Comité IDU Asistentes a recorridos ambientales.
Predio a Predio	<b>280</b>



**PUNTOS SATÉLITES INFORMATIVOS**

Informar a la ciudadanía acerca de las actividades extraordinarias que se desarrollan en el proyecto, en el marco del programa de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

No	Establecimiento	Dirección	Localidad
1	Olimpica	Calle 100 Con 47 A - 81	Barrios Unidos
2	Motoservicios	Calle 100 No 47 A - 47	Barrios Unidos
3	Edificio World Trade Center	Calle 100 # 8A - 49	Chapinero
4	NOTARIA 15	Calle 99 #118-19	Chapinero
5	Colchones Serta	Carrera 11 # 99- 60	Chapinero
6	Universidad Militar Nueva Granada	Carrera 11 No. 101-80	Chapinero
7	Edificio Prime Tower	Calle 100 No. 19 - 54	Usaquén
8	Edificio ABG	Calle 100 No 14 - 63	Usaquén
9	Tienda Del Color Sapolin	Carrera 45 100 - 12 Local 10	Usaquén
10	IAC Santa Margarita	Calle 104 A No. 47 - 69	Suba



PUNTOS SATÉLITES DE APOYO		
No	Establecimiento	Dirección
1	Alcaldía Local de Chapinero	Cra. 13 #54 - 74
2	Alcaldía Local de Usaquén	Cra. 6a No. 118 - 03
3	Alcaldía Local de Suba	Cra. 91 No. 145A-32



**ACTIVIDADES DESARROLLADAS - GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD**

**Mano de Obra no Calificada de la Localidad (40%)**

- Continuidad en procesos de entrevistas con habitantes de las localidades de Suba, Barrios Unidos, Usaquén y Chapinero.



**Mano de Obra no Calificada y Población Vulnerable. (5%).**

- Proceso para vinculación laboral de personal en condición de vulnerabilidad, avalado por la Secretaría de Desarrollo Económico.

**Personas Víctimas del Conflicto Armado de la Localidad (2%).**

- Entrevistas laborales con personal que ha sido víctima del conflicto armado, avalados por el Registro Nacional de Víctimas y la Alta Consejería Distrital para las Víctimas.



✓ Agradecemos registre su asistencia en el link relacionado en el chat.




✓ Igualmente, si desea inscribirse al COMITÉ – IDU, marque la casilla de inscripción.



INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO



### INQUIETUDES POR PARTE DE LOS ASISTENTES.



**¡GRACIAS!**

Síguenos en



[www.idu.gov.co](http://www.idu.gov.co)



INSTITUTO DE  
DESARROLLO URBANO

