



STEST

202634601128311

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Agosto 18 de 2026

Señor(a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA
NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REFERENCIA: Contrato IDU-353-2020 con Objeto "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C." Grupo 9.

ASUNTO: Envío Respuesta Al Radicado Número 202618501256342. Atención a solicitud de información sobre el avance de las obras en la Calle 100 con Carrera 19 y Troncal Avenida Carrera 68

Respetado(a) señor(a),

En atención a la petición realizada de manera anónima allegada al instituto de Desarrollo Urbano (IDU), mediante radicado **202618501256342** del 3 de agosto de 2026, la entidad en cumplimiento a las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 *"Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"* y obrando dentro del término legal concedido, a continuación, procede a dar respuesta a la solicitud que se eleva, en los siguientes términos:

Petición:

"(...) Y la calle 100 con 19 para cuándo y la 68 se van a pensionar y nada un poco de huecos y nadie está trabajando. (...)"

Respuesta:

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST


202634601128311

Información Pública
Al responder cite este número

En atención a su comunicación, el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU se permite informar que las obras de la Troncal Avenida Carrera 68 se ejecutan mediante nueve (9) grupos de construcción, distribuidos a lo largo del corredor comprendido entre la Autopista Sur y la carrera 9, cuya distribución y localización se presenta en la siguiente imagen:

TRAMOS

- T1 Autosur a Calle 18 Sur
- T2 Calle 18 Sur a Av. Américas
- T3 Av. Américas a Calle 13
- T4 Calle 13 Av. Esperanza
- T5 Av. Esperanza a Calle 46
- T6 Calle 46 a Calle 66
- T7 Calle 66 a Carrera 65 S
- T8 Carrera 65 a Carrera 48
- T9 Carrera 48 a Carrera 9

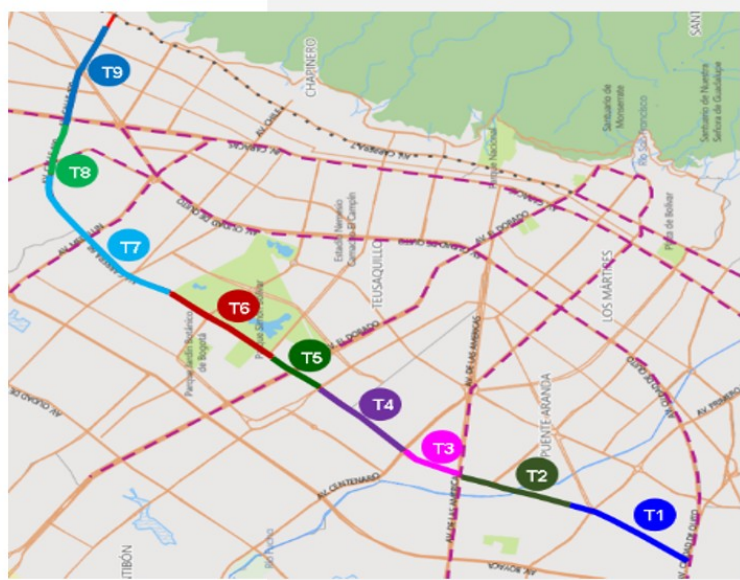

Fuente: Subdirección Técnica de ejecución del subsistema de Transporte STEST.

Ahora bien, frente a la primera parte de la inquietud planteada: **“Y la Calle 100 con 19 para cuándo”**, se precisa que este sector hace parte del **Grupo 9** de la Troncal Avenida Carrera 68, cuya ejecución se desarrolla en el marco del Contrato de Obra IDU-353-2020, y comprende el tramo ubicado entre la Carrera 48 y la Carrera 9. En este corredor se continúan ejecutando actividades de obra de acuerdo con la programación vigente y la secuencia técnica prevista para los diferentes frentes de intervención.

En relación con el punto específico señalado, **Calle 100 con Carrera 19**, se informa que, en este sector se ejecutan obras de renovación de redes de acueducto, alcantarillado y redes eléctricas, las cuales requieren diferentes etapas de excavación, instalación, empalmes, pruebas y puesta en servicio.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202634601128311
Información Pública
Al responder cite este número

En cuanto a los cierres viales, estos se implementan de manera gradual y organizada, conforme a los Planes de Manejo de Tránsito aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad, permitiendo alternar los frentes de trabajo y mantener, en lo posible, la movilidad del sector y reducir las afectaciones a los usuarios de la vía.

De acuerdo con la programación vigente, se prevé finalizar las actividades correspondientes a este sector durante el último trimestre de 2026, sujeto a las condiciones técnicas que se encuentren durante la ejecución, la coordinación con las empresas de servicios públicos y las aprobaciones que sean requeridas. Durante el desarrollo de las obras, el contratista continuará implementando las medidas de señalización, cerramiento y manejo de tránsito necesarias para garantizar condiciones adecuadas de seguridad y movilidad.

Ahora bien en cuanto a su inquietud respecto a los trabajos de la troncal Av 68, se precisa que el Instituto de Desarrollo Urbano, surtido el proceso de Licitación Pública IDU-LP-SGI-031-2019, suscribió los contratos de obra correspondientes a los nueve (9) grupos que conforman el proyecto Troncal Avenida 68; asimismo, mediante el Concurso de Méritos Abierto IDU-CMA-SGI-040-2019, suscribió los contratos de interventoría en aplicación de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.

De acuerdo con su solicitud, a continuación, se presenta la fecha estimada de entrega de las obras para cada uno de los nueve (9) grupos que componen el Proyecto Troncal de la Avenida 68:

No. Contrato	Objeto	Fecha estimada de entrega de las obras (No incluye Fase de Mantenimiento)
IDU-345-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 1	Segundo Semestre 2027
IDU-346-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 2	Segundo Semestre 2026
IDU-347-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 3	Segundo Semestre 2026
IDU-348-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 4	Segundo Semestre 2026
IDU-349-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. - GRUPO 5	Segundo Semestre 2026

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

3



STEST
202634601128311
Información Pública
Al responder cite este número

No. Contrato	Objeto	Fecha estimada de entrega de las obras (No incluye Fase de Mantenimiento)
IDU-350-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 6	Segundo Semestre 2026
IDU-351-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 7	Segundo Semestre 2027
IDU-352-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 8	Segundo Semestre 2027
IDU-353-2020	CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN A SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.- GRUPO 9	Segundo Semestre 2026

Fuente: Sistema de gestión de proyectos Zipa, corte 10 de agosto de 2026

Es importante señalar que, por las características y magnitud del proyecto, las obras se desarrollan de manera simultánea y progresiva en los diferentes grupos y frentes de intervención, por lo que la intensidad de las actividades puede variar entre sectores y durante las distintas etapas de ejecución. El Instituto realiza seguimiento permanente al desarrollo del proyecto, con el propósito de impulsar la culminación de las obras y el cumplimiento de las fechas estimadas para cada grupo.

En cuanto a las situaciones que han generado retrasos, estas se relacionan principalmente con factores asociados a la intervención de las redes de servicios públicos, que requieren traslados, protecciones, permisos y aprobaciones por parte de las empresas responsables, previo a la ejecución de las obras correspondientes.

Respecto a los “huecos” mencionados, se aclara que las excavaciones y zonas intervenidas corresponden a actividades propias de la obra, principalmente relacionadas con la instalación y renovación de redes y la preparación de las áreas para la construcción de la infraestructura vial y el espacio público. De igual manera, se precisa que actualmente se desarrollan actividades en el sector, las cuales avanzan de manera progresiva conforme a la programación y secuencia técnica prevista.

En este contexto, es preciso considerar que este tipo de proyectos involucra diversas actividades constructivas que deben ejecutarse de manera secuencial, entre ellas la intervención de redes de servicios públicos, la construcción de infraestructura vial, espacio público y demás obras complementarias. Por esta

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634601128311

Información Pública

Al responder cite este número

razón, en determinados sectores puede evidenciarse una menor presencia de actividades mientras se adelantan procesos técnicos, trámites o labores de coordinación indispensables para garantizar la continuidad de los trabajos.

Finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano precisa que continuará realizando el seguimiento a la ejecución del proyecto y adelantando las acciones necesarias para contribuir a la culminación de las obras, en beneficio de la movilidad y de las condiciones de infraestructura de la ciudad, procurando que las intervenciones se desarrollen de manera adecuada y conforme a las programaciones establecidas.

En los anteriores términos se da respuesta completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 18-08-2026 03:39:04 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Revisó: YAMILE PATRICIA CASTIBLANCO VANEGAS - Subdirección Técnica de Ejecución del subsistema de Transporte
Revisó: YENNY CARLINA LÓPEZ RENTERÍA-Subdirección Técnica de ejecución del subsistema de Transporte
Elaboró: RUTH PAOLA ALMECIGA ESCOBAR-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

5
