



BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA

Instituto de Desarrollo Urbano

Rendición de cuentas localidad Usaqué

Rendición de cuentas nodo Movilidad

24 / 06 / 2026



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO



CONTENIDO



1 Presentación IDU

- Misión y Visión del IDU – Proyectos IDU 2025
- Informe PQRSD Vigencia anterior 2025.
- Inventario de la malla vial en la localidad de Usaquén
- Información general de los proyectos IDU en la localidad

2 Presentación UMV


- Información general de proyectos UMV en la localidad
- Etapa de conservación
- Etapa de Tapahuecos
- Diagnóstico vial

3 Diálogo con la comunidad

Localización de proyectos IDU – Usme

Misión

Somos un establecimiento público descentralizado que ejecuta una infraestructura con propósito, que fomenta el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital y el área metropolitana a través de planeación y conservación de los proyectos para la movilidad y espacio público.

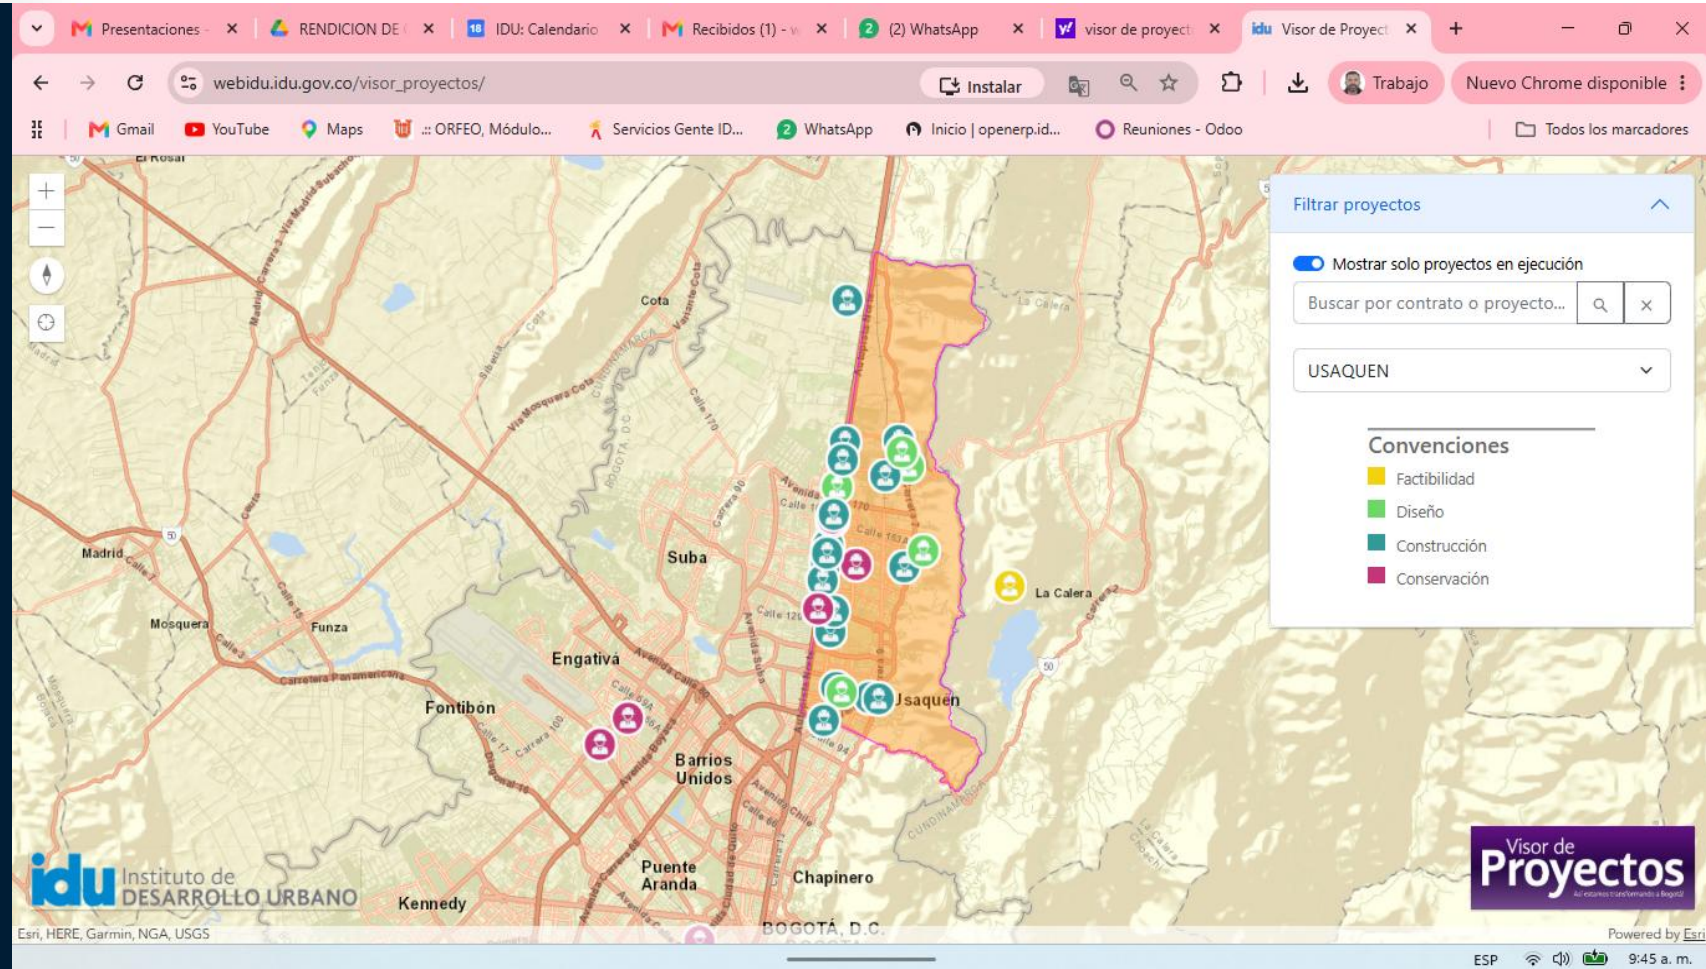

PQRSD – Rendición de Cuentas 2025

No.	Fecha	No. Radicado	No. Respuesta
1	15 agosto 2025	202518501180342	202522500938421

Política Antisoborno



Política Antisoborno

 denuncia.soborno@idu.gov.co

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.



Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la política antisoborno. A través de este abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Diagnóstico

Diagnóstico



SAVIA - SISTEMA AVANZADO DE VIALIDAD INTEGRADA



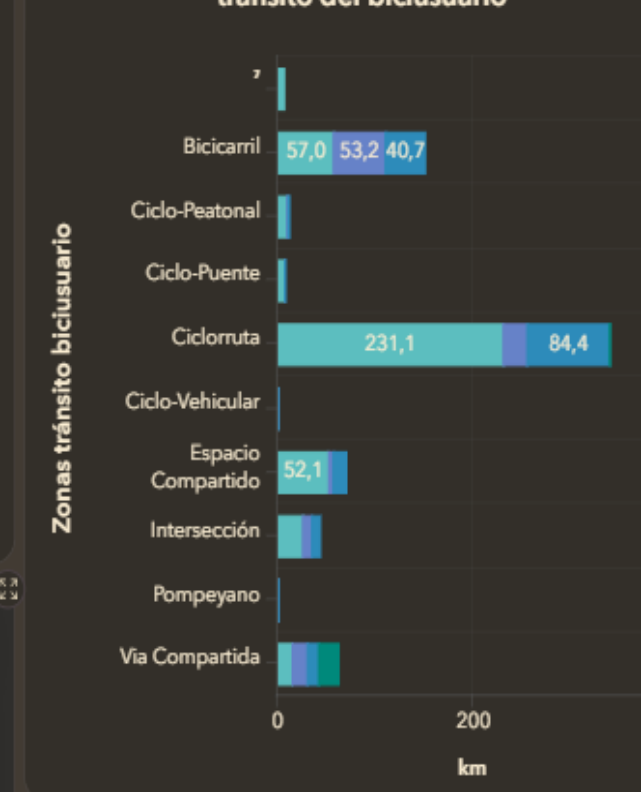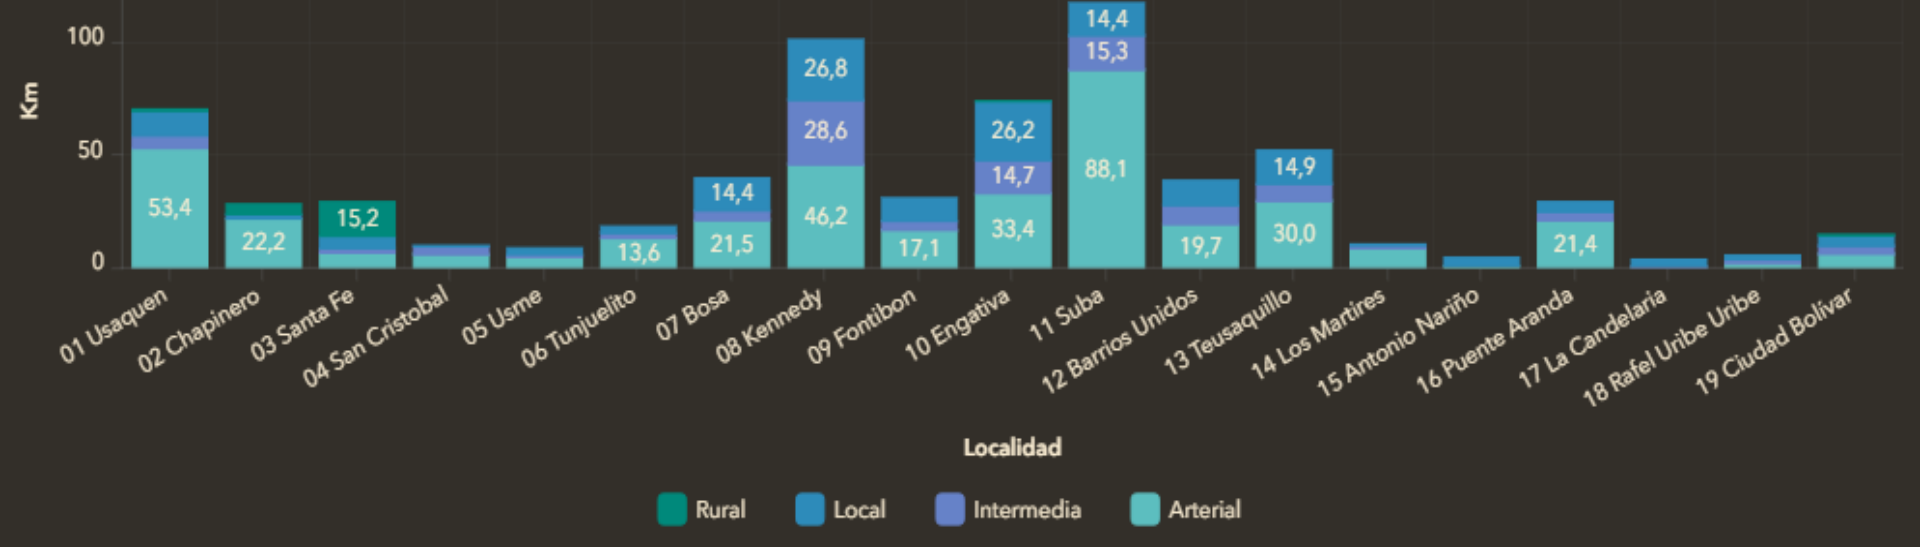

Extensión red de cicloinfraestructura

695,3 km

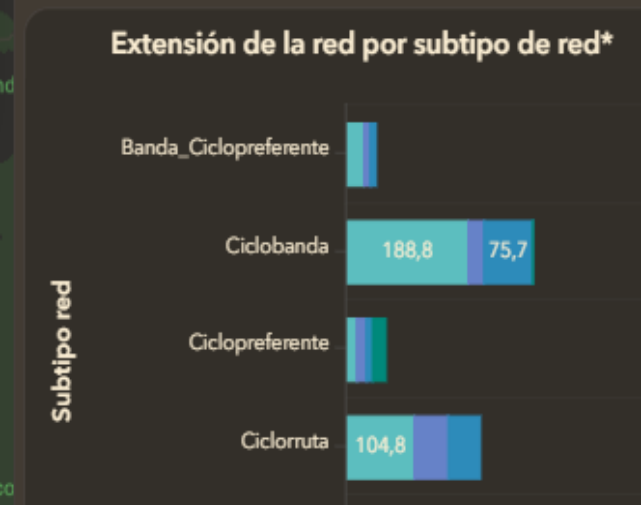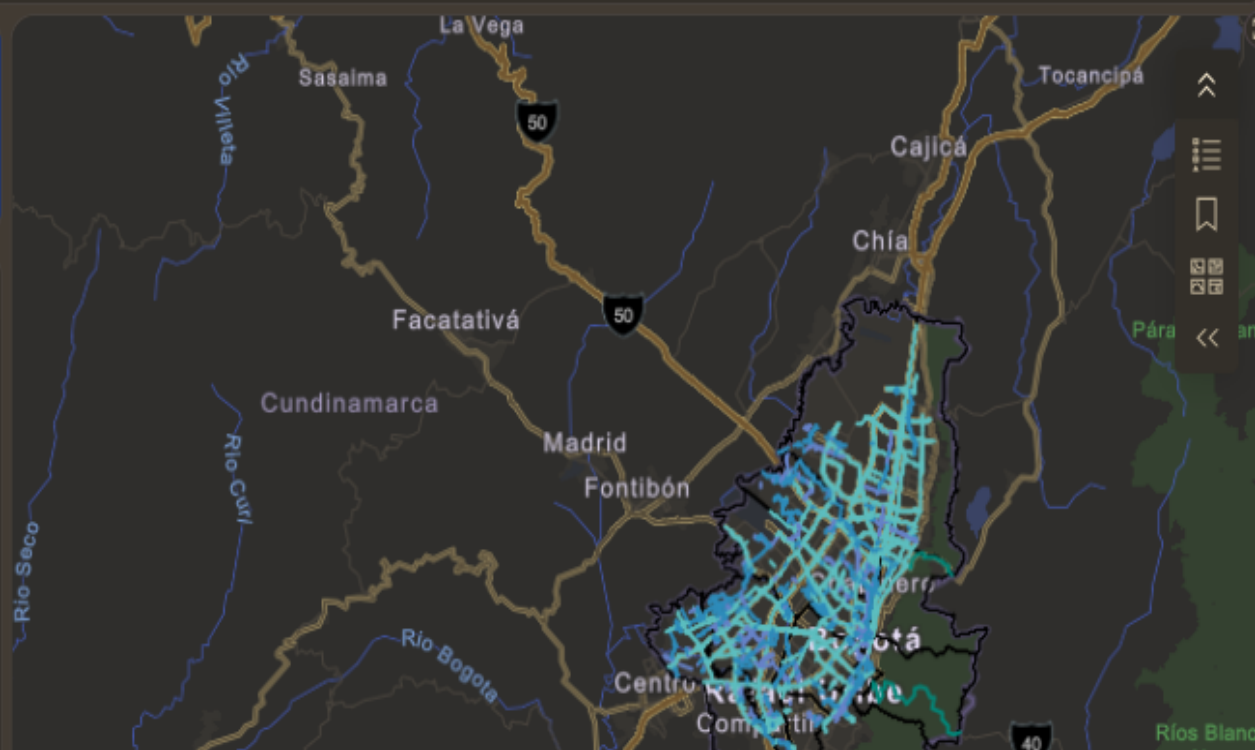

Contratos





Contrato: IDU-1551-2017



construccion de la ciclorruta y el espacio publico asociado a la via.

Metas físicas	
Tipo	Cantidad
Diseño	1.0 Unidades
Construir Km-Carril de Malla Vial Arterial	14.14 Km_Carril
Espacio Público	23135.0 m2
Construir Km de Ciclorruta	2.3 Km
Instalar cicloparqueaderos temporales	5.0 Unidades
Construir m2 de zona verde	8516.63 m2

Información contractual			
Número de contrato:	IDU-1551-2017	Número de contrato:	IDU-1572-2017
Tipo:	Contrato de Obra	Tipo:	Consultoría (Interventoría)
Contratista:	UNION TEMPORAL MURCON	Contratista:	CONSORCIO CONSULTORES URBANOS
Valor total:	\$ 151.327.103.504,00	Valor total:	\$ 13.516.268.405,00
Fecha de inicio:	21/02/2018	Fecha de inicio:	21/02/2018
Fecha de finalización:	30/05/2026	Fecha de finalización:	30/05/2026
Fecha de ejecución:	75	Fecha de ejecución:	70

Cerrar

Contrato: IDU-1765-2023



Información contractual

Número de contrato: IDU-1765-2023
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO ESTACIONES 2024
Valor total: \$ 46.298.368.245,00
Fecha de inicio: 06/02/2024
Fecha de finalización: 15/06/2026
Empleos generados: 49

Número de contrato: IDU-1781-2023
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO RED CONECTA
Valor total: \$ 6.654.168.822,00
Fecha de inicio: 06/02/2024
Fecha de finalización: 15/06/2026
Empleos generados: 43

En qué se trabaja

Información Financiera

Contrato	Total Pagado
IDU-1765-2023	COP 39.704.573.570,00
IDU-1781-2023	COP 5.098.754.830,00





Contrato: IDU-1814-2021

Nombre del proyecto

Nuevo puente peatonal sobre la Autopista Norte con calle 174 acceso al Portal Norte - Estudios y diseños y Construcción

Fecha de actualización: 15/06/2026

Avance programado: 32,13%

Avance ejecutado: 11,49%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

Elaborar los estudios y diseños de detalle y construir el nuevo Puente peatonal sobre la Autopista Norte con acceso al Portal Norte de Transmilenio incluida su conexión con el espacio público existente

Contrato: IDU-1814-2021

Número de contrato: IDU-1814-2021
Tipo: Contrato de Obra
Contratista: CONSORCIO SAN VICTORINO
Valor total: \$ 26.298.165.834,00
Fecha de inicio: 28/01/2022
Fecha de finalización: 30/10/2026
Empleos generados: 46

Número de contrato: IDU-1821-2021
Tipo: Consultoría (Interventoría)
Contratista: CONSORCIO INTERPUENTE PORTAL NORTE
Valor total: \$ 3.576.711.001,00
Fecha de inicio: 28/01/2022
Fecha de finalización: 30/10/2026
Empleos generados: 29

En qué se trabaja

Durante el periodo comprendido entre el 09 y el 15 de junio de 2026, se ejecutaron actividades de pilotaje de los pilotes P-68, P-69, P-67 y P-70A, así como demoliciones, excavaciones, disposición de RCD, armado de acero de refuerzo y mantenimiento preventivo de la piloteadora. Adicionalmente, se realizaron actividades de seguimiento técnico, ambiental, SSTMA y social por parte de la interventoría, junto con la participación en comités y mesas de trabajo para el seguimiento del proyecto.

Contrato: IDU-1773-2023

Nombre del proyecto

Sitios inestables Grupo A - Diagnóstico, Diseños y Construcción

Fecha de actualización: 01/06/2026

Avance programado: 11,37%

Avance ejecutado: 10,32%

Estado del contrato: EN EJECUCION

Alcance del proyecto

REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y/O LA ACTUALIZACIÓN Y/O LA COMPLEMENTACIÓN Y/O LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EJECUTAR A MONTO AGOTABLE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C. GRUPO A

Metas físicas

Tipo	Cantidad
Mantener m2 de Punto Crítico	3440.92 m2

Información contractual

Número de contrato: IDU-1773-2023

Número de contrato: IDU-1768-2023





Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

