

Instituto de Desarrollo Urbano

Localidad Fontibón

Rendición de cuentas nodo Movilidad

29 / 07 / 26

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

CONTENIDO

1 Presentación IDU

- Plataforma estratégica Misión – Visión
 - Política antisoborno
 - Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025
 - Diagnóstico de la malla vial de la localidad
 - Información general de los proyectos IDU en la localidad
 - Etapa de construcción
 - Etapa de conservación
 - Preguntas e inquietudes
-



. Plataforma estratégica Misión – Visión



Nuestra Misión

Somos un establecimiento público descentralizado que ejecuta una Infraestructura con Propósito, que fomenta el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital y el área metropolitana, a través de la planeación, construcción y conservación de los proyectos para la movilidad y el espacio público.



Nuestra Visión

Al 2050 seremos reconocidos como una entidad confiable, efectiva y oportuna en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. Gracias a una gestión pública basada en la colaboración interinstitucional, la innovación en los sistemas de construcción y la participación ciudadana disfrutaremos de una ciudad con una infraestructura para la movilidad, más accesible, moderna y segura.

Política Antisoborno

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de la transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la Política Antisoborno. A través de este Abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Contáctanos:

denuncia.soborno@idu.gov.co



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA



. Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025




No.	Fecha	No. Radicado	No. Respuesta
1	12/06/2025	202518500837472	202538500635291 del 13/06/2025
2	12/06/2025	202518500837482	202538500635281 del 13/06/2025
3	12/06/2025	202518500837502	202538500638021 del 16/06/2025



Diagnóstico de la malla vial

Diagnóstico Localidad de Fontibón


INVENTARIO ESTADO MALLA VIAL

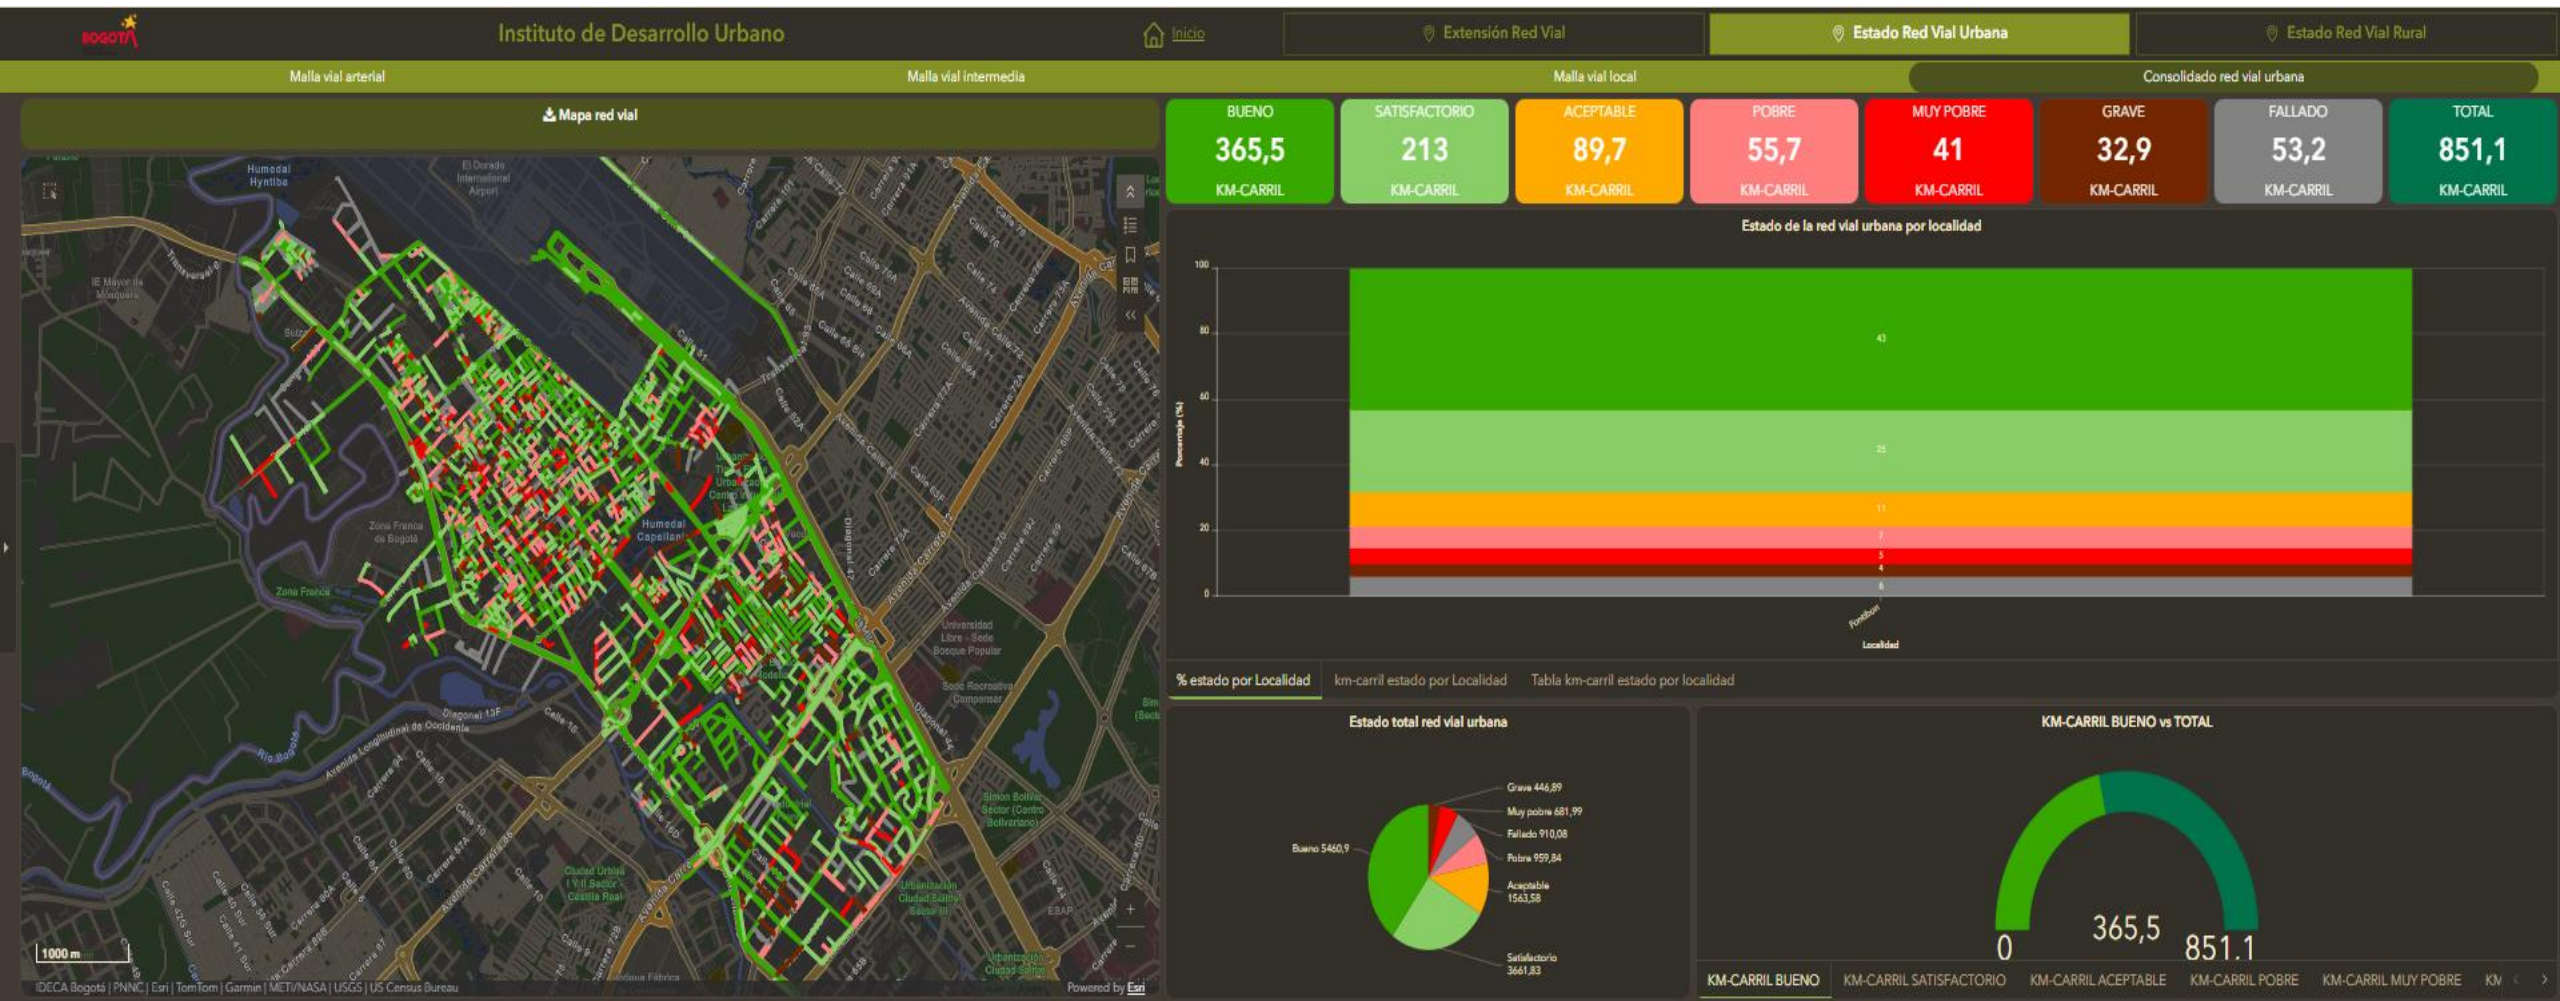

Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico Localidad de Fontibón


Extensión malla vial arterial

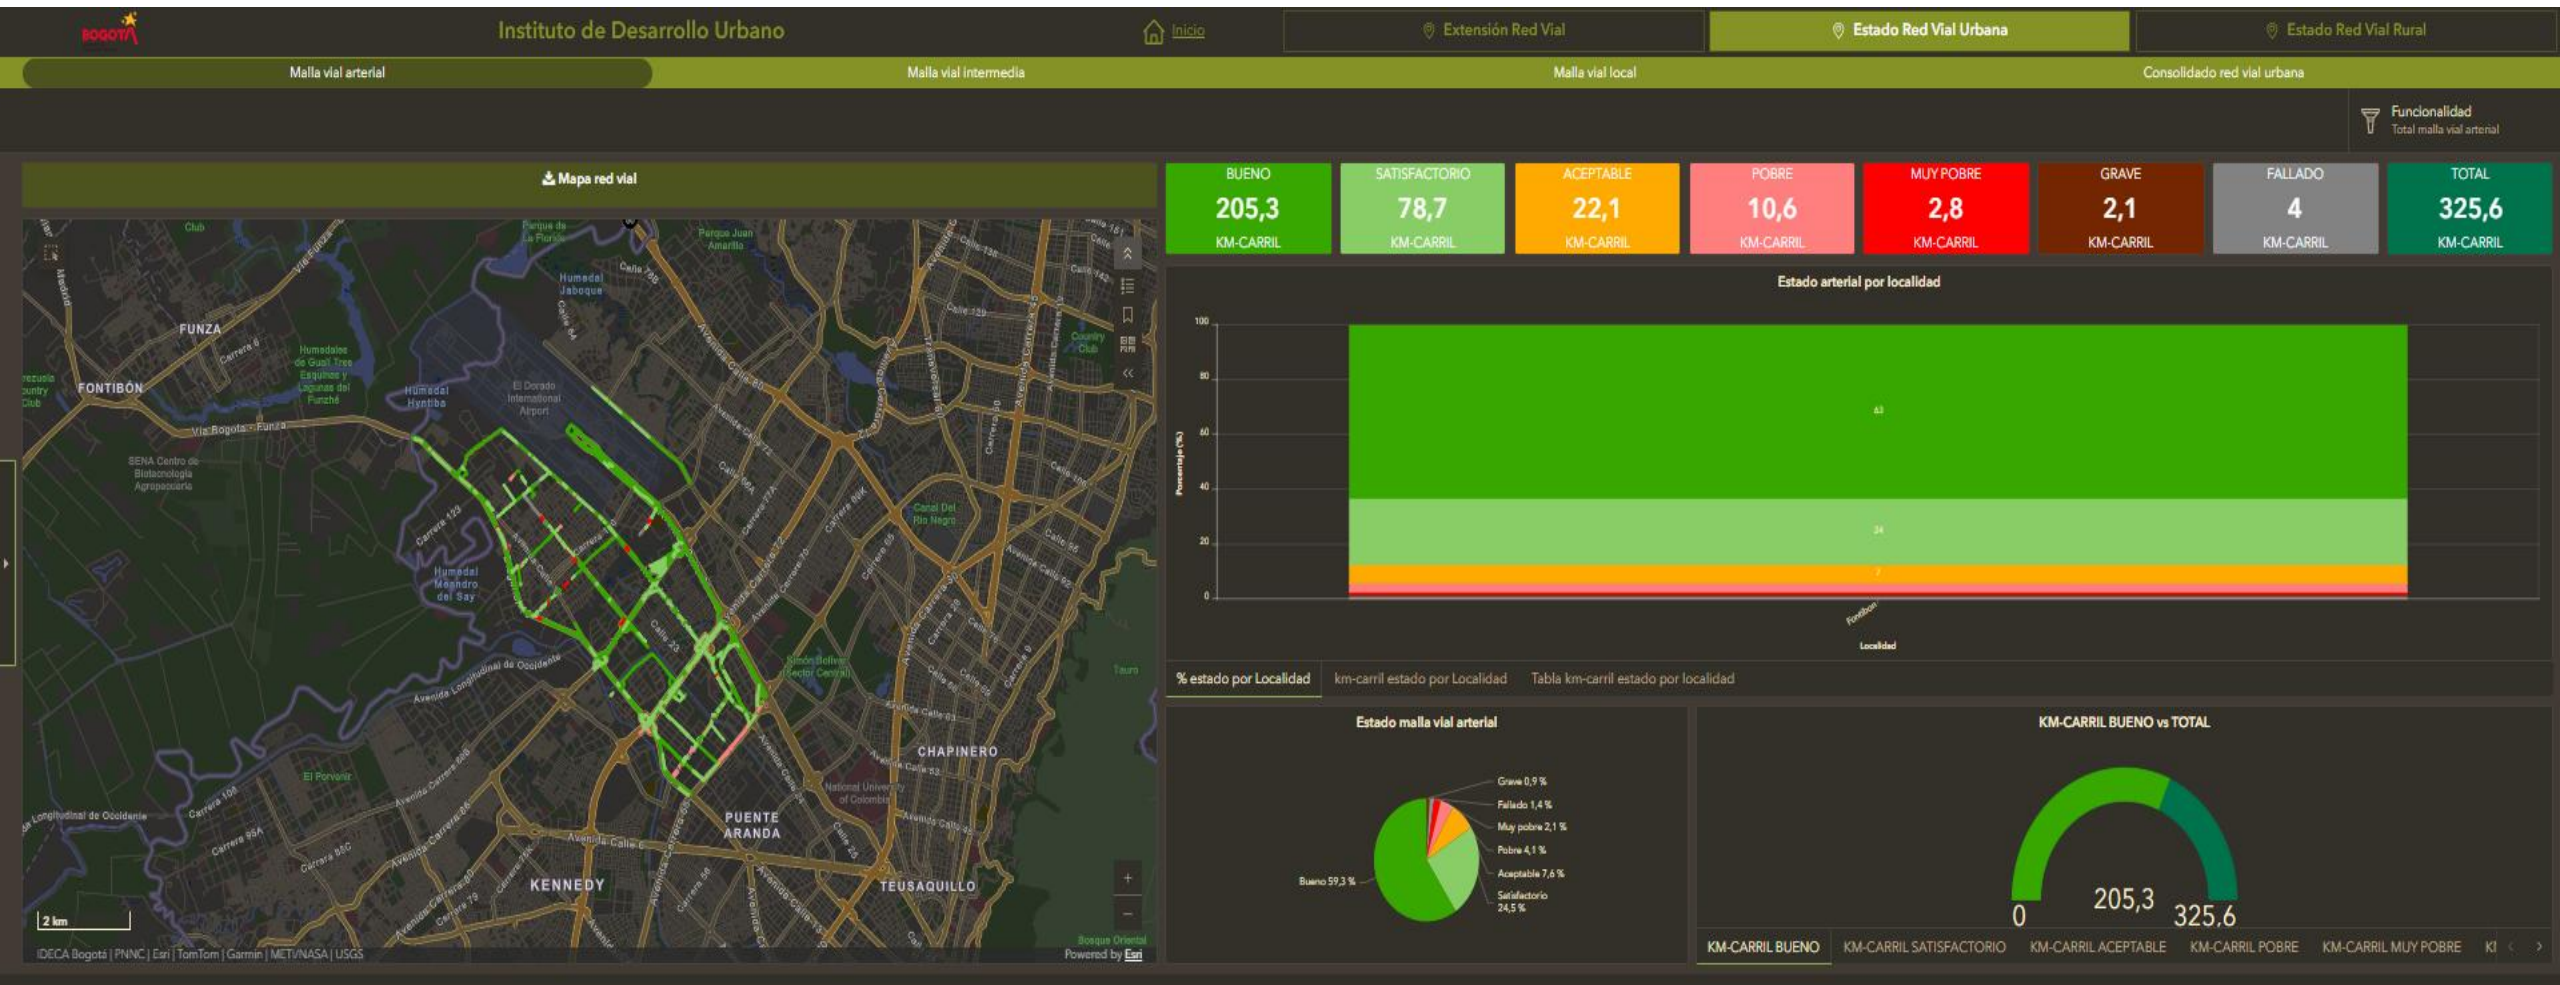

Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico Localidad de Fontibón


Extensión malla vial intermedia

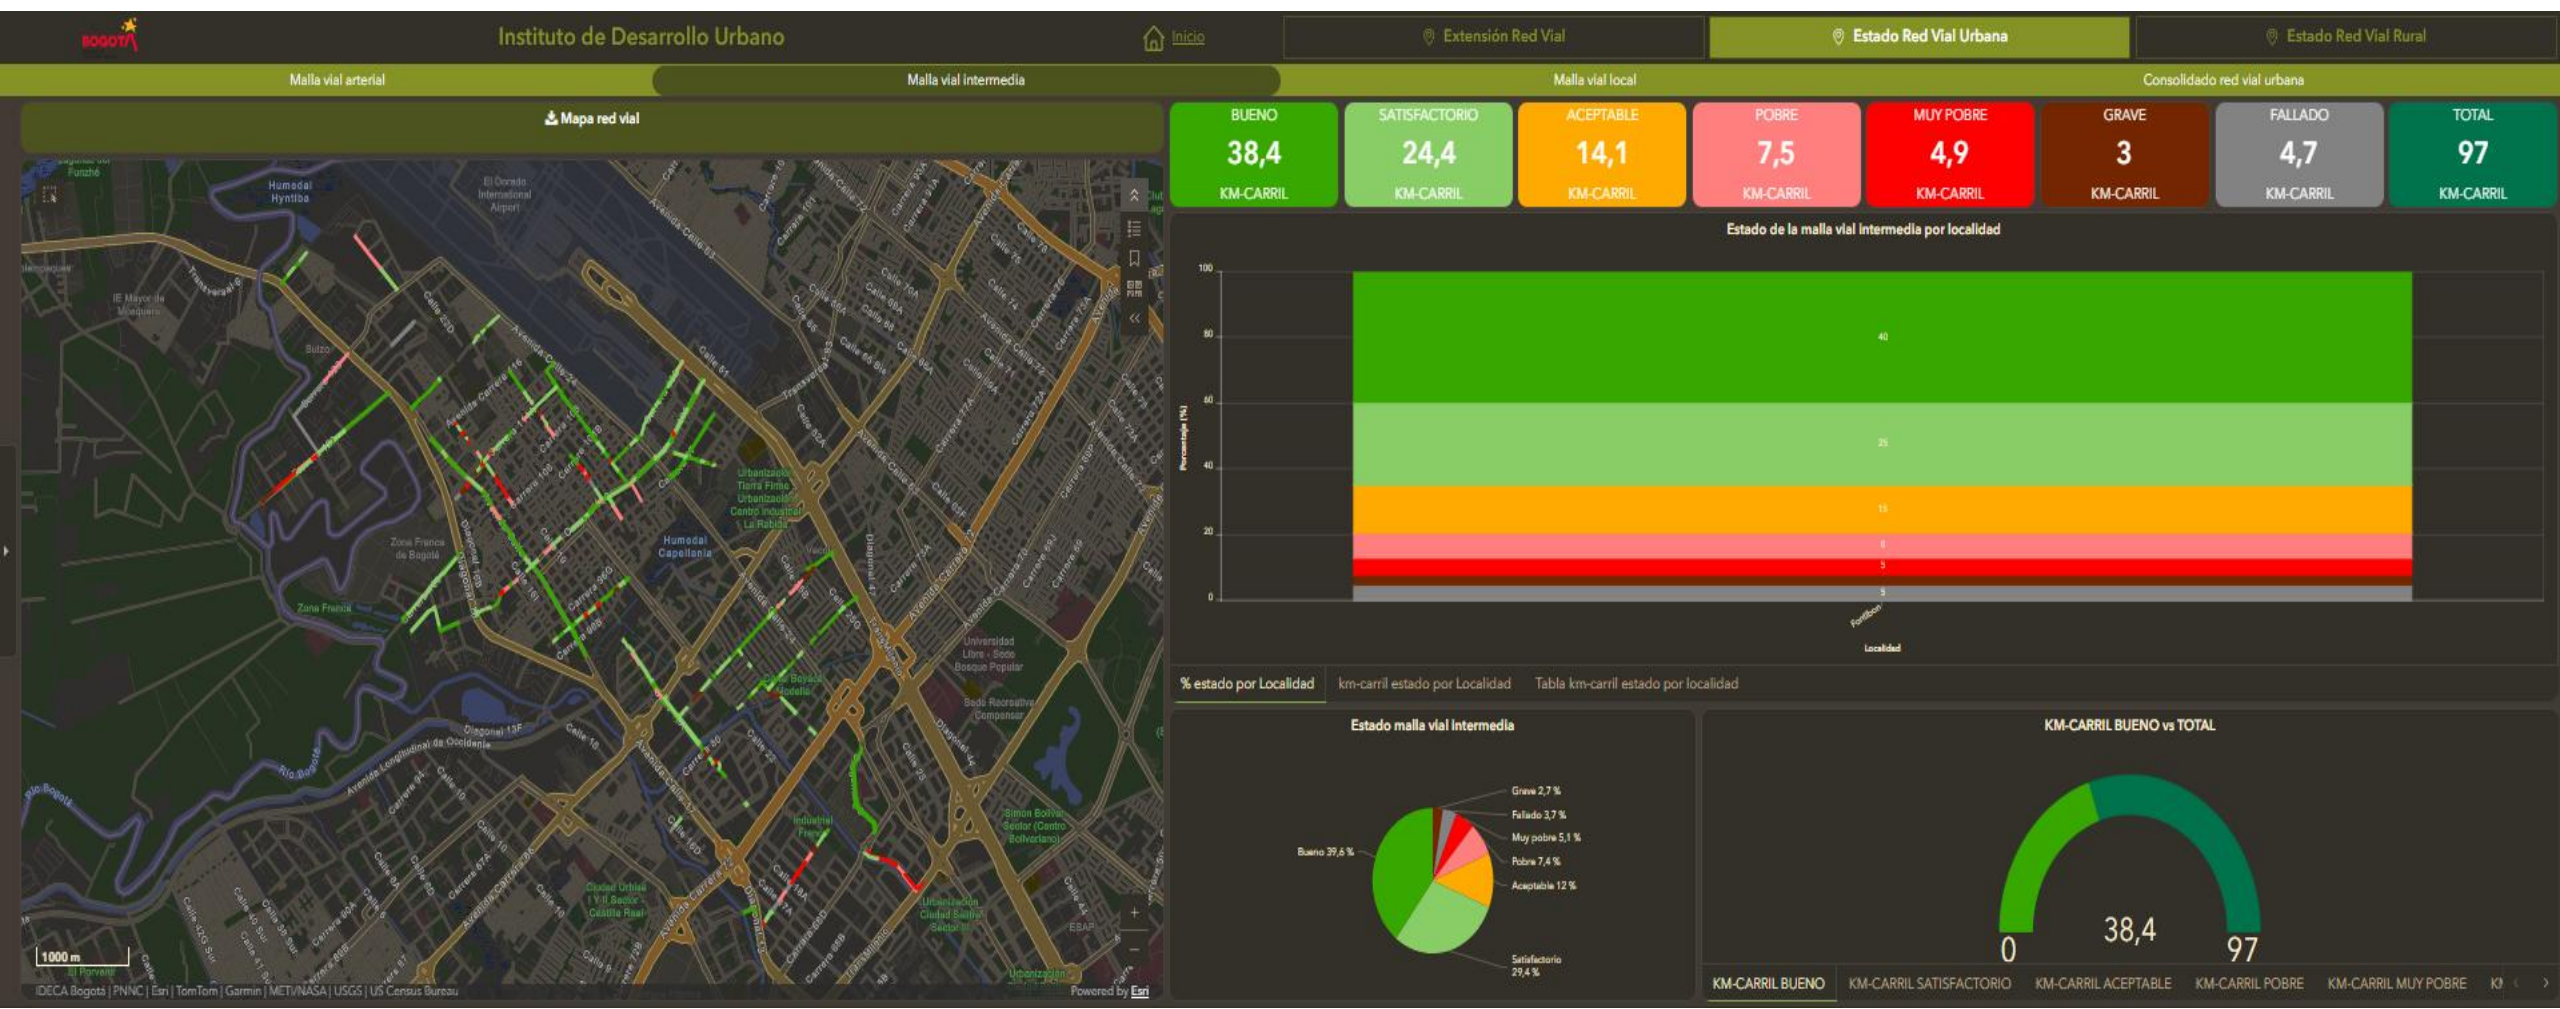

Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico Localidad de Fontibón

Extensión malla vial local

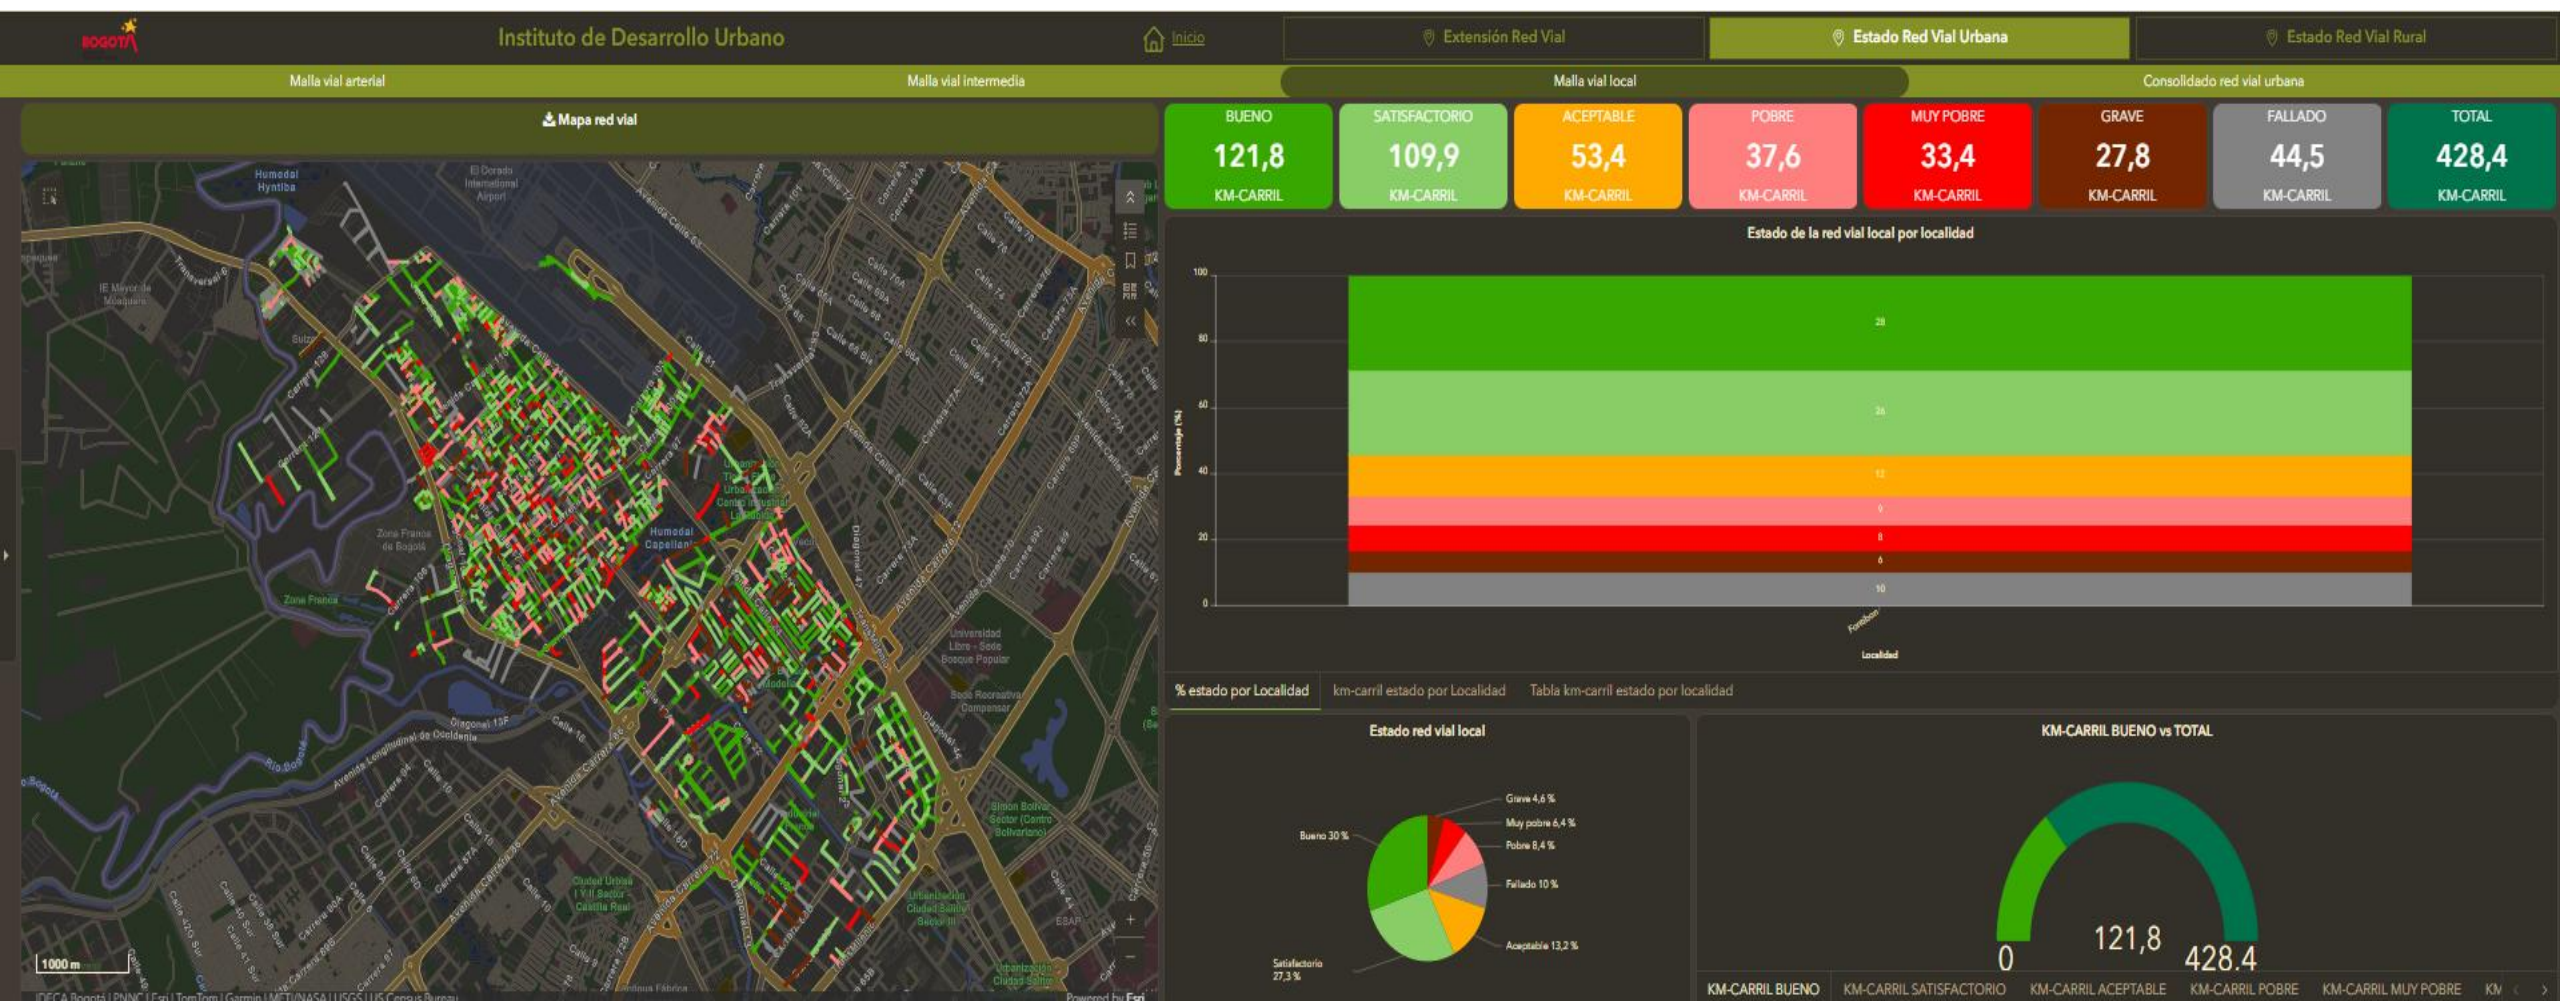

Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>



Proyectos IDU en la Localidad



INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO





Grupo 4 Av. 68

IDU-348-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA CENTENARIO (CALLE 13) HASTA LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.. (GRUPO 4): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO

Fecha de actualización: 20/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

Lady Rozo Lopez - Apoyo Principal Laura Milena Gutierrez Castillo - Apoyo Principal Manuel Andres Rodriguez Garcia - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-348-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AV. 68
Valor Sin Adiciones	\$ 247.825.771.607,00
Valor Adiciones	\$ 5.781.580.733,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 39.827.841.403,00
Total Contrato	\$ 293.235.193.743,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/01/2031

Número de contrato	IDU-602-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSORCIO INTERTRONCAL 68
Valor Sin Adiciones	\$ 29.165.584.816,00
Valor Adiciones	\$ 3.687.445.736,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 32.853.030.552,00
Fecha de Inicio	12/06/2020
Fecha de Finalización	11/01/2031



Grupo 5 Av. 68

IDU-349-2020

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.". (GRUPO 5): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA AVENIDA ESPERANZA (CALLE 24) HASTA LA CALLE 46 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO (CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C.". (GRUPO 5): "CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL SISTEMA TRANSMILENIO

Fecha de actualización: 20/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)

Equipo de Apoyo a la Supervisión

👤 Edwin Alonso Manzano Sanchez - Apoyo Principal 👤 Kharen Jhuliethe Castillo Camargo - Apoyo Principal 👤 Maria Camila Serrano Caro - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-803-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	AYESA INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A
Valor Sin Adiciones	\$ 22.288.313.304,00
Valor Adiciones	\$ 4.661.694.919,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 1.132.573.362,00
Total Contrato	\$ 28.062.581.585,00
Fecha de Inicio	18/06/2020
Fecha de Finalización	17/09/2029

Número de contrato	IDU-349-2020 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preconstrucción - Construcción - Conservación
Contratista	CONSTRUCTORA CONCRETO S.A.
Valor Sin Adiciones	\$ 208.086.098.930,00
Valor Adiciones	\$ 2.137.984.388,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 18.691.696.245,00
Total Contrato	\$ 228.915.779.563,00
Fecha de Inicio	18/06/2020
Fecha de Finalización	17/09/2029

Zonas industriales Grupo 2

IDU-1752-2021

Objeto del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

Descripción del Contrato

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2.

Fecha de actualización: 20/07/2026

 Descargar Informe de Avance PDF

Equipo de Apoyo a la Supervisión

 Juan Camilo Alvarez Buitrago - Apoyo Principal  Rafael Andres Penaranda Forero - Especialista de Apoyo

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1770-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preliminares - Construcción
Contratista	CONSORCIO MONTEVIDEO 045
Valor Sin Adiciones	\$ 5.911.786.089,00
Valor Adiciones	\$ 977.389.346,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 1.081.774.201,00
Total Contrato	\$ 7.970.949.616,00
Fecha de Inicio	02/12/2021
Fecha de Finalización	29/03/2027

Número de contrato	IDU-1752-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preliminares - Construcción
Contratista	CONSORCIO VICON 024
Valor Sin Adiciones	\$ 50.793.789.333,00
Valor Adiciones	\$ 1.279.282.469,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 7.353.503.397,00
Total Contrato	\$ 59.426.575.199,00
Fecha de Inicio	02/12/2021
Fecha de Finalización	29/03/2027



PROYECTOS DE CONSERVACIÓN

Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal - Grupo 3

IDU-1541-2025

Objeto del Contrato

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

Descripción del Contrato

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 3

Fecha de actualización: 06/07/2026

[Descargar Informe de Avance PDF](#)


Equipo de Apoyo a la Supervisión

 Diego Ferney Hernandez Oviedo - Apoyo Principal  Ivan Gerardo Torres Diaz - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1541-2025 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL 2025
Valor Sin Adiciones	\$ 51.127.150.612,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 51.127.150.612,00
Fecha de Inicio	22/01/2026
Fecha de Finalización	22/02/2028

Número de contrato	IDU-1551-2025 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO INTERURBANO VIAL
Valor Sin Adiciones	\$ 7.618.881.618,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 7.618.881.618,00
Fecha de Inicio	22/01/2026
Fecha de Finalización	22/02/2028

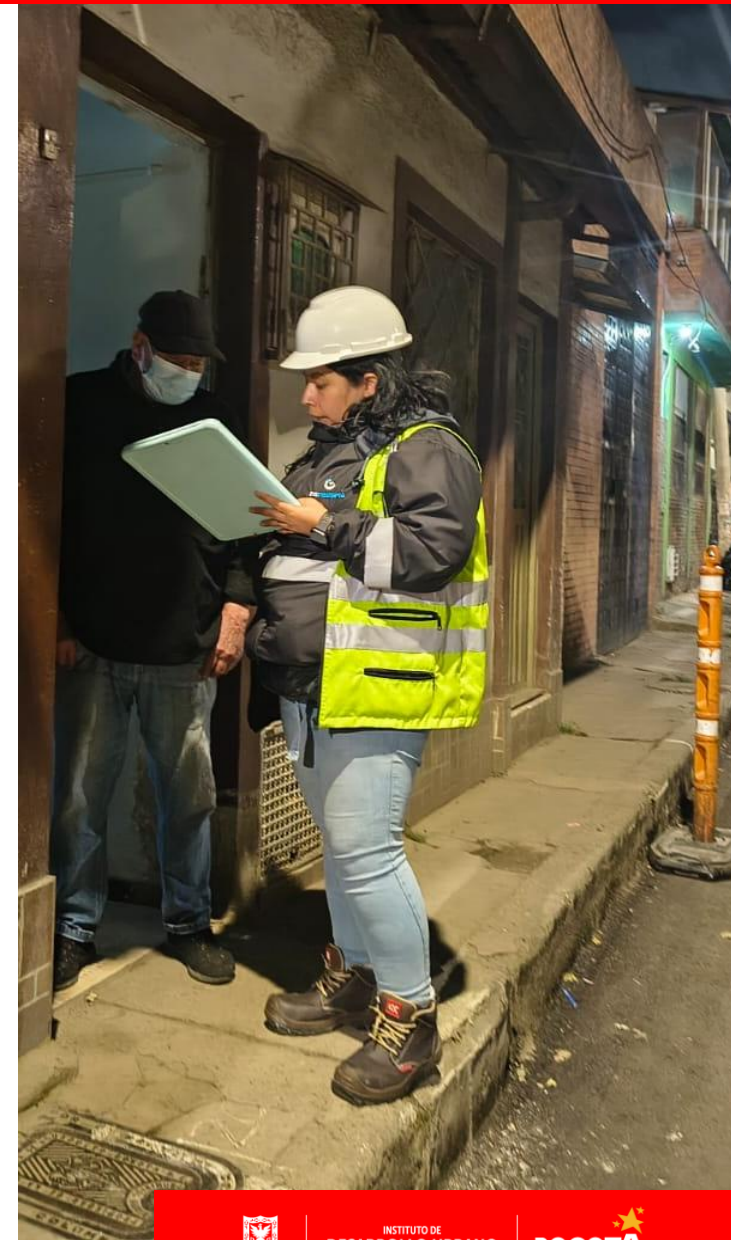

Conservación rutas S.I.T.P. Grupo 4. -2025

IDU-1590-2025

Objeto del Contrato

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4

Descripción del Contrato

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO - SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C., GRUPO 4

Fecha de actualización: 06/07/2026

 Descargar Informe de Avance PDF

Equipo de Apoyo a la Supervisión

 Julian Orlando Lopez Monroy - Apoyo Principal  Abelardo Perilla Galindo - Especialista de Apoyo  David Mauricio Prieto Castaneda - Especialista Ambiental  Lourdes Sofia Gutierrez Leon - Especialista de Apoyo  German Eugenio Cardenas Riveros - Especialista de Apoyo  Elemer Andres Quintero Roessel - Especialista de Apoyo  Marisol Amaya Oviedo - Especialista de Apoyo

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1590-2025
	(EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Preliminares
Contratista	CONSORCIO IP
Valor Sin Adiciones	\$ 43.690.121.286,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 43.690.121.286,00
Fecha de Inicio	30/01/2026
Fecha de Finalización	30/01/2028

Número de contrato	IDU-1576-2025
	(EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Preliminares
Contratista	CONSORCIO MALLA VIAL D.C.
Valor Sin Adiciones	\$ 7.421.129.203,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 7.421.129.203,00
Fecha de Inicio	30/01/2026
Fecha de Finalización	30/01/2028



Conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal - Grupo 7

IDU-1546-2025

Objeto del Contrato

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

Descripción del Contrato

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 7

Fecha de actualización: 13/07/2026

 Descargar Informe de Avance PDF

Equipo de Apoyo a la Supervisión

 Omar Camilo Ordonez Dominguez - Apoyo Principal  Edison Andres Pena Marin - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1561-2025 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO INTER VIAL VELNEC
Valor Sin Adiciones	\$ 7.616.817.921,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 7.616.817.921,00
Fecha de Inicio	14/01/2026
Fecha de Finalización	14/02/2028

Número de contrato	IDU-1546-2025 (EN EJECUCION)
Tipo	Contrato de Obra
Etapas Proyecto	Conservación
Contratista	CONSORCIO INFRAVIAL CAPITAL
Valor Sin Adiciones	\$ 51.126.655.279,00
Valor Adiciones	\$ 0,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 51.126.655.279,00
Fecha de Inicio	14/01/2026
Fecha de Finalización	14/02/2028





Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras
