

Instituto de Desarrollo Urbano

Localidad Suba

Rendición de cuentas nodo Movilidad

27 / 07 / 26

INSTITUTO DE
DESARROLLO URBANO

CONTENIDO



1 Presentación IDU

- Plataforma estratégica Misión – Visión
- Política antisoborno
- Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025
- Diagnóstico de la malla vial de la localidad
- Información general de los proyectos IDU en la localidad
 - Etapa de construcción
 - Etapa de EyD
- Preguntas e inquietudes

2 Unidad de Mantenimiento Vial

. Plataforma estratégica Misión – Visión



Nuestra Misión

Somos un establecimiento público descentralizado que ejecuta una Infraestructura con Propósito, que fomenta el desarrollo del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos del Distrito Capital y el área metropolitana, a través de la planeación, construcción y conservación de los proyectos para la movilidad y el espacio público.



Nuestra Visión

Al 2050 seremos reconocidos como una entidad confiable, efectiva y oportuna en el desarrollo de los proyectos de infraestructura vial y de espacio público. Gracias a una gestión pública basada en la colaboración interinstitucional, la innovación en los sistemas de construcción y la participación ciudadana disfrutaremos de una ciudad con una infraestructura para la movilidad, más accesible, moderna y segura.

Política Antisoborno

El Instituto de Desarrollo Urbano estableció una estrategia que busca prevenir, detectar y enfrentar el soborno. Por medio de varios lineamientos institucionales se fortalece la cultura de la transparencia entre todos los servidores públicos del IDU.

Para garantizar la debida ejecución de los recursos públicos que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes de Bogotá, el IDU implementa la Política Antisoborno. A través de este Abecé, usted conocerá en qué consiste esta estrategia y cómo puede tramitar una denuncia en caso de sospechar de una conducta indebida.

Contáctanos:

denuncia.soborno@idu.gov.co



AQUÍ
SÍ PASA
BOGOTÁ
MI CIUDAD
MI CASA



. Informe PQRSD vigencia 2024 y 2025



No.	Fecha	No. Radicado	No. Respuesta
1	03/07/2025	IDU 202518500943442	IDU 202522600759061
2	03/07/2025	IDU 202518500944382	IDU 202538500756071
3	03/07/2025	IDU 202518500943782	IDU 202538500756101



Diagnóstico de la malla vial

Diagnóstico localidad Suba

Malla vial de la localidad de Suba



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico localidad Suba


ESTADO RED VIAL URBANA- MALLA VIAL ARTERIAL



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico localidad Suba


ESTADO RED VIAL URBANA- MALLA VIAL URBANA

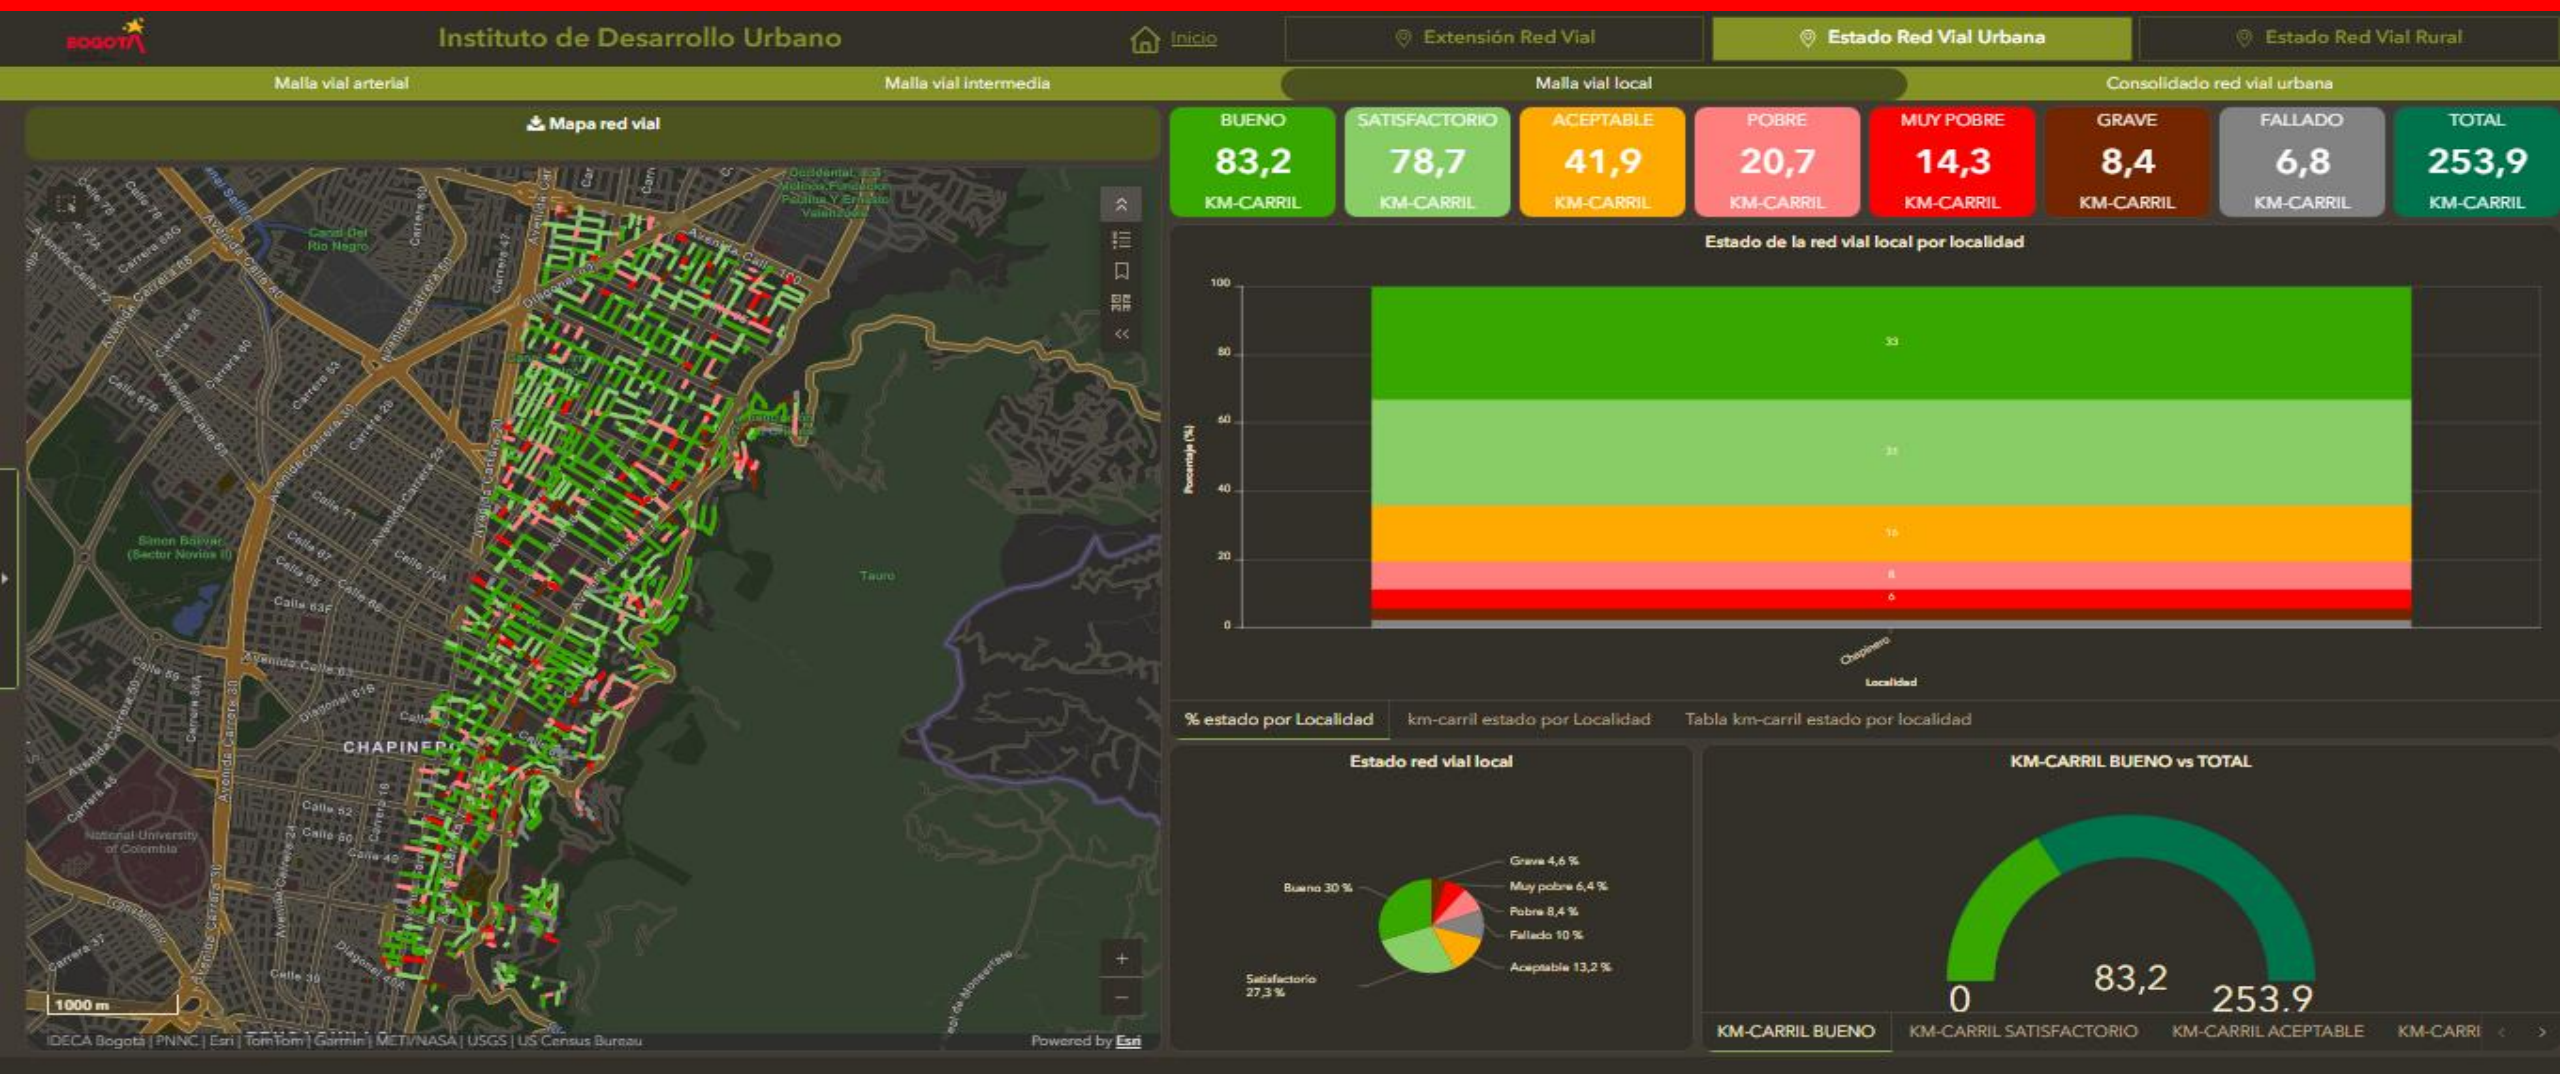

Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico localidad Suba

CONSOLIDADO-ESTADO RED VIAL INTERMEDIA

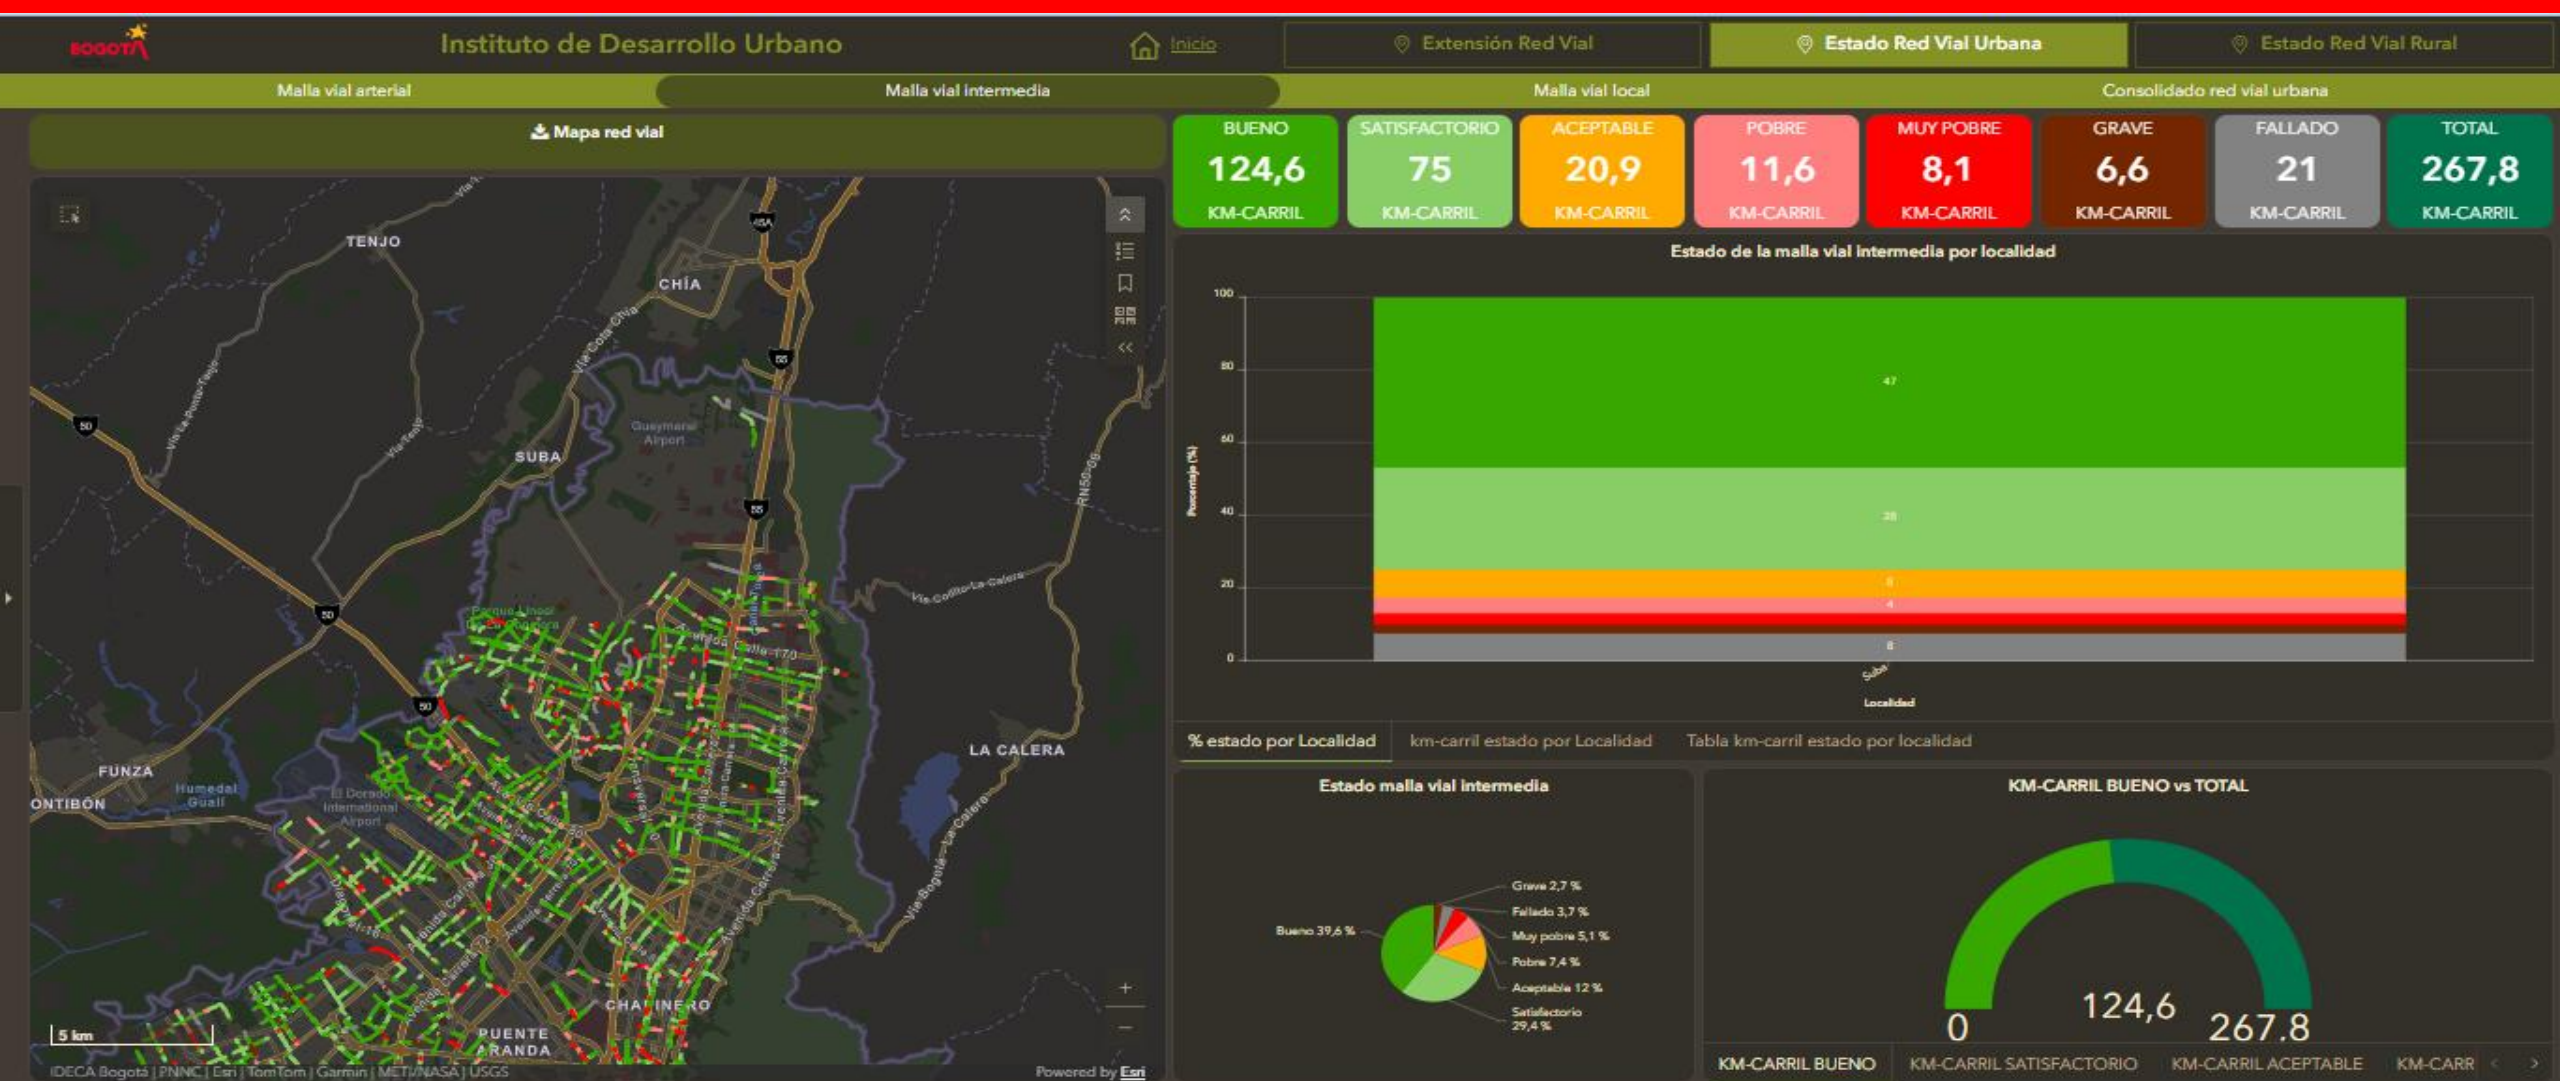

Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>

Diagnóstico localidad Suba

CONSOLIDADO-ESTADO RED RURAL



Fuente: <https://geoportal-idu.hub.arcgis.com/>



Proyectos IDU en la Localidad

PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA 1814-2021

Puente peatonal de acceso al portal Norte sobre la calle 174

Contratista Consorcio San Victorino



Etapas de Construcción
9%

Valor del contrato
26.298.165.834

Más información sobre el contrato IDU 1814 de 2021:

Punto IDU: Calle 181 No. 48A - 19

Línea de atención telefónica: 312 581 9279

Correo electrónico:

socialCSV@gvingenieros.com.co

Contratista: Consorcio San Victorino


Interventoría: Consorcio Interpuente Portal Norte

PROYECTOS

IDU-1737-2021

Puente calle 153 por autopista Norte-costado norte

Construcción para la **ampliación del puente vehicular** ubicado en la calle 153 por autopista Norte en la ciudad de Bogotá D.C.

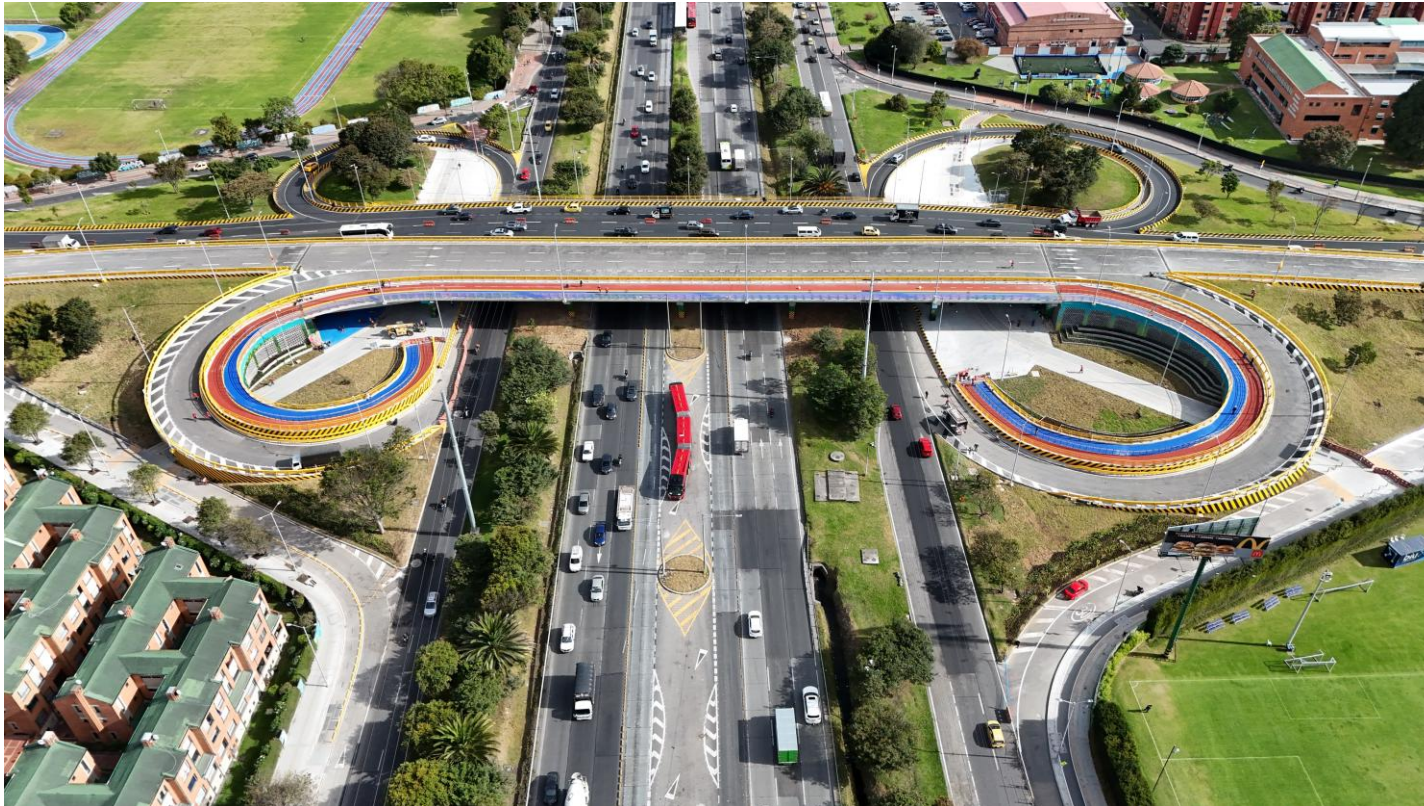

Valor ejecutado
53'028.510.083

Entregado el 6 de agosto de
2026
100% ejecutado:

PROYECTOS

Contrato IDU 351 de 2020

Grupo 7 Av. Carrera 68 entre calle 66 y
calle 100 con carrera 65a



LA CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN AL
SISTEMA TRANSMILENIO DE LA AVENIDA CONGRESO EUCARÍSTICO
(CARRERA 68) DESDE LA CARRERA 9 HASTA LA AUTOPISTA SUR Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ, D.C. LOTE 7

Valor del contrato
\$34.630.366.494

83%
programado

83%
ejecutado:


Etapas de construcción

Punto IDU Dirección: Carrera 67 A No. 95-20 Barrio Andes,
localidad Barrios Unidos
Teléfono 8400198
Celular 3185851712
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PROYECTOS

Contrato IDU 352 de 2020

Grupo 8 La Avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur

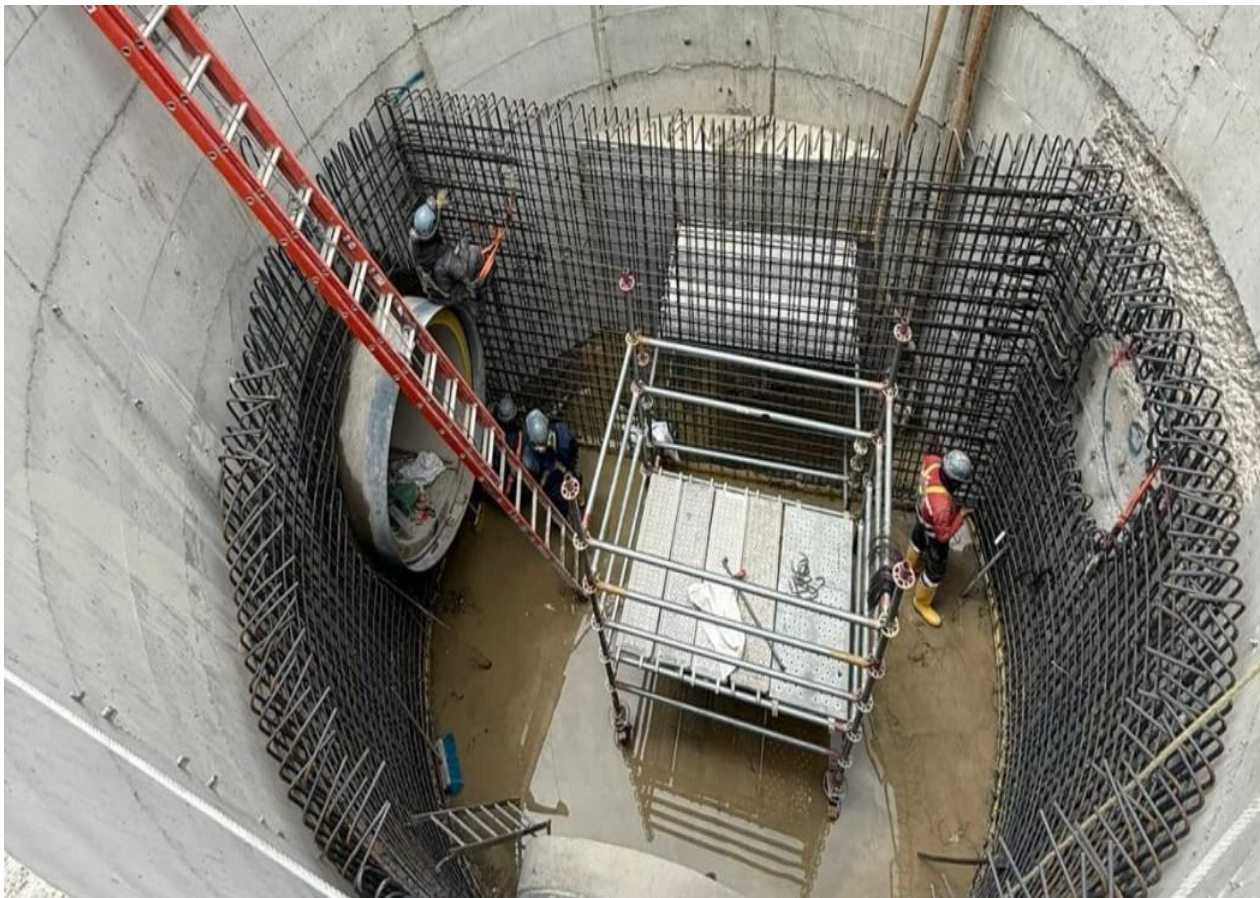

Construcción para la adecuación al sistema TransMilenio de la avenida Congreso Eucarístico (carrera 68) desde la carrera 9 hasta la autopista sur y obras complementarias en Bogotá D.C.

Valor del contrato:
247.117.818.593

80%
programado

% ejecutado:
80

Punto IDU Dirección: calle 97 a # 51-55
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm
Correo electrónico: atencionciudadanot8@conconcreto.com
Teléfono: 3104165472

PROYECTOS

Contrato IDU 352 de 2020

Grupo 9 de la Troncal Avenida 68 en Bogotá, a cargo del Consorcio Eucarístico Carrera 68,



Construcción para la adecuación al sistema TransMilenio conecta la Avenida 68 entre la carrera 48 y la carrera Novena y obras complementarias en Bogotá D.C.

Valor del contrato:
280.000.000.000

85%
programado

85%
ejecutado:

Punto IDU Dirección: calle 97 a # 51-55
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00 a 12:00 pm y de 1:00 a 5:00 pm

CTO. IDU 1788 – 2021 -CTO. IDU 1803 - 2021

Avenida Las Villas desde la Av. Tv Suba
(Calle 147) a la Av. Sirena (calle 153) -
Estudios y diseños



ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LAS VILLAS (AK 58) EN EL TRAMO
COMPENDIDO DE LA AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA (AC 147)
A LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

Valor del contrato
2,491,625,367


Etapas de Estudios y Diseños

Villas 1 (de la 147 a la 153): etapa de estudios y diseños y construcción, aún estamos en estudios y diseños con 60% de avance, el sábado pasado se llevó a cabo el comité IDU.

Villas 2 (de la 153 a la 170): etapa de factibilidad y estudios y diseños, se encuentra en inicio de la etapa de factibilidad, realizando los estudios técnicos pertinentes

PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA 1646-2019 MEJORAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE

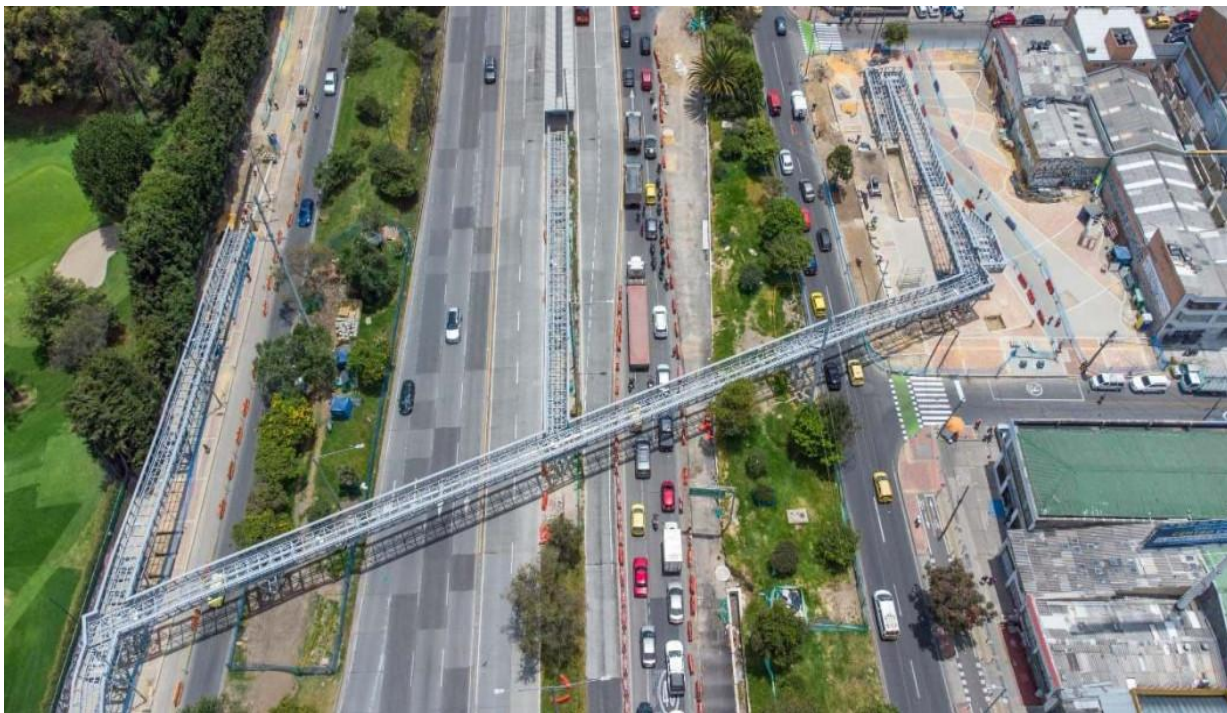

Contrato IDU 1646 de 2019: Dirección: Calle 163A No 22 – 07 Primer piso - Toberín Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Celular: 3224689911 Correo electrónico: puentesidu1646social@gmail.com Contratista: Consorcio Puentes Norte 2025 Interventoría: MAB Ingeniería de Valor S.A

COMPRENDE LA EJECUCION DE COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN, Y DE OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

Valor del contrato
51.911.687.414

Etapas de Construcción

99%
programado

95%
ejecutado

PROYECTOS

IDU-1776-2023 con objeto "CONSTRUCCIÓN DEL CICLOPUENTE AV. BOYACÁ POR CANAL SALITRE, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SU CONEXIÓN CON EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE EN BOGOTÁ DC"



Avenida Boyacá a la altura del Canal Salitre, que para efectos de nomenclatura corresponde a la AK 72, calle 86 A.

El proyecto consiste en el desmonte del puente existente y la construcción de un ciclopuente con una longitud 227m y un ancho de tablero de 6,70m (circulación independiente de peatones y biciusuarios), así como la intervención 8131 m2 de área de espacio público. La realización de este ciclopuente peatonal radica en la necesidad de brindar una adecuada movilidad, seguridad y beneficio a los usuarios que cruzan la Avenida Boyacá a la altura del Canal Salitre, para brindar continuidad de desplazamiento a los biciusuarios y peatones de la zona, incluyendo aquellos con dificultades en su movilidad, generando una circulación adecuada,

Valor :46.264.468.783
Etapas de Construcción

31%
ejecutado

PROYECTOS

IDU-1550-2018

Avenida El Rincón desde Av. Boyacá hasta K91 e intersección Av. El Rincón x Av. Boyacá



Construcción de la Ampliación de la Av. El Rincón desde Av. Boyacá hasta AK 91.

¿Qué incluye?

- Intersección de la Av. El Rincón por Av. Boyacá.
La vía contará con una **longitud de 2.35 kilómetros y con una ciclorruta sobre todo el corredor.**
- Se construirán **54.708 m2 de espacio público, 2 puentes vehiculares** rectos sobre la Av. Boyacá y un puente vehicular curvo que conectará la Av. Boyacá con la Av. Calle 127 con sus conectante respectivas.

**Valor del contrato
\$294,438.000.**

100% programado

100% ejecutado

PROYECTOS

IDU-1810-2021

Av. La Sirena desde autopista Norte hasta Av. Boyacá



Construcción Avenida la Sirena (Cl. 153) desde autopista Norte hasta Av. Boyacá (Calzada Norte)

Valor ejecutado
\$39,285,943,335

100%
programado

100% ejecutado

PROYECTOS

CONTRATO DE OBRA 1335-2023 Desarrollar las actividades de Reforzamiento y Rehabilitación y Mantenimiento, garantizando el adecuado funcionamiento estructura acordes a los lineamientos y necesidades actuales del puente peatonal atirantado localizado en la calle 174

COMPRENDE LA EJECUCION REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, LA INSTALACIÓN DE NUEVOS BAÑOS PÚBLICOS, BICI-PARQUEADEROS (88 PUESTOS) Y MURALISMO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD Y EL ENTORNO DE LOS USUARIOS. BOGOTÁ D.C.



**Valor del contrato
11.790.568.941**

**100%
programado**

**100%
ejecutado**

IDU-1777-2021

Avenida Boyacá desde Av. San José hasta Av. San Antonio



Construcción de la avenida Boyacá (AK 72) desde la avenida san José (ac 170) hasta la avenida San Antonio (AC 183), incluye la intersección con calle 183 y obras complementarias en Bogotá D.C.

Valor del contrato
\$72.334.000.000

100%
programado

100%
ejecutado

**Entrega al servicio a la ciudadanía 19 de
diciembre de 2024**

2

ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

<https://www.instagram.com/reel/DH7TkmRMD8f/?igsh=MWI2ZXB6bXVzamM1NQ%3D%3D>

CTO. IDU 1746 – 2023

Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) Calle 80 hasta la Calle 153 en el borde occidental de Bogotá- Estudios y diseños



ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA AVENIDA LONGITUDINAL DE OCCIDENTE EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CALLE 80 Y AV. CALLE 153 Y TRAMOS COMPLEMENTARIOS EN BOGOTÁ D.C

Etapas Asociadas: Estudios y Diseños - Factibilidad

Contrato: IDU-1746-2023

Estado: EN EJECUCION

Finalización de la etapa de Factibilidad

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1756-2023 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Contratista	T N M LIMITED
Valor Sin Adiciones	\$ 1.999.925.874,00
Valor Adiciones	\$ 508.976.521,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 2.508.902.395,00
Fecha de Inicio	20/08/2024
Fecha de Finalización	19/07/2026

Número de contrato	IDU-1746-2023 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Estudios y Diseños Técnicos)
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Contratista	IV INGENIEROS CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA S.A.
Valor Sin Adiciones	\$ 9.499.800.724,00
Valor Adiciones	\$ 745.196.644,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 10.244.997.368,00
Fecha de Inicio	20/08/2024
Fecha de Finalización	19/07/2026

Información Financiera

Número de contrato	IDU-1756-2023
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Valor Contrato	\$ 2.508.902.395,00
Valor Anticipo	\$ 0,00
Total Pagado	\$ 1.056.572.502,00
Saldo Contrato	\$ 1.452.329.893,00
Ejecución Financiera	42.11 %
Pagos	Ver Tabla de Pagos

Número de contrato	IDU-1746-2023
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Valor Contrato	\$ 10.244.997.368,00
Valor Anticipo	\$ 0,00
Total Pagado	\$ 2.494.592.325,00
Saldo Contrato	\$ 7.750.405.043,00
Ejecución Financiera	24.35 %
Pagos	Ver Tabla de Pagos

Estado Actual del Contrato

Etapa Actual del Contrato	Fecha de Inicio del Contrato	Fecha Finalización del Contrato	% Programado del Contrato	% Ejecutado del Contrato	% Variación del Contrato	% Última Variación del Contrato	
Factibilidad	20/08/2024	19/07/2026	74.81	58.62	-16.2	-16.2	Ver gráfica

Suba – Cota CTO. IDU 1815 – 2021
Proyecto vial entre Bogotá y Cota avanza en su planeación: inversión de \$1,2 billones y obras previstas para 2027



Equipo de Apoyo a la Supervisión

Diana Carolina Valderrama Torres - Apoyo Principal

Información Contractual

Número de contrato	IDU-1815-2021 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Estudios y Diseños Técnicos)
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Contratista	CONSORCIO EYD COTA
Valor Sin Adiciones	\$ 13.039.951.981,00
Valor Adiciones	\$ 1.567.852.506,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 14.607.804.487,00
Fecha de Inicio	01/08/2022
Fecha de Finalización	03/04/2026

Información Financiera

Número de contrato	IDU-1815-2021
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Valor Contrato	\$ 14.607.804.487,00
Valor Anticipo	\$ 0,00
Total Pagado	\$ 8.937.972.757,00
Saldo Contrato	\$ 5.669.831.730,00
Ejecución Financiera	61.19 %
Pagos	Ver Tabla de Pagos

ELABORACIÓN DE LA FACTIBILIDAD, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COTA DESDE LA CARRERA 92 (CERRO DE LA CONEJERA) E INTERSECCIÓN CON EL MUNICIPIO DE COTA

Etapas Asociadas: Estudios y Diseños - Factibilidad
Contrato: IDU-1815-2021
Estado: EN EJECUCION

En etapa de aprobación
Sustracción de reserva Thomas van der Hammer: La CAR esta en revisión y imactos ambientales para efectuar las licencias.

Número de contrato	IDU-521-2022 (EN EJECUCION)
Tipo	Consultoría (Interventoría)
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Contratista	CONSORCIO INTERVENTORIA COTA
Valor Sin Adiciones	\$ 4.119.988.968,00
Valor Adiciones	\$ 1.640.679.275,00
Mayores Cant. de Obra	\$ 0,00
Total Contrato	\$ 5.760.668.243,00
Fecha de Inicio	01/08/2022
Fecha de Finalización	03/05/2026


Número de contrato	IDU-521-2022
Etapa Proyecto	Factibilidad - Estudios y Diseños
Valor Contrato	\$ 5.760.668.243,00
Valor Anticipo	\$ 0,00
Total Pagado	\$ 4.187.887.030,00
Saldo Contrato	\$ 1.572.781.213,00
Ejecución Financiera	72.70 %
Pagos	Ver Tabla de Pagos

2

CONSERVACIÓN –MANTENIMIENTO

<https://www.instagram.com/reel/DH7TkmRMD8f/?igsh=MWI2ZXB6bXVzamM1NQ%3D%3D>

CONSERVACIÓN

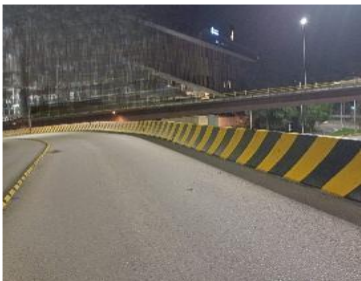

Proyecto	Ubicación	Localidad	Estado	Foto
Malla vial – Contratos en ejecución conservación				
Brigada MVAT Grupo 2	AUTOPISTA NORTE CON CALLE 150	Usaquén Suba, Engativá Barrios Unidos, Fontibón Los Mártires Teusaquillo. Santafé	Estado: En ejecución. %Avance: 90,37%. Conservar la malla vial arterial troncal mediante diferentes tipos de alternativas mediante la modalidad de brigada de reacción	
Contrato Interadministrativo Aguas de Bogotá	<u>Pintura murales</u> intercambiador vial calle 92	La Candelaria Chapinero Usaquén Suba Barrios Unidos Pueblo Aranda Bosa Los Mártires	Estado: En ejecución. %Avance: 4%. Convenido administrativo para realizar adecuación integral de infraestructura urbana de la ciudad - limpieza de estructuras hidráulicas, vallados, segregadores.	

PROYECTOS

CONSERVACIÓN

Convenio UARMV	Calle 172 entre carrera 8H y carrera 9	La Candelaria, Chapinero, Usaquén, Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Bosa, Los Mártires	Estado: En ejecución. % Avance: 27,14%. Convenio administrativo, para realizar la conservación y atención de actividades de espacio público	
Manila Vial Arterial Troncal Grupo 1	Autopista Norte, Avenida Suba, Avenida Calle 80	Usaquén, Chapinero, Engativá, Suba, Barrios Unidos	En ejecución. Actividades preliminares, evaluación inicial, diagnósticos para inicio de obra. Acta de inicio firmada el 15-12-2025	
Mejoramiento integral de infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C.	Manila vial de la ciudad – Lavado y pintura / recolección y reposición de elementos segregadores - Restauración de la demarcación horizontal y vertical entre otras	Carácter Metropolitano (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, Suba)	Estado: En ejecución. %Avance: 4%. Convenio administrativo para ejecutar actividades de apoyo en la adecuación integral de infraestructuras urbanas en la ciudad de Bogotá D.C	
Conservación enlaces vehiculares	DG 136 por Avenida Transversal De Suba (Puente de La Virgen)	Suba	En ejecución. actividades de mantenimiento rutinario, periódico y rehabilitación, incluye superestructura, subestructura y accesos, avance del 92.0%.	
Manila Vial Rural Zona 2	Via a Cota	Suba	En ejecución. Actividades preliminares, evaluación inicial, diagnósticos para inicio de obra. Acta de inicio firmada el 15-12-2025	

Espacio público – Contratos en Ejecución				
Brigada de rescate espacio público grupo 1	Cicloruta Calle 153 entre Autopista Norte y Av. Boyacá	Suba	En ejecución. Brigada de rescate grupo 1, intervenciones con actividades puntuales en el espacio público, ciclorutas y calzadas. En revisión de la supervisión	
Brigada de rescate espacio público grupo 1	Espacio Público Av. Ciudad de Cali (Carrera 104, calle 127) desde Calle 99 (Canal Salitre) hasta Calle 153	Suba	En ejecución. Brigada de rescate grupo 1, intervenciones con actividades puntuales en el espacio público, ciclorutas y calzadas. En revisión de la supervisión	
Brigada de rescate espacio público grupo 1	Espacio Público Calle 153 entre Autopista Norte y Av. Boyacá	Suba	En ejecución. Brigada de rescate grupo 1, intervenciones con actividades puntuales en el espacio público, ciclorutas y calzadas. En revisión de la supervisión	
Mejoramiento integral de infraestructura en la ciudad de Bogotá D.C	Vallados suba – oca, Autopista Norte, Calle 26, piletas Eje ambiental entre otras – Limpieza de estructuras de drenaje.	Suba	Contrato Metropolitano (Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar)	
Manila Vial Arterial No Troncal Grupo 5	Avenida Boyacá, Avenida Fucha, Av. Ciudad de Lima (Cl 19), Av. Pepe Sierra (CL 116), Avenida Camino Del Prado Av. de La Boda (Calle 1)	Santa Fe, San Cristóbal, Tunjuelito, Suba, Antonio Nariño, Puente Aranda, Ciudad Bolívar	Contrato suscrito 16/12/2025	

PROYECTOS

CONSERVACIÓN

Malla Vial Arterial No Troncal Grupo 6	Avenida de La Constitución Avenida Jorge Uribe Botero Avenida Colombia (KR 24) Avenida General Santander Av. San Juan Bosco Avenida Pedro León Trubachy Avenida Chile Avenida del Salitre	Usaquén Fontibón Engativá Suba Barrios Unidos Teusaquillo Los Mártires Puente Aranda	Contrato suscrito 16/12/2025	
Malla Vial Arterial No Troncal Grupo 8	Avenida Del Congreso Eucarístico Av. del Ferrocarril Del Sur Avenida Usaquén Avenida Poporo Quimbaya Vía El Cofre A La Calera Avenida La Conejera	Usaquén Chapinero Usme Tunjuelito Kennedy Suba Puente Aranda	Contrato suscrito 16/12/2025	
Malla Vial que soporta rutas del SITP Grupo 6	SUBA TEUSAQUILLO	SUBA TEUSAQUILLO	Contrato suscrito 26/12/2025	
Puentes Vehiculares Grupo 1	KR 10 CL 6 Intercambiador vehicular Av. Callejas por av. Germán Arciniegas (AK 11) Av. Paseo del Country por Av. Carlos Urdas Restrepo (costado oriental) Retorno av. Carlos Urdas Restrepo Av. Santa Bárbara (KR 19) por CL 131a Av. Medellín por Av. Ciudad de	Usaquén Chapinero Santa Fe Suba Barrios Unidos Teusaquillo Puente Aranda	Contrato suscrito 26/12/2025	

	quito (costado sur)			
Puentes Vehiculares Grupo 2	Av. Bohórquez Mejía Cifuentes por CL 150 Av. Luis Carlos Gaitán Sarmiento por Av. Del Congreso Eucarístico (costado sur) Av. Alfredo Bateman (CL 145) por KR 84a (costado norte) Av. Boyacá (AK 72) por av. Jorge Eliécer Gaitán (AC 26) (Transmilenio) Av. Medellín por Av. del congreso	Usme Tunjuelito Bosa Kennedy Fontibón Engativá Suba Rafael Uribe Urdas Ciudad Bolívar	Contrato suscrito 23/12/2025	



Gracias

Síguenos en nuestras redes sociales

    @IDUBogota  @IDUobras
