

STESV
202633600971981
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 14 de 2026

Señor
EDWAR HERNAN CUERVO
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato de obra IDU-1013-2022 “CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA)”. Respuesta a comunicado BTE No. 4563552026 radicado IDU 202618501035852 del 26/06/2026 a Derecho de Petición sobre contrato de obra IDU-1013-2022.

Respetada Señor Cuervo,

En atención a la solicitud contenida en el oficio y copia de la referencia, dadas las competencias fijadas en el Acuerdo Distrital 004 de 2025 *“Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano –IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”*, a continuación, se brinda respuesta, con base en los reportes y la documentación preparada por la Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial de la Dirección Técnica de Construcciones, en los siguientes términos, previa transcripción de la misma así:

“(…) Puente de Bosa hoy 25 junio.no.estan laborando (...)”

Respuesta: Sea lo primero precisar que, el Instituto de Desarrollo Urbano suscribió el contrato de obra IDU IDU-1013-2022 cuyo objeto es ***“CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AUTOPISTA SUR (NQS) CON AVENIDA BOSA Y PROLONGACIÓN DE LA AVENIDA LAS TORRES HASTA LA CONEXIÓN DE CALLE 59 SUR (AVENIDA BOSA)”***, respecto el cual, en aplicación de lo previsto en el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011, el control y seguimiento a su ejecución se efectúa a través del contrato de interventoría IDU IDU-1220-2022, cuyo objeto es ***“Interventoría Integral A La Construcción De La Intersección A Desnivel De La Autopista Sur (NQS) Con Avenida Bosa Y Prolongación De La Avenida Las Torres Hasta La Conexión De Calle 59 Sur (Avenida Bosa)”***

Para la semana 198 con corte al 06 de julio de 2026 se tiene que el contrato de obra pública IDU-1013-2022 se encuentra en ejecución, con un reporte de avance ejecutado del contrato del 46,29%, conforme lo establecido en ZIPA (Sistema de Gestión Integral de Proyectos que es la plataforma virtual del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Así mismo, se informa que el contratista de obra viene ejecutando

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STESV

202633600971981

Información Pública

Al responder cite este número

labores en doble turno. Para ello, cuenta con siete (7) frentes de trabajo en jornada diurna, con un total de 370 personas en obra, y dos (2) frente adicional en jornada nocturna, con 33 personas, fortaleciendo el ritmo de ejecución del proyecto.

De igual manera, indicamos que contractualmente la fecha de finalización del contrato de obra es el **18 de julio de 2027**.

Así mismo, se informa que se trasladó la consulta a la interventoría de obra CONSORCIO LAS TORRES 2022, quien emitió respuesta mediante correo electrónico adjunto del 07/07/2026, indicando:

“(...) Tomando como base lo expresado por el peticionario a continuación damos respuesta a la consulta elevada

1. Personal en campo del contrato de obra IDU 1013-2022

Durante la jornada se trabajó con 379 personas entre personal profesional y operativo (maestros, ayudantes, oficinales, operarios)

2. Actividades de campo

A. LAS TORRES

Sector 1.3

Pruebas de presión de red de agua potable

Instalación y compactación de material SBG-PEA-AR para conformación de espacio público

Instalación de formaleta para fundir tapa de desarenador

Excavación manual para adecuación de espacio público

Sector 1.4

Instalación de rajón para conformación de cajón de vía

Instalación y compactación de material SBG-PEA-AR para conformación de espacio público

Instalación de pañete interno en pozo de red pluvial

Escarificación de material SBG-PEA-AR para conformación de espacio público

Perforación para anclajes de caja de red movistar

Siembra para conformación de zonas verdes

Sector 2.2

Excavación manual para conformación de espacio público


Instalación de adoquín para conformación de espacio público

Compactación de SBG-A para conformación de boca calle

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STESV

202633600971981

Información Pública

Al responder cite este número

Sector 3.2

Instalación de pañete interno en caja de alumbrado público

Instalación y compactación de material SBG-PEA-AR para conformación de espacio público

Adecuación y limpieza de pozo de red sanitaria

Armado de acero de refuerzo en tapa de sumidero

Sector 3.3

Armado de acero para conformación de espacio público

Vaciado y estampado de concreto para conformación de espacio público

Adecuación y limpieza de pozo de red sanitaria

B. Conectante SW

Armado de acero para conformación de espacio público

Vaciado y estampado de concreto para conformación de espacio público

Adecuación y remates en cajas de alumbrado público

Adecuación y remates en cajas de red ENEL

Construcción en mampostería para cajas de red ENEL

C. Conectante SE

Excavación mecánica para construcción de soporte pozo 16 de lanzamiento Pipe jacking

Demolición de dado de semáforo para construcción de pozo 16 de lanzamiento Pipe jacking

Instalación de pañete interno en pozo de red pluvial

Construcción en mampostería para caja de alumbrado público

Vaciado de concreto para conformación de sendero peatonal provisional

Excavación mecánica para conformación de ciclorruta

Excavación mecánica para conformación de espacio público

Instalación de mejoramiento en rajón para conformación de ciclorruta

D. Conectante NW

Continúan con excavación mecánica para instalación de red semaforización

Retiro de formaleta en módulo No.4 muro de contención


Adecuación de tubería de red ETB

Armado de acero de refuerzo para sumideros

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STESV

202633600971981

Información Pública

Al responder cite este número

*Construcción en mampostería para conformación de pozo de red sanitaria
Extendido de arena para instalación de adoquín provisional
Armado de acero de refuerzo en módulo No.5 muro de contención
Instalación de tubería de red ENEL
Adecuación y limpieza de pozos de red sanitaria
Instalación de formaleta en módulo No.6 muro de contención
Instalación de adoquín para conformación de espacio público
Excavación mecánica para instalación de filtro en módulo No.4 muro de contención*

E. Puente 1

*Instalación de formaleta en vigas diafragma No.10, No.11 y No.12
Retiro de formaleta en macizo de continuidad
Vaciado de concreto en vigas diafragma ejes 4 y 5*

F. Puente 2

*Instalación de mejoramiento en rajón para conformación de aproche
Excavación mecánica para conformación de aproche
Instalación de torones en vigas artesas
Adecuación y resanes en viga artesa No.12*

G. Puente 6

*Compactación de material seleccionado para conformación de aproche
Vaciado de concreto ciclópeo para conformación de aproche
Instalación de bloques keystone para conformación de aproche*

H. Puente 7


*Retiro de formaleta de viga diafragma eje 3
Instalación de formaleta en vigas diafragma eje 4*

3. Registro fotográfico


Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.




STESV
202633600971981
Información Pública
Al responder cite este número

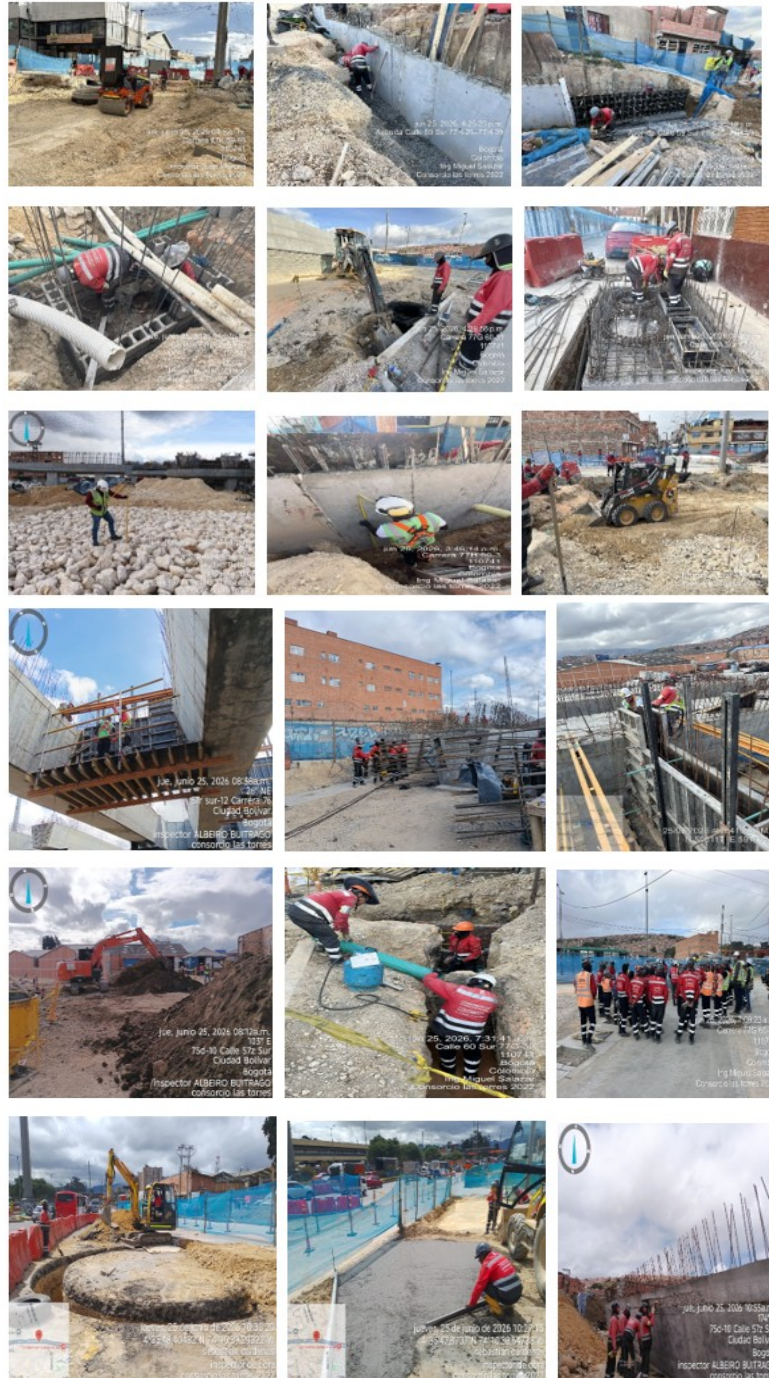

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STESV
202633600971981
Información Pública
Al responder cite este número



(...)"

El Instituto de Desarrollo Urbano, en coordinación con el contratista, la interventoría y las entidades involucradas, continúa implementando acciones orientadas a mitigar los impactos temporales en el sector, comprendiendo las molestias que puedan generarse y reiterando que las obras tienen como propósito mejorar la movilidad y la calidad de vida de la comunidad de la localidad de Bosa.

Finalmente, se informa que cualquier inquietud relacionada con el proyecto IDU-1013-2022, el contratista de obra CONSORCIO CC INTERSECCIÓN AV. BOSA, puede responderla mediante los canales Punto IDU dispuestos por el Contratista, tales como:


- Dirección: Kr 77 g # 60 39 sur Bosa Central
- Horario de atención: Lunes a viernes: 8:00 am - 12:00 m y 1 pm - 4:30 pm. Los sábados: 8:00 am - 10: 00 am
- Correo electrónico: puntoidu1013-2022@conconcreto.com
- Teléfono: 3105825345

Agradecemos su interés y reiteramos la voluntad de servicio y atención a todo requerimiento ciudadano, fundamento que orienta la gestión del IDU; de igual forma estaremos pendientes en caso de requerir cualquier complemento a nuestra respuesta.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STESV
202633600971981
Información Pública
Al responder cite este número

En los anteriores términos se da respuesta de fondo, completa y de manera oportuna a su petición, de conformidad con la Ley 1755 de 2015, por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye el título correspondiente del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 14-07-2026 09:36:03 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Anexos: 6 Folios/Páginas/Imágenes

Aprobó: JAIRO LEONARDO JIMENEZ FERREIRA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: LUZ ANGELA GARZON URREGO-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: CARMENCY ARLETH GARCÍA MARTÍNEZ-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Revisó: SERGIO EFREN CELY CABEZAS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial
Elaboró: MARIA MERCEDES SUAREZ CASAS-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema Vial

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

7
