Id		EDT	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**1**		**EXPLORACIÓN DEL SUBSUELO FASE DE DISEÑOS DEFINITIVOS**	**183 días**	**jue 17/06/21**	**jue 23/12/21**	
2		**1.1**		**PRELIMINARES**	**75 días**	**jue 17/06/21**	**jue 02/09/21**	
3		1.1.1		Elaboración del Plan de Exploración Geotécnica Fase Diseños Definitivos	5 días	jue 17/06/21	mar 22/06/21	
4		1.1.2		Entrega plan exploración Diseños Definitivos V0	0 días	mar 22/06/21	mar 22/06/21	3
5		1.1.3		Revisión y Aprobación Interventoría a la V0	53 días	mar 22/06/21	lun 16/08/21	4
6		1.1.4		Entrega plan exploración Diseños Definitivos V1	0 días	lun 02/08/21	lun 02/08/21	5FC-14 días
7		1.1.5		Revisión y Aprobación Interventoría a la V1	14 días	lun 02/08/21	lun 16/08/21	6
8		1.1.6		Ajuste y entrega plan exploración Diseños Definitivos V2	17 días	lun 16/08/21	jue 02/09/21	7
9		**1.2**		**TRABAJOS EN CAMPO**	**70 días**	**lun 06/09/21**	**mié 17/11/21**	
10		1.2.1		Ejecución perforaciones	70 días	lun 06/09/21	mié 17/11/21	8FC+3 días
11		1.2.2		Ejecución líneas sísmicas	2 días	mar 21/09/21	jue 23/09/21	10CC+15 días
12		**1.3**		**ENSAYOS DE LABORATORIO**	**70 días**	**vie 01/10/21**	**lun 13/12/21**	
13		1.3.1		Ejecución ensayos laboratorio	70 días	vie 01/10/21	lun 13/12/21	10FC-45 días
14		1.4		Procesamiento de información de laboratorio y campo	50 días	mar 02/11/21	jue 23/12/21	13FF+10 días

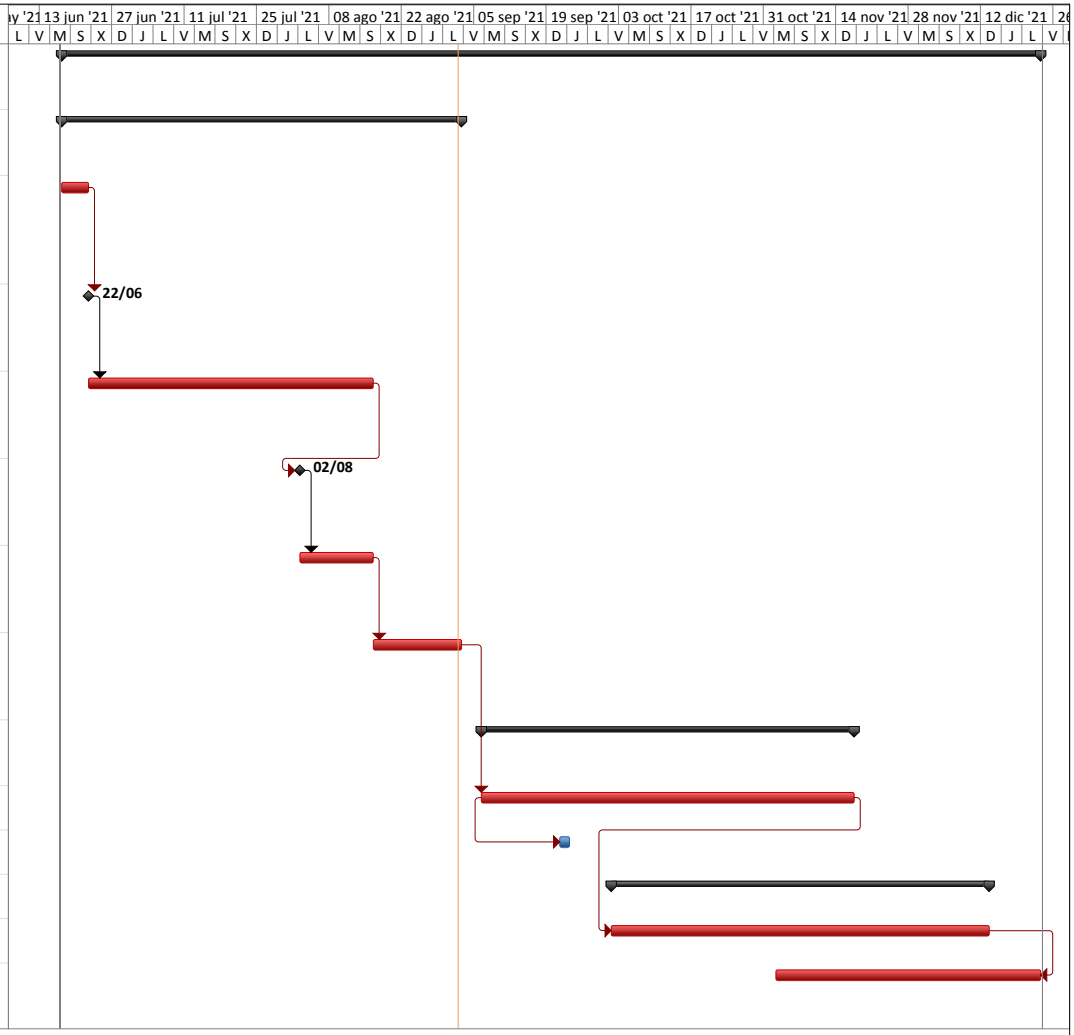

PEG Diseños Definitivos V2.m
jue 02/09/21

Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Fecha límite	
División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Tareas críticas	
Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo		División crítica	
Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin		Progreso	
