



STEST

202634600991551

Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Julio 17 de 2026

Señor(a)

ANONIMO ANONIMO
NO REGISTRA

NO REGISTRA
Bogotá - Bogotá DC

REF: Respuesta Al Radicado Número 202618501052632 Derecho de Petición
Solicitud Información Fechas de Ejecución de Obras, Corredor Carrera
Séptima. CONTRATOS DE OBRA IDU 1739, 1727 Y 1740 DE 2023

Estimada Patricia Arenas,

En atención a la solicitud de información requerida a través del radicado de la referencia, en cumplimiento de las competencias fijadas en el Acuerdo 004 de 2025 "Por el cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones"; y obrando dentro del término legal, se procede a dar respuesta en relación con la solicitud allegada mediante radicado interno 202618501052632, formulada por usted a través de nuestras redes sociales, en la cual manifiesta la siguiente inquietud sobre el proyecto Corredor Carrera Séptima:

Solicitud:

"Cuéntenos el crono grama real, cuando es la fecha de inicio por tramo y la de terminación gracias, es solo para prepararnos en la morbilidad".

Respuesta: El proyecto general del Corredor de la Carrera Séptima, tramo 3 en ejecución, intervendrá desde la Calle 99 hasta la Calle 200, incluyendo el Patio Portal de la Calle 200 con la construcción de una sección vial a lo largo de todo

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

1



STEST

202634600991551

Información Pública

Al responder cite este número

el corredor de uno y dos carriles por sentido para el servicio de transporte masivo (Transmilenio), dos carriles de servicio mixto por sentido, ciclorruta en el costado occidental, 14 estaciones de Transmilenio, espacio público apto para todo tipo de usuarios incluyendo adecuación continua de pasos seguros para personas con movilidad reducida, la construcción de puentes vehiculares en las intersecciones con calle 100 y calle 127 y pasos deprimidos o soterrados en la calle 100 y otro a la altura del Patio portal, adicionalmente se adelantará la renovación y mejoramiento de las redes de servicios públicos y telemáticos, así como la implementación de sistemas de drenajes urbanos, zonas verdes, jardinería y obras complementarias. Todo lo anterior con un periodo posterior de tres años de mantenimiento a las obras ejecutadas, que se encuentra contratado dentro de los actuales contratos de obra e interventoría correspondientemente.

En relación con el cronograma, es importante señalar que la estructuración del proyecto, identificó la necesidad de **tres fases: preconstrucción, construcción y mantenimiento**; las mismas fueron incluidas en los contratos según los procesos particulares de cada grupo o tramo, las cuales son:

PROCESO DE SELECCIÓN LICITACIÓN PÚBLICA	GRUPO 1 (Calle 99-127)	GRUPO 2 (Calle 127-183)	GRUPO 3 (Calle 183-200 Y PATIO PORTAL)
IDU-LP-DG-003-2023			
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 99 HASTA LA CALLE 127 INCLUYENDO LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE 127 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 127 HASTA LA CALLE 183 (NO INCLUYE INTERSECCIÓN) Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	"CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VERDE DE LA CARRERA 7 DESDE LA CALLE 183 (INCLUYE INTERSECCIÓN) HASTA LA CALLE 200, CONSTRUCCIÓN DEL PATIO PORTAL UBICADO EN LA CARRERA 7 POR CALLE 200 Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."
CONTRATOS DE OBRA	IDU-1739-2023	IDU-1727-2023	IDU-1740-2023

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

2



STEST
202634600991551
Información Pública
Al responder cite este número

FECHA DE INICIO	23/02/2024	19/02/2024	6/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE PRECONSTRUCCIÓN- INICIO DE ETAPA DE CONSTRUCCIÓN	26/03/2026	21/07/2026	16/07/2026
TERMINACION DE CONSTRUCCION/ INICIO DE MANTENIMIENTO	26/03/2029	21/01/2029	16/01/2029
FECHA DE TERMINACIÓN DE MANTENIMIENTO CONTRATO	25/03/2032	20/01/2032	15/01/2032
DURACIÓN ACTUAL DE LAS ETAPAS DE LOS CONTRATOS			
PRECONSTRUCCIÓN	20 MESES Y 14 DIAS	22 MESES	14 MESES
CONSTRUCCIÓN	36 MESES	30 MESES	30 MESES
MANTENIMIENTO	36 MESES	36 MESES	36 MESES
TOTAL, PLAZO	92 MESES Y 14 DÍAS	88 MESES	80 MESES

Se debe aclarar que el Grupo 1, cambio de etapa de preconstrucción a **construcción**, el pasado 26 de marzo de 2026, es decir su etapa de obra se encuentra activa y dispone del Plan Detallado de Trabajo aprobado por la interventoría, por medio del cual se establece el proceso constructivo, la secuencia y duración de las actividades. Para este primer grupo se encuentran plenamente establecidos los primeros ocho frentes de obra.

Dichos frentes se encuentran distribuidos de manera estratégica, garantizando la circulación continua de dos carriles por sentido, en estricto cumplimiento de los Planes de Manejo de Tránsito aprobados por la Secretaría Distrital de Movilidad. La distribución técnica y las fechas proyectadas de apertura para cada frente son:

- **Frente de Obra No. 1:** Construcción de calzada BRT occidental, tramo comprendido entre las calles 119 y 121 (Apertura: marzo de 2026 Finalización: agosto de 2026) PMT 003.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600991551

Información Pública

Al responder cite este número

- **Frente de Obra No. 2:** Construcción de calzada BRT occidental, tramo comprendido entre las calles 109 y 112 (Apertura: mayo de 2026 finalización agosto 2026) PMT 008.
- **Frente de Obra No. 3:** Instalación de red matriz mediante sistema constructivo *Pipe Jacking*, tramo comprendido entre las calles 99 y 102 (Apertura: junio de 2026 finalización: enero de 2027) PMT 006.
- **Frente de Obra No. 4:** Construcción de calzada BRT, calzada mixta occidental y adecuación de espacio público, tramo comprendido entre las calles 116-119 frente a la Fundación Santa Fe, y construcción de Calzada BRT occidental 112 y 116 (Apertura: julio de 2026 finalización: diciembre del 2026) PMT 012.
- **Frente de Obra No. 5:** Construcción de calzada mixta oriental, tramo comprendido entre la calle 121 y 126A (Apertura: agosto de 2026 finalización: julio 2027) PMT en elaboración.
- **Frente de Obra No. 6:** Intersección Calle 100: Actividades de construcción de cimentación (bases) para la nueva estructura de puente vehicular (Apertura: agosto de 2026 finalización: junio del 2028). PMT en elaboración.
- **Frente de Obra No. 7:** Construcción de calzada mixta oriental, tramo comprendido entre las calles 102 y 110 (Apertura: septiembre de 2026 finalización: agosto del 2027) PMT 017.
- **Frente de Obra No. 8:** Intersección Calle 100: Actividades de demolición del actual puente de la Calle 100 (Apertura: septiembre de 2026 finalización: noviembre del 2026). PMT en elaboración.

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST
202634600991551
Información Pública
Al responder cite este número

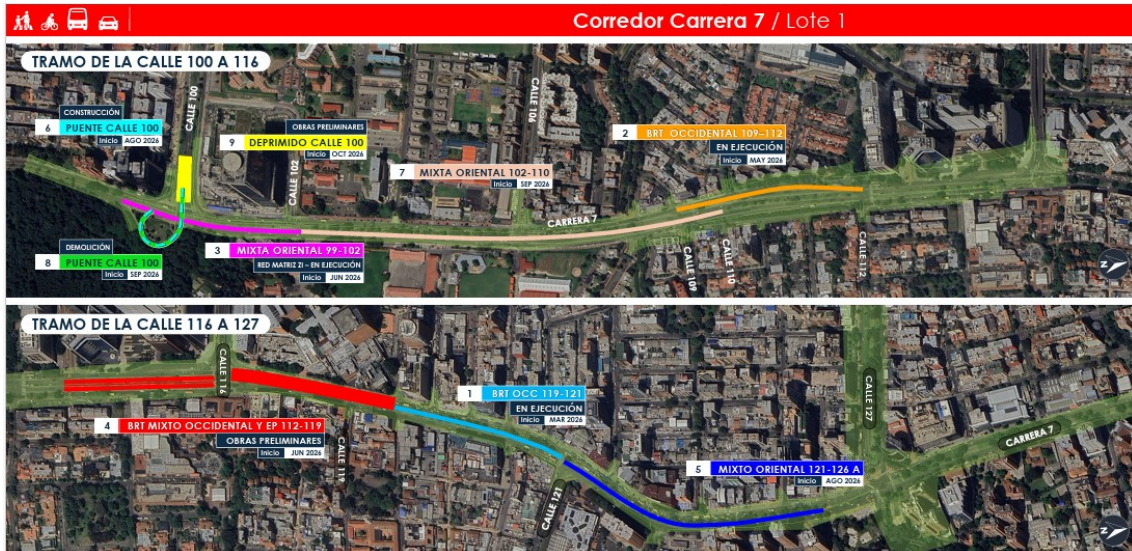


IMAGEN 1: ESQUEMA DE INTERVENCIONES INICIALES LOTE 1- FUENTE PROPIA.

Es importante señalar que los frentes de trabajo planteados pueden tener variaciones dependiendo de las autorizaciones de los planes de manejo de tránsito, de las adecuaciones de señalización, cierres, demarcaciones, ajustes semaforicos y otros, que se implementan para disponer de los espacios de forma adecuada, no obstante los usuarios siempre dispondrán de los dos carriles habilitados por cada sentido para el tránsito vehicular, y de los corredores peatonales continuos y seguros para la correcta movilización.

Como parte de los compromisos de la administración y de las obligaciones del Contratista de Obra, cada uno de los cierres y modificaciones son ampliamente socializadas por los diferentes medios de comunicación con varios días de antelación, para que la comunidad previamente disponga de información clara.

Para el caso de los lotes 2 y 3, que se encuentran **en etapa de preconstrucción**, se informa que las fechas actualmente previstas para el inicio de las obras se encuentran en el segundo semestre de la presente vigencia, pues pueden surtir cambios según la dinámica propia de los ajustes a diseños finales, trámites, permisos y gestión predial que de manera general nos ocupa actualmente. Por lo anterior, la Entidad se encuentra analizando procesos constructivos, estrategias de intervención y estado de cada uno de

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.



STEST

202634600991551

Información Pública

Al responder cite este número

los insumos, para contar de forma determinante con los productos indispensables para el correcto inicio.

En razón a este mismo proceso, los Planes de Trabajo o cronograma se encuentran en ajustes, siendo uno de los productos finales para aprobar y disponer, por lo que actualmente no es preciso emitir información sobre la intervención de segmentos viales de forma particular.

Para ampliar la información, el proyecto dispone de la sala de exhibición del corredor Carrera Séptima ubicada en la Calle 114 con Carrera 7 costado oriental en la cual se dispone de material gráfico y digital donde se pueden consultar los detalles de cada una de las zonas del corredor para ampliar y explicar detalladamente los diseños.

En los anteriores términos se emite respuesta de fondo, reiterando la disposición del Instituto de Desarrollo Urbano para atender sus solicitudes.

Cordialmente,



ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ

Directora Técnica de Construcciones

Firma mecánica generada el 17-07-2026 11:37:56 AM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Aprobó: EDWIN OSWALDO SANTISTEBAN BALAGUERA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Elaboró: DIANA CONSTANZA BERMEO PINILLA-Subdirección Técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web

<https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia>

Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

6
